

KAIROS



HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN, REGISTRO DE TIEMPOS
Y VISUALIZACIÓN DEL TRABAJO

CENTURIÓN VALERIA , **ESCALANTE** GUILLERMO,
MALDONADO AGUSTINA, **MENDEZ** FLORENCIA, **ULLOA** GONZALO



ÍNDICE



1 PLANTEAMIENTO / SOLUCIÓN
PROPUESTA

2 EQUIPO DE DESAROLLO

3 TECNOLOGÍAS PRINCIPALES

4 ETAPAS DE LA CURSADA

5 ESTIMACIONES

6 TIEMPO REAL DEDICADO

7 GESTIÓN DE RIESGOS



8 GESTIÓN DE CONFIGURACIONES

9 ESTADO DE CASOS DE USO

10 MÉTRICAS

11 IMPLEMENTACIÓN

PLANTEAMIENTO

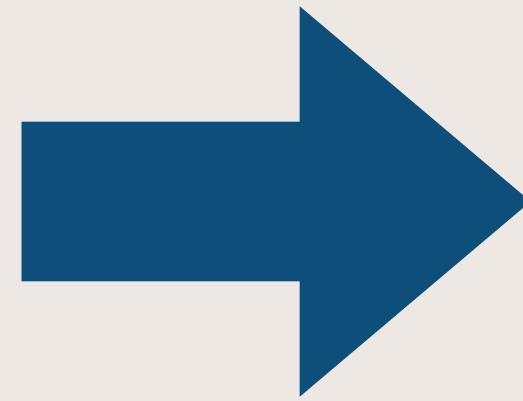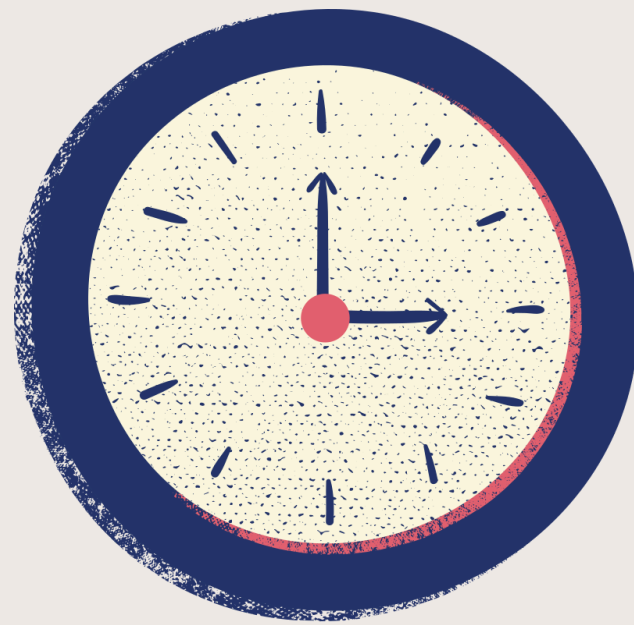

Registro de tiempos de manera distinta sin un sistema unificado

SOLUCIÓN PROPUESTA



Kairos unifica el registro de tiempos, ordena la información y facilita la planificación.



EQUIPO DE DESAROLLO

ULLOA, GONZALO

Líder del proyecto,
Programador

CENTURIÓN VALERIA

Analista, Programador

ESCALANTE, GUILLERMO

Analista, Programador

MALDONADO, AGUSTINA

Diseñador, Documentador

MENDEZ, FLORENCIA

Diseñador, Gerente de Calidad





ELECCIÓN DE NOMBRE

Propuestas de Equipo

- CodeBalance
- Goblin
- Noxus
- NexTech





ELECCIÓN DE NOMBRE

Propuestas del proyecto

- Kairos
- CronoLab
- Plant&Track





ELECCIÓN DE LOGO

Propuestas del equipo



ELECCIÓN DE LOGO

Propuestas del proyecto





TECNOLOGÍAS PRINCIPALES

Gestión y diseño



Git



GitHub



Spreadsheets



Canva



Draw.io



Colab



PlantUML



Figma



Toggl
Track

Desarrollo



Java




Angular



Spring
Boot



VS Code



Antigravity



XAMPP



MySQL



PostMan

Otros



PSI



Google
docs



WhatsApp



Discord



Rclone

NEXTECH

ETAPAS DE LA CURSADA

INICIO
1 iteración

ELABORACIÓN
2 iteración

CONSTRUCCIÓN
3 iteración

**CIERRE DE
CURSADA**

6 ITERACIONES EN TOTAL.



ETAPA DE INICIO

Documentos/actividades a destacar



Entrevistas al cliente



Estudio de factibilidad



Propuesta de desarrollo



NEXTECH

ETAPA DE ELABORACIÓN ITERACIÓN 1

Documentos/actividades a destacar



Especificación de
requerimientos



Plan de proyecto



Plan de iteración




Plan de calidad



NEXTECH

ETAPA DE ELABORACIÓN ITERACIÓN 2


Documentos/actividades a destacar

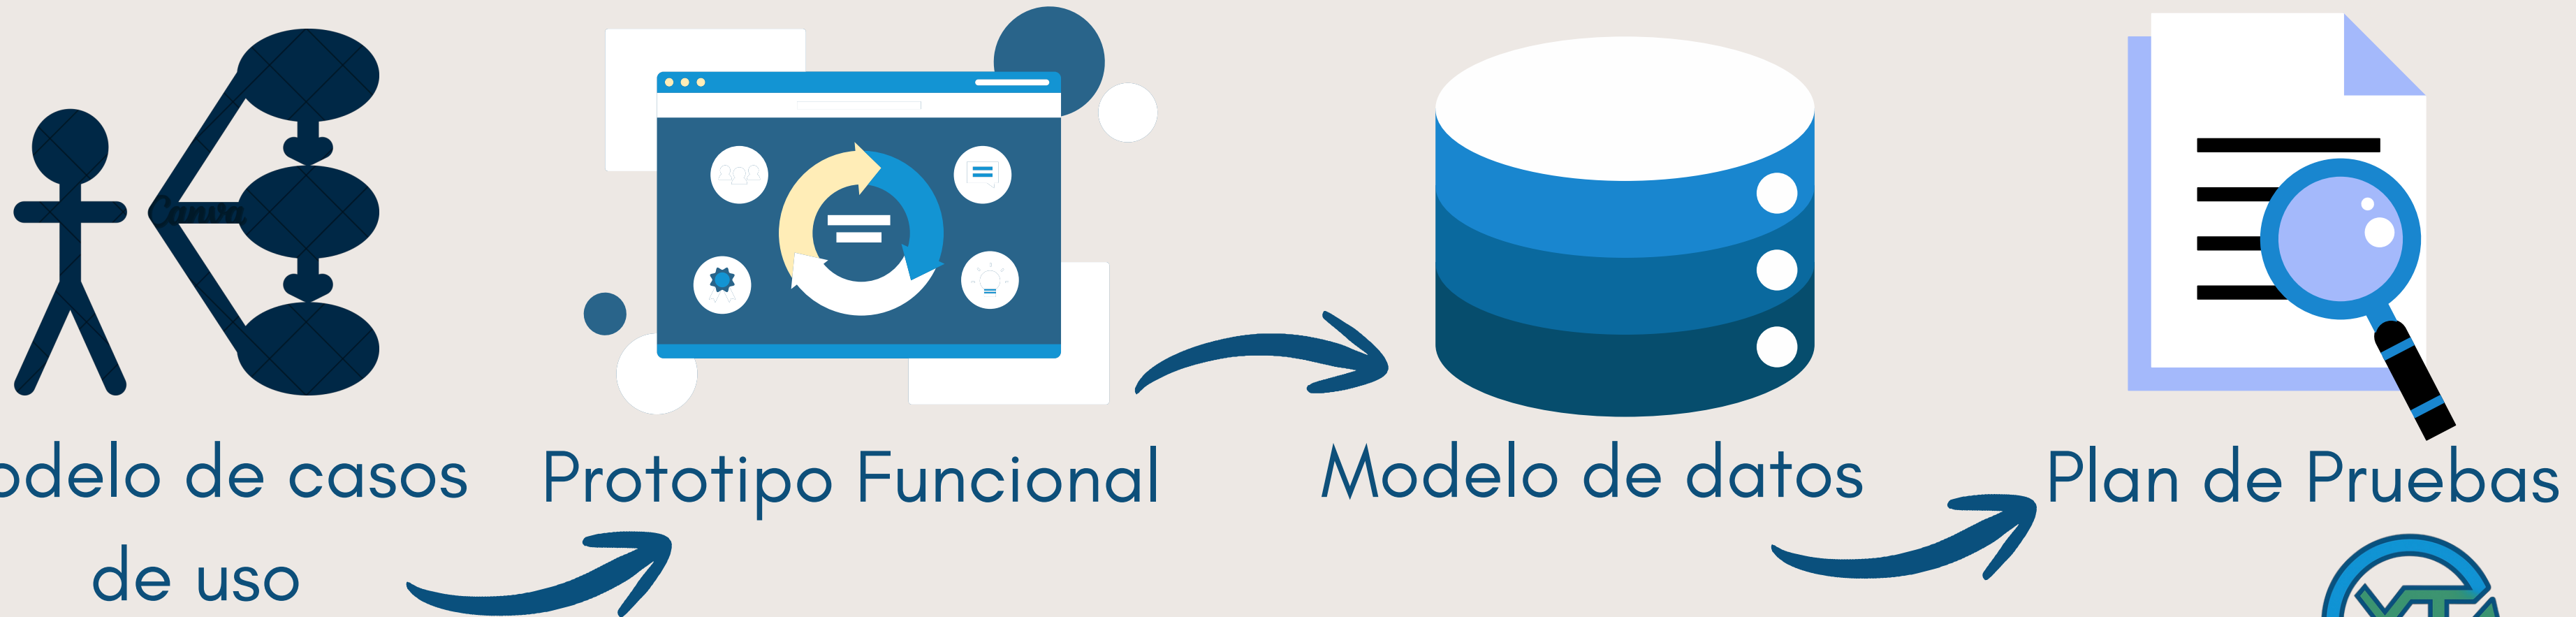


NEXTTECH

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Documentos/actividades a destacar

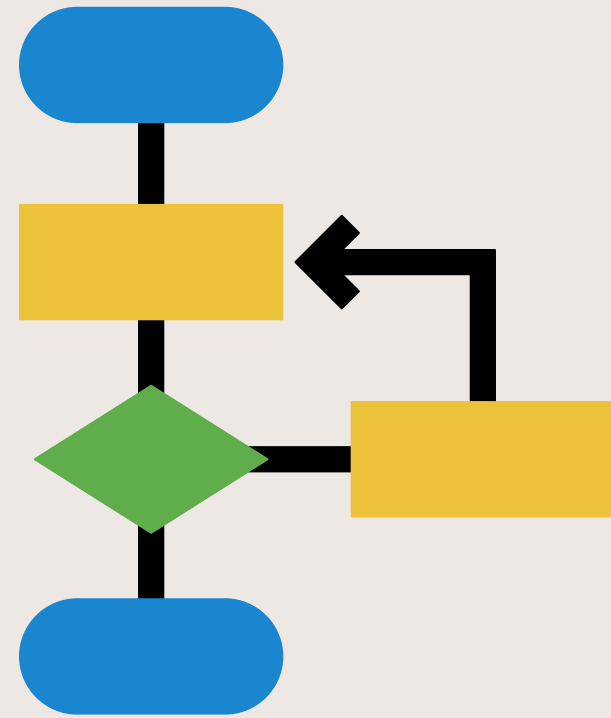

Modelo de diseño

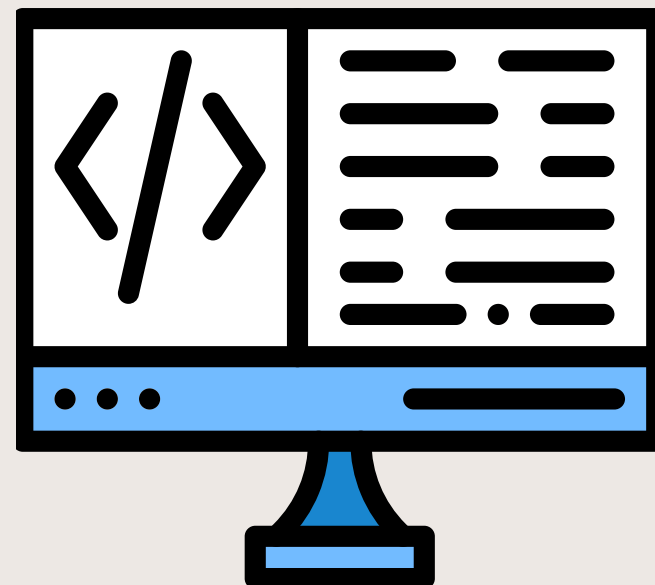

Implementación



Casos de prueba



NEXTECH

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

ITERACIÓN 1: 18 días

Priorización e implementación de primera tanda de CU

Caso de Uso	Estado
CU01: Iniciar Sesión	Completado
CU09: Crear tarea	Completado
CU12: Estimar tarea	Completado
CU20: Registrar tiempo por cronometro	Completado



NEXTECH

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

ITERACIÓN 2: 10 días

Priorización e implementación de segunda tanda de CU

Caso de Uso	Estado
CU07: Crear etapa	Completado
CU08: Crear iteración	Completado
CU13: Asignar dependencia	Completado
CU14: Modificar estado tarea	Completado
CU15: Visualizar tarea	Completado
CU16: Comentar tarea	Completado
CU21: Registrar tiempo manual	Completado



NEXTECH

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

ITERACIÓN 3: 7 días

Priorización e implementación de tercera tanda de CU

Caso de Uso	Estado
CU03: Asignar rol	Completado
CU04: Modificar perfil	Completado
CU05: Crear proyecto	Completado
CU06: Modificar proyecto	Completado
CU18: Añadir categoría	Completado
CU19: Modificar categoría	Completado
CU22: Ver reporte	Completado
CU23: Registrar usuario al proyecto	Completado



NEXTECH

ETAPA DE CIERRE DE CURSADA



Documentos/actividades a destacar




Planes de iteración hasta finalización del proyecto



Manual de usuario



Manual de instalación



Estructura de la memoria




NEXTECH




ESTIMACIÓN



Grafico de estimaciones

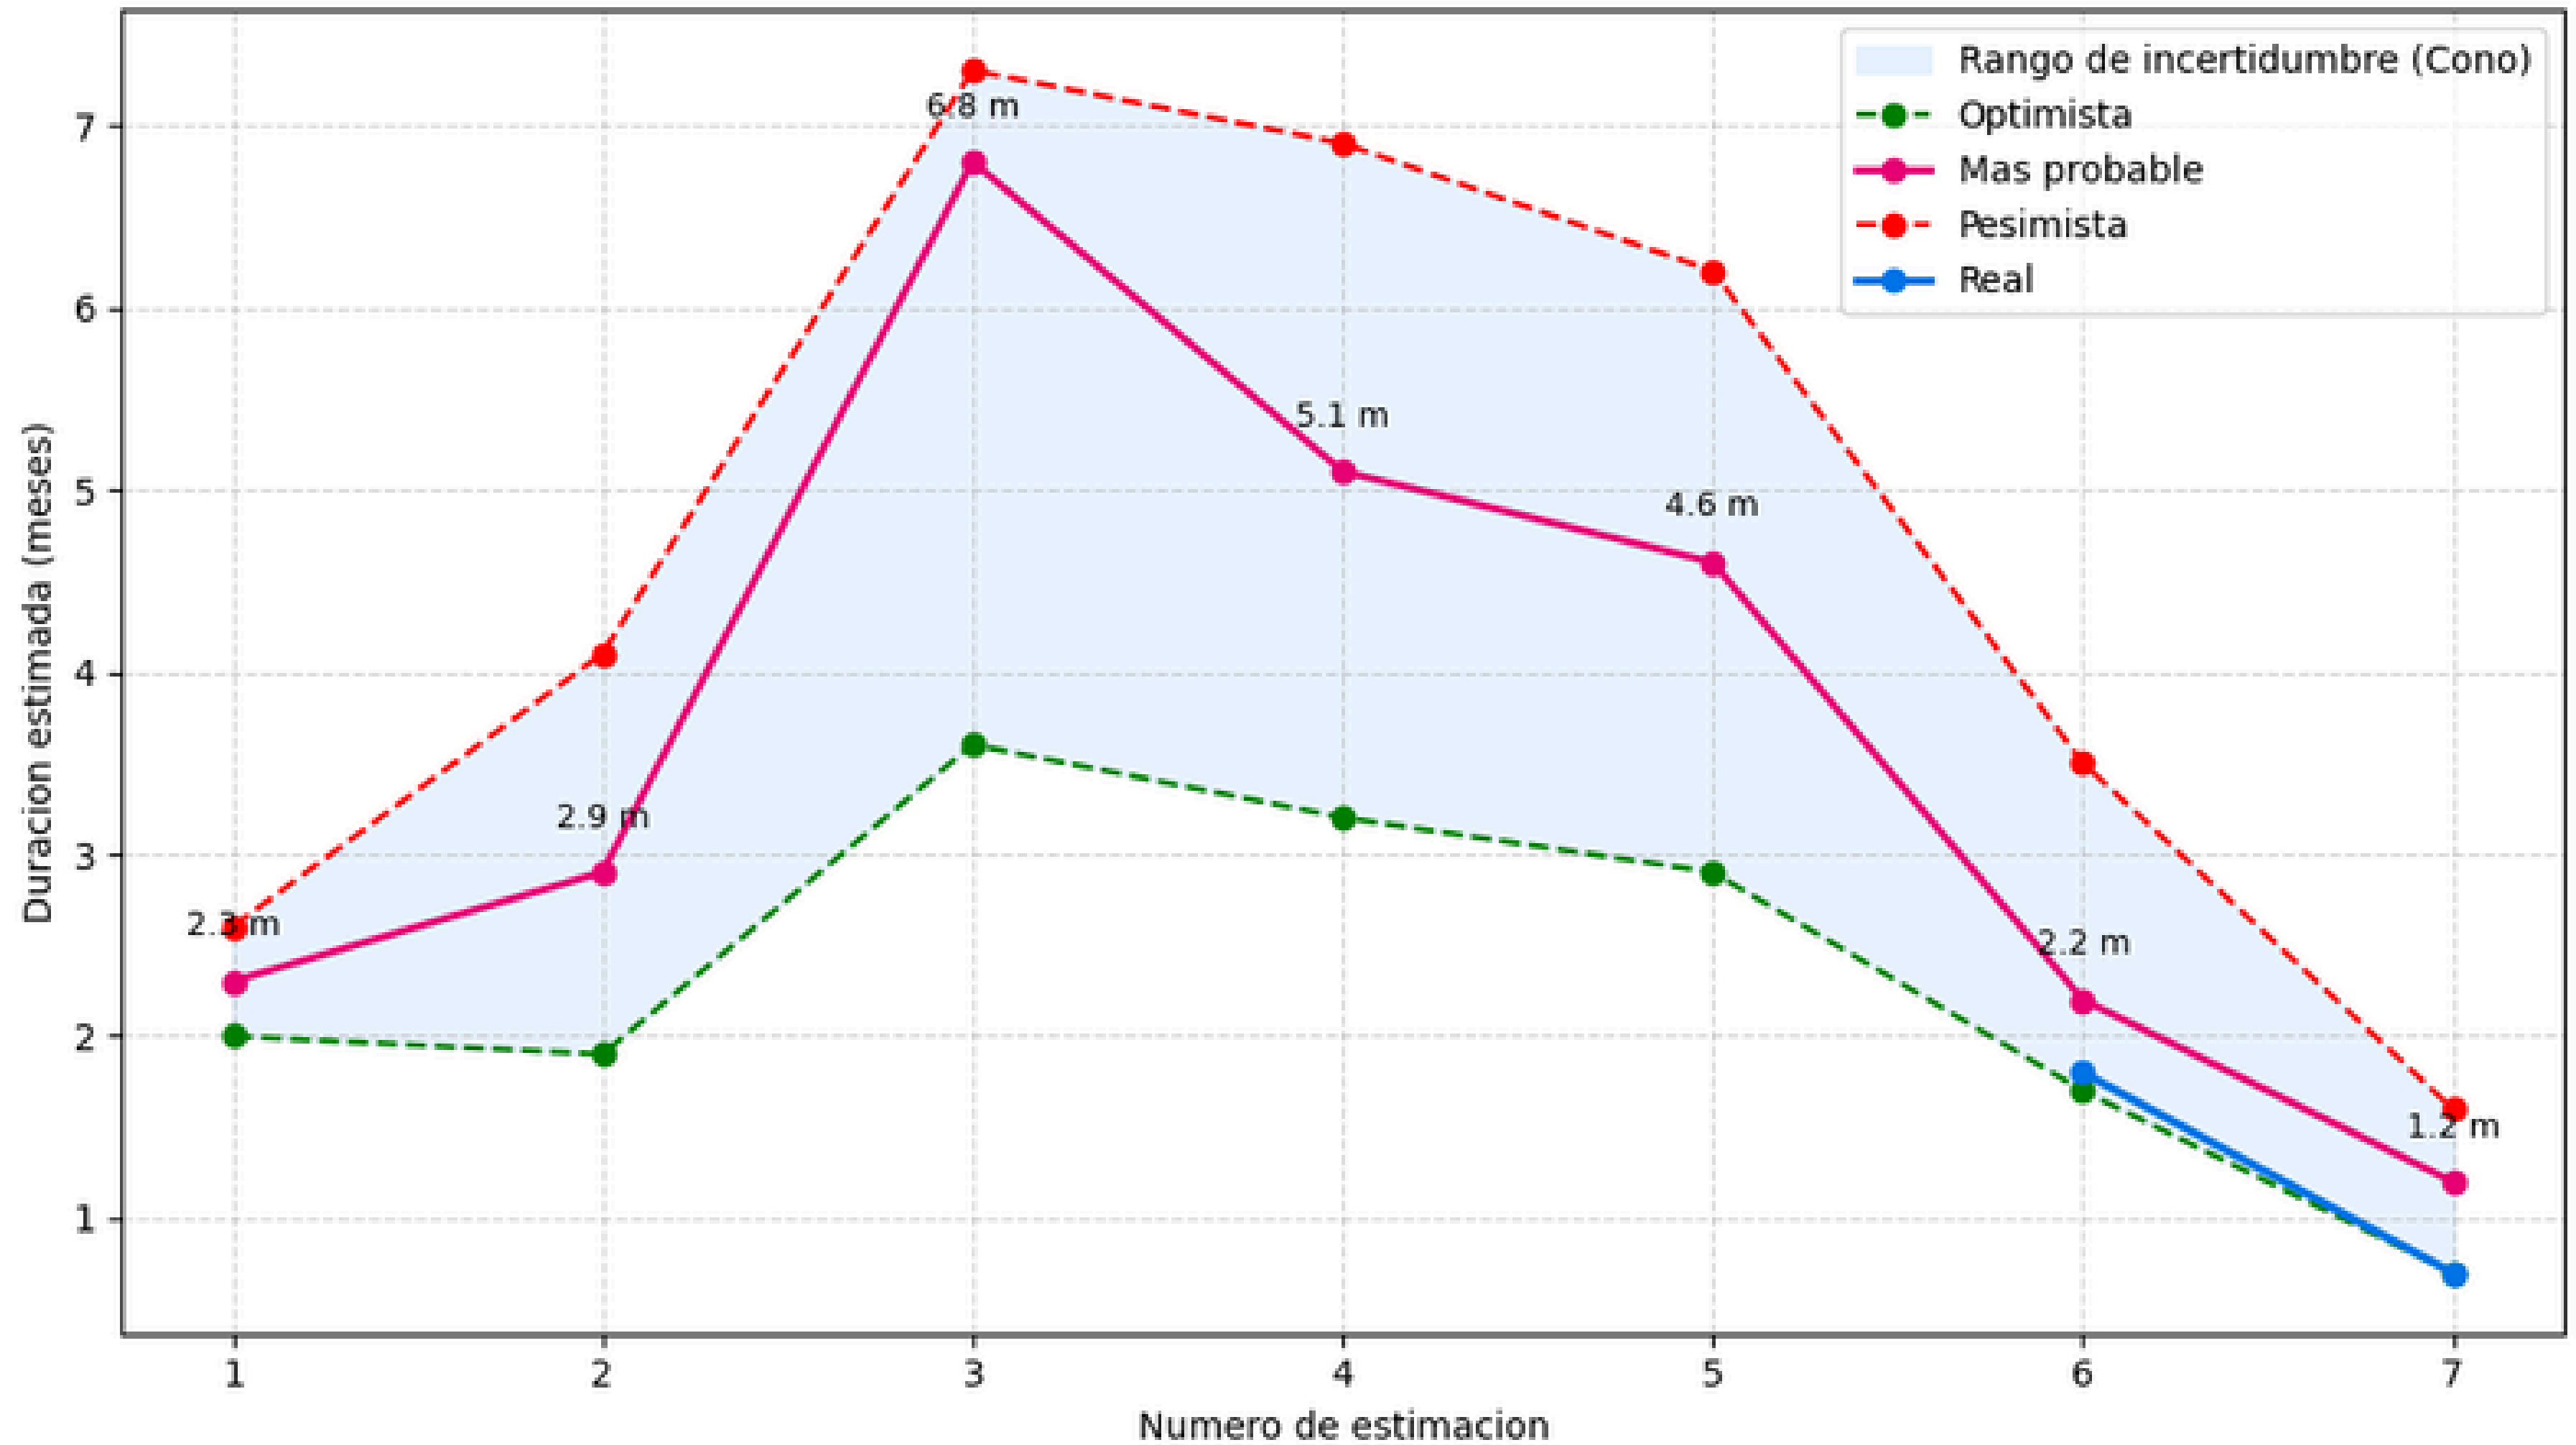


Linea de tiempo de fechas de finalizacion

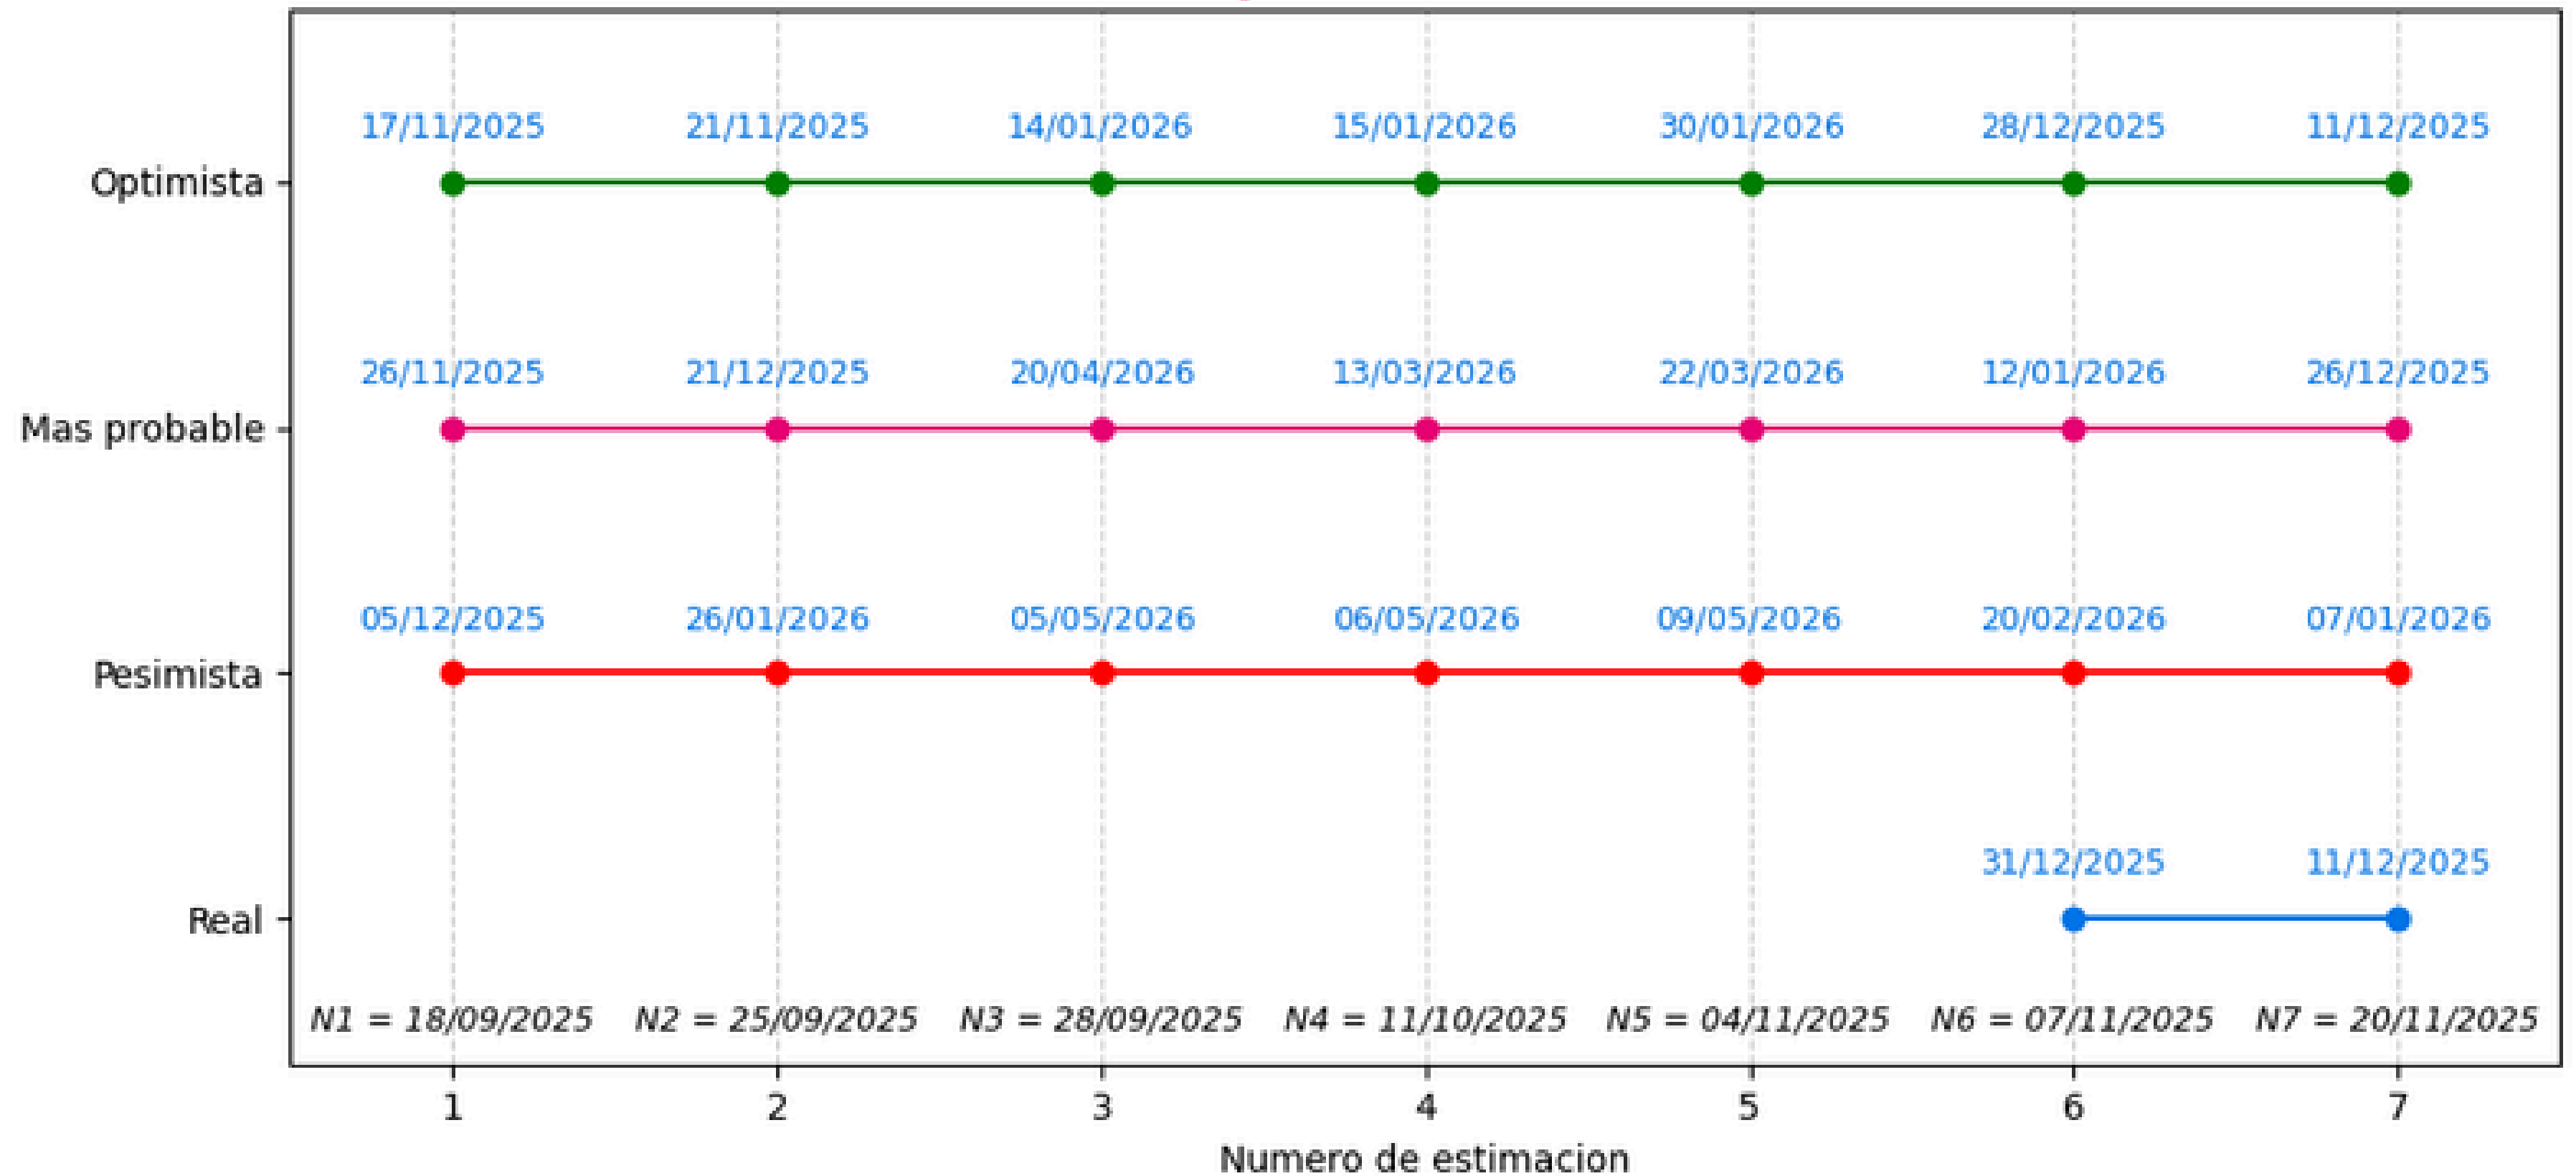

NEXTECH



Comparacion de esfuerzo (h-h) por estimacion

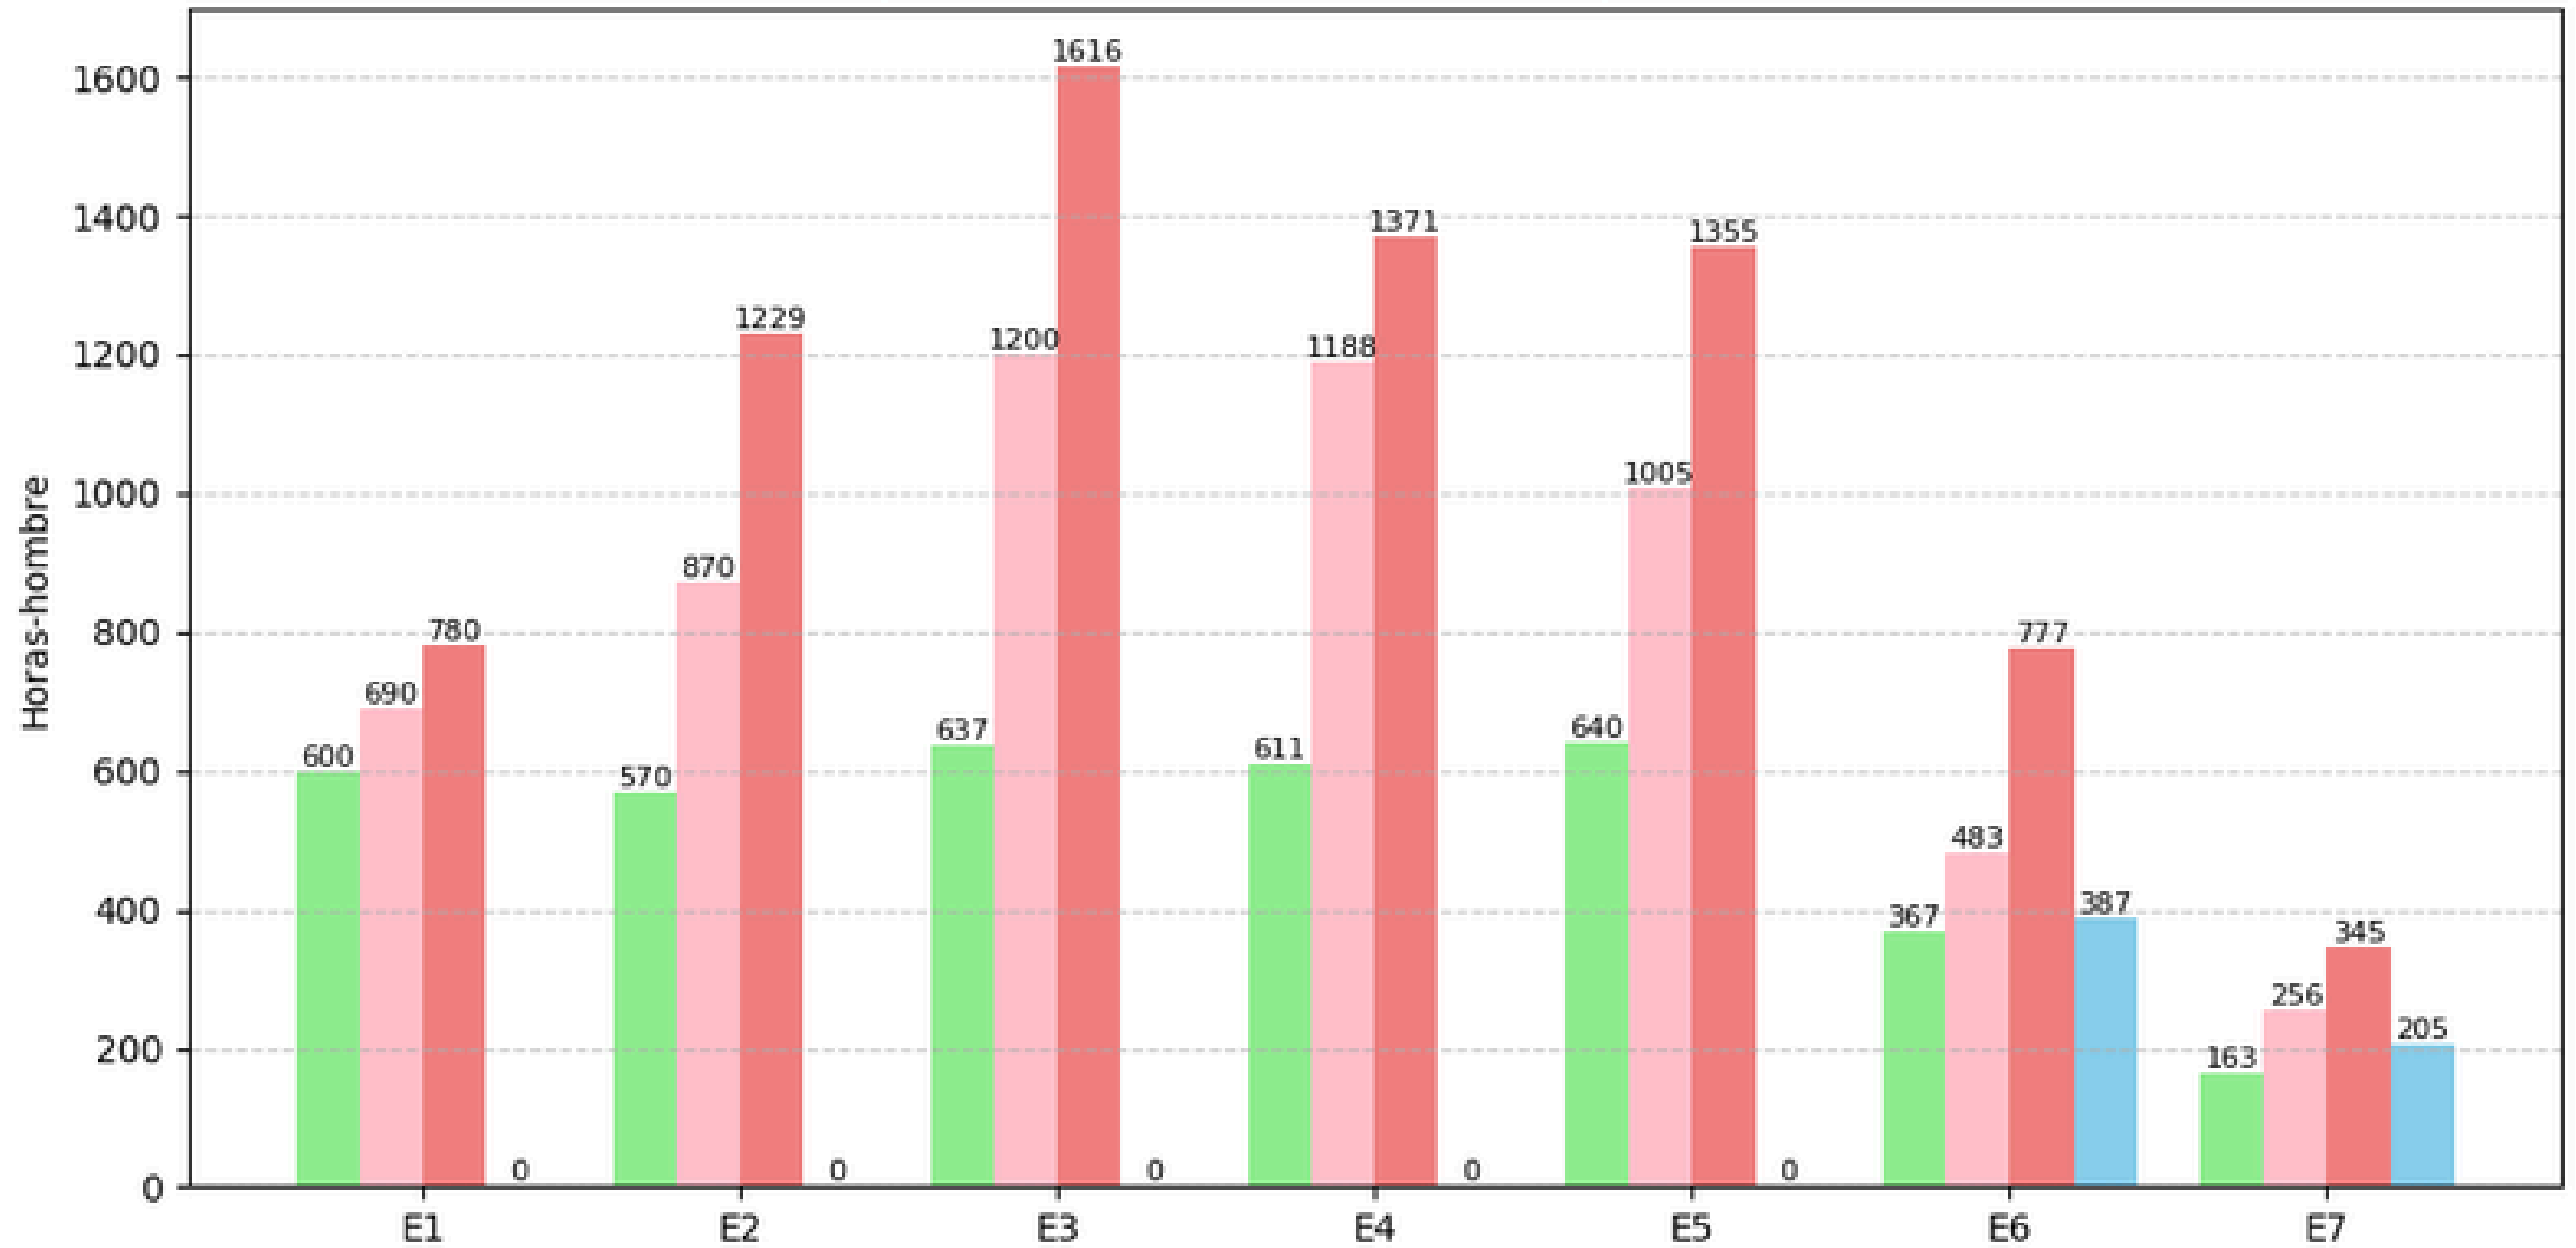

h-h/PCU: 1,6

NEXTTECH

Optimista Mas probable Pesimista Real




TIEMPO REAL DEDICADO



Esfuerzo acumulado por etapa

Total de horas: 604:45:51

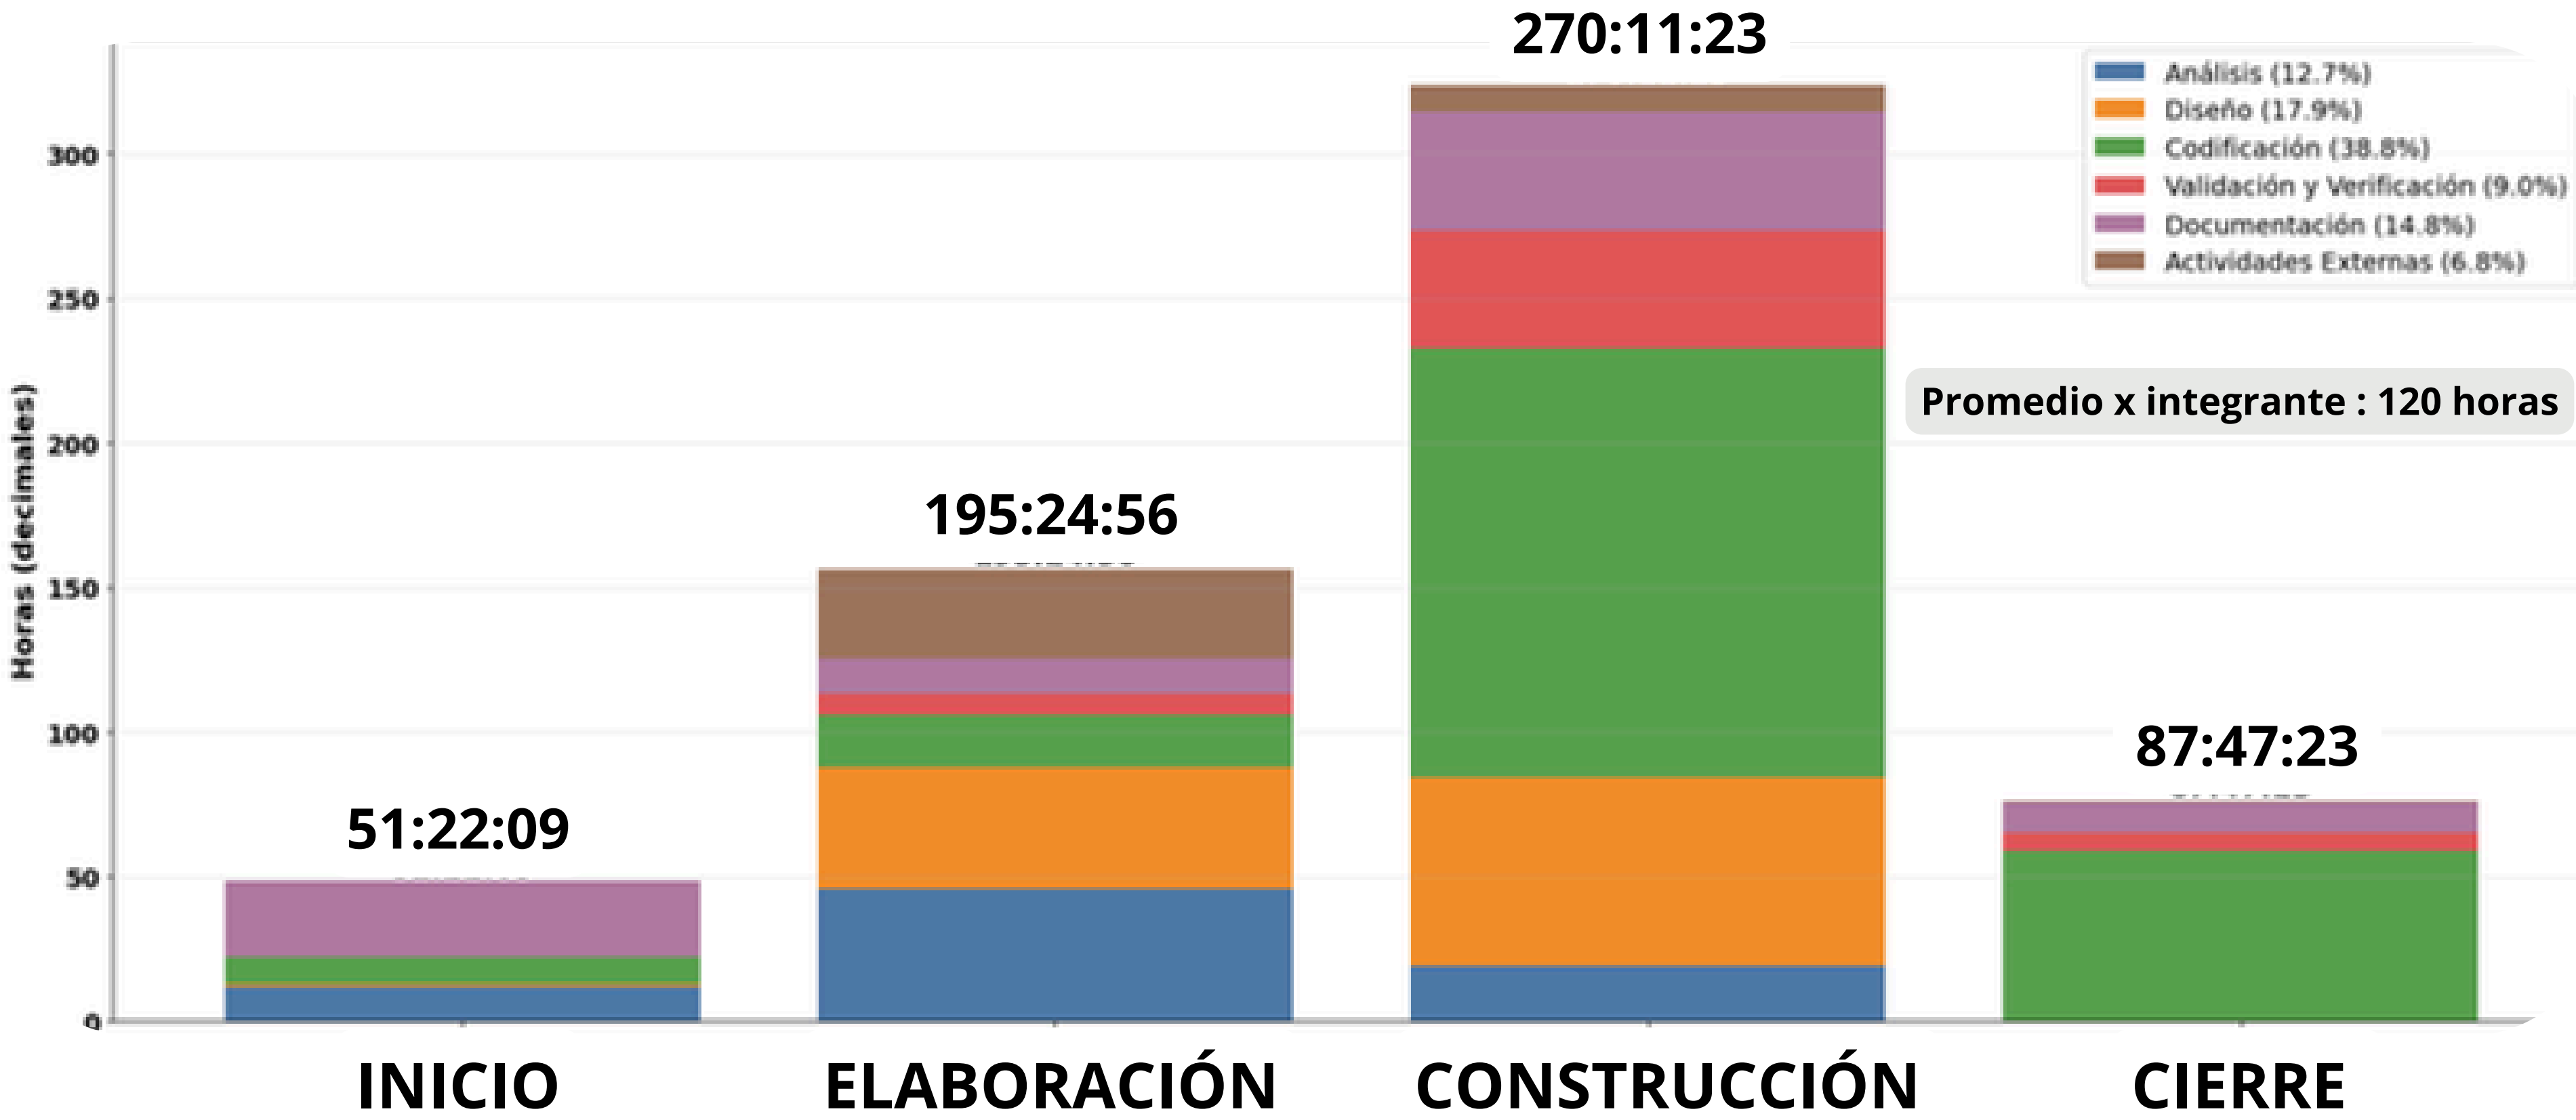



GESTIÓN DE RIESGOS





ESTADO ACTUAL- RIESGOS

Estado	Cantidad de riesgos
♥ No requieren acción	14
● Reevaluar próxima iteración	3
● Planificados / controlados	2
Total	19

RIESGOS A LO LARGO DEL PROYECTO





GESTIÓN DE CONFIGURACIONES





Estado actual del repositorio

26/08/2025 - 28/11/2025



- Archivos: 25.623



- Directorios: 2.367



- Ramas: 12


- *Activas*: 6
- *A eliminar*: 6




Cantidad de Commits

Total: 327

Inicio: I1 Elaboración: I1 Elaboración: I2 Construcción: I1 Construcción: I2 Construcción: I3 Cierre

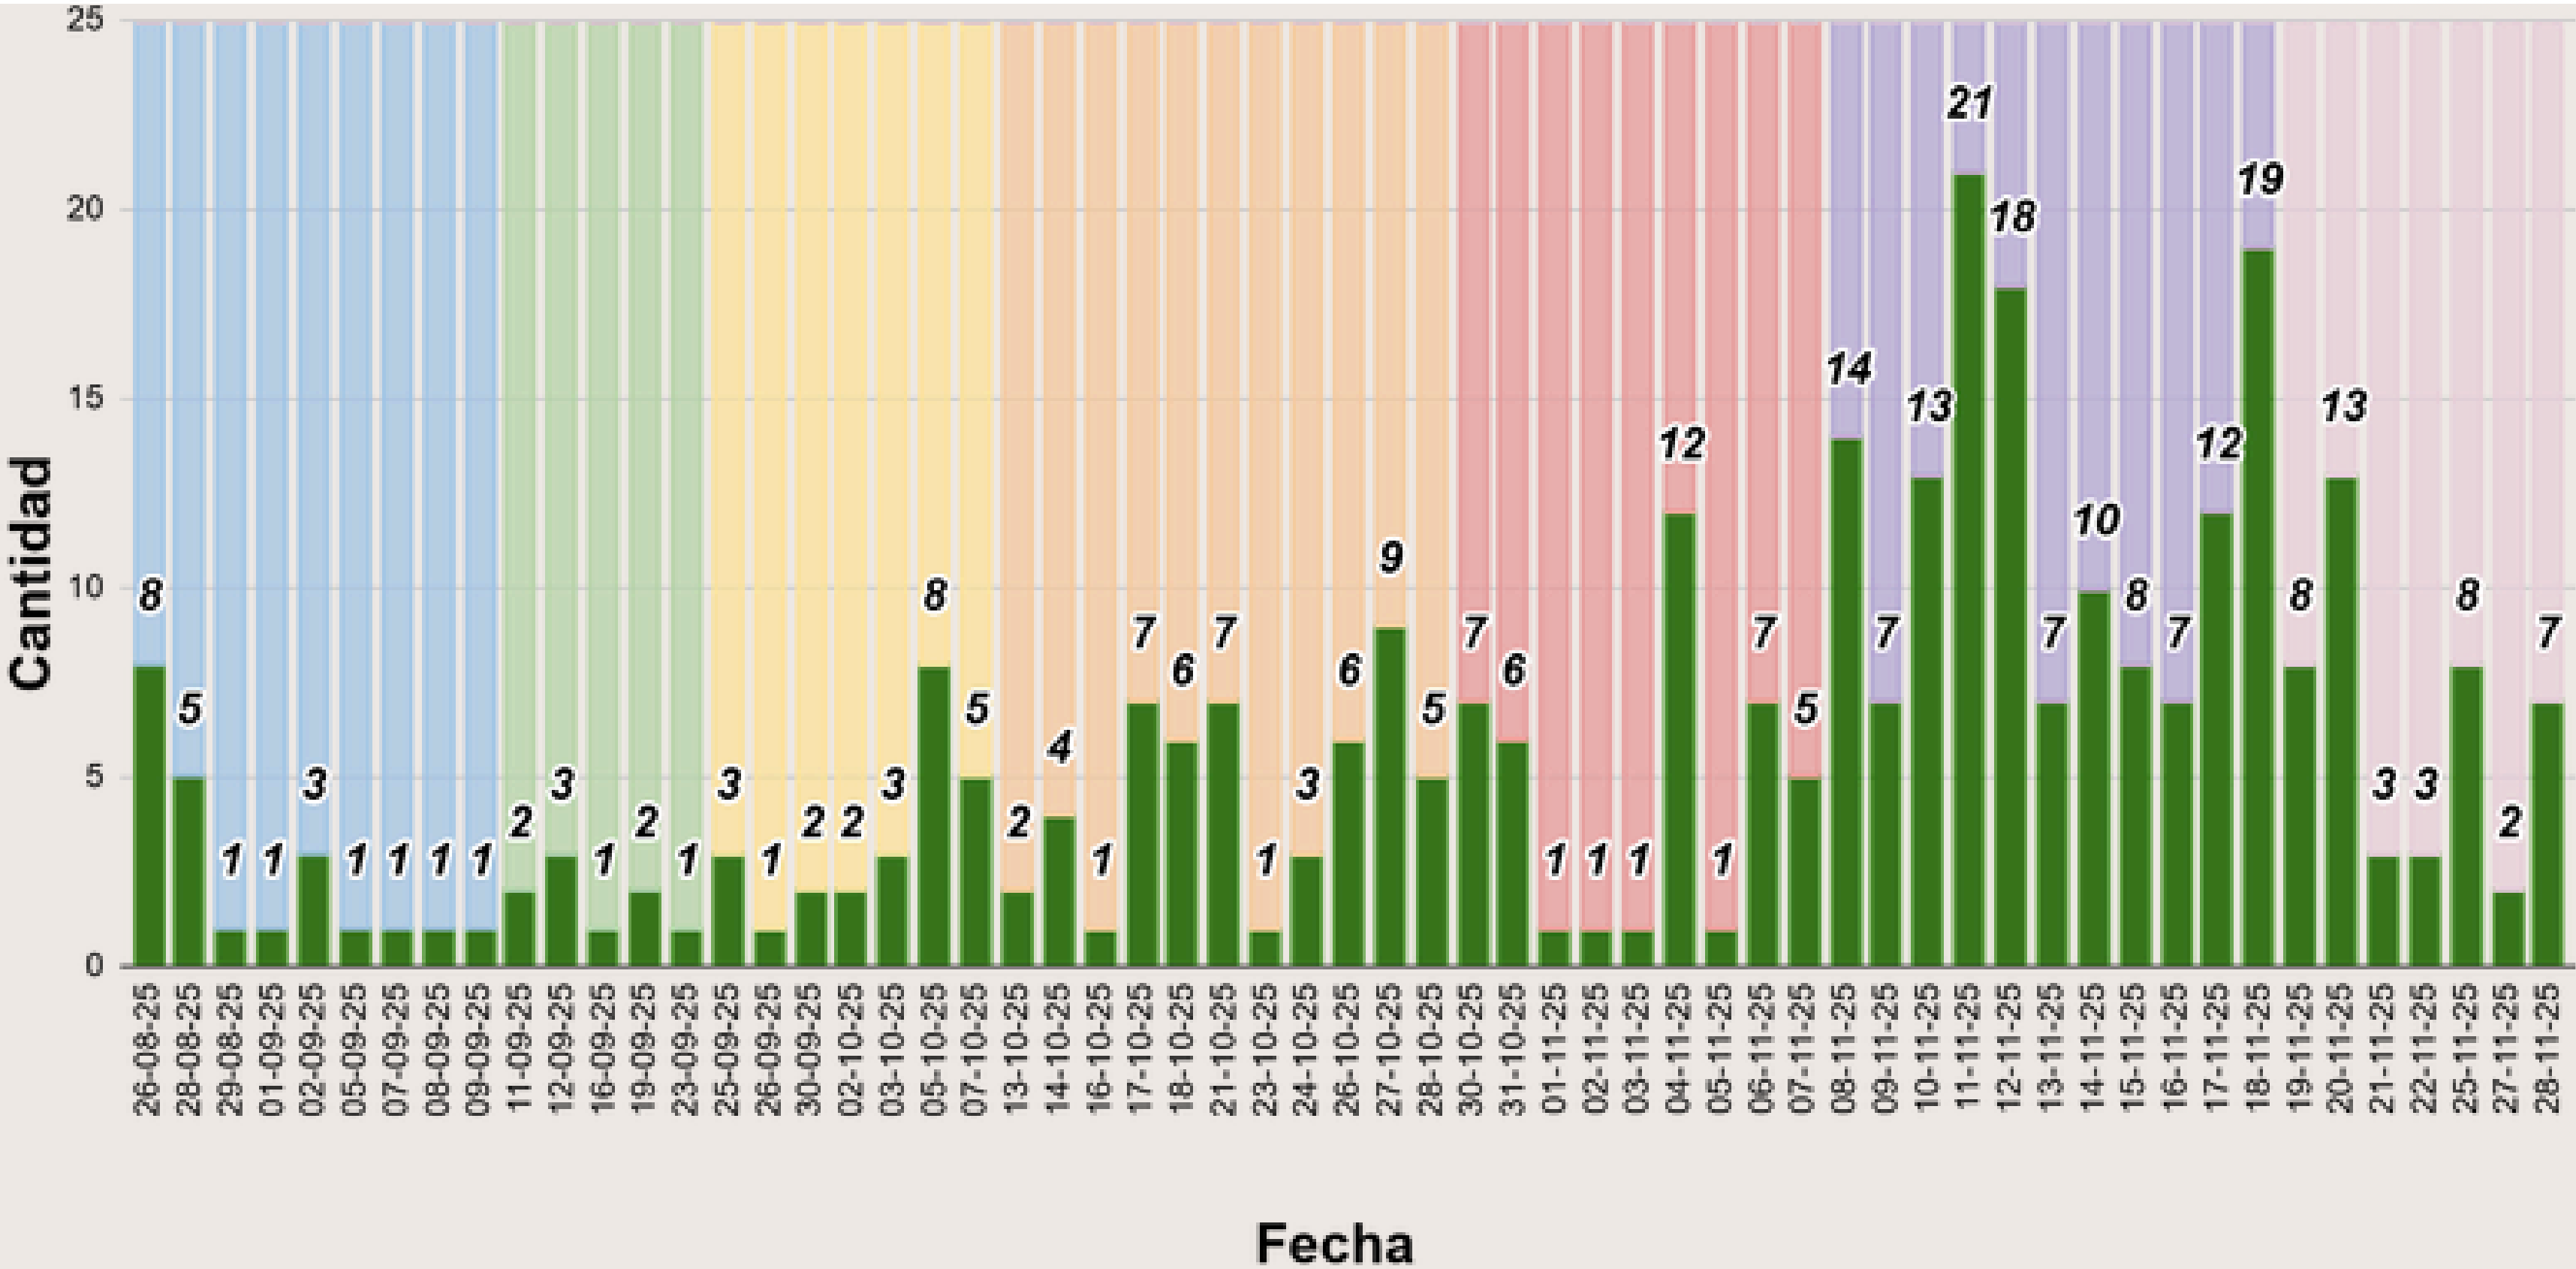

Promedio de cantidad de commits por día

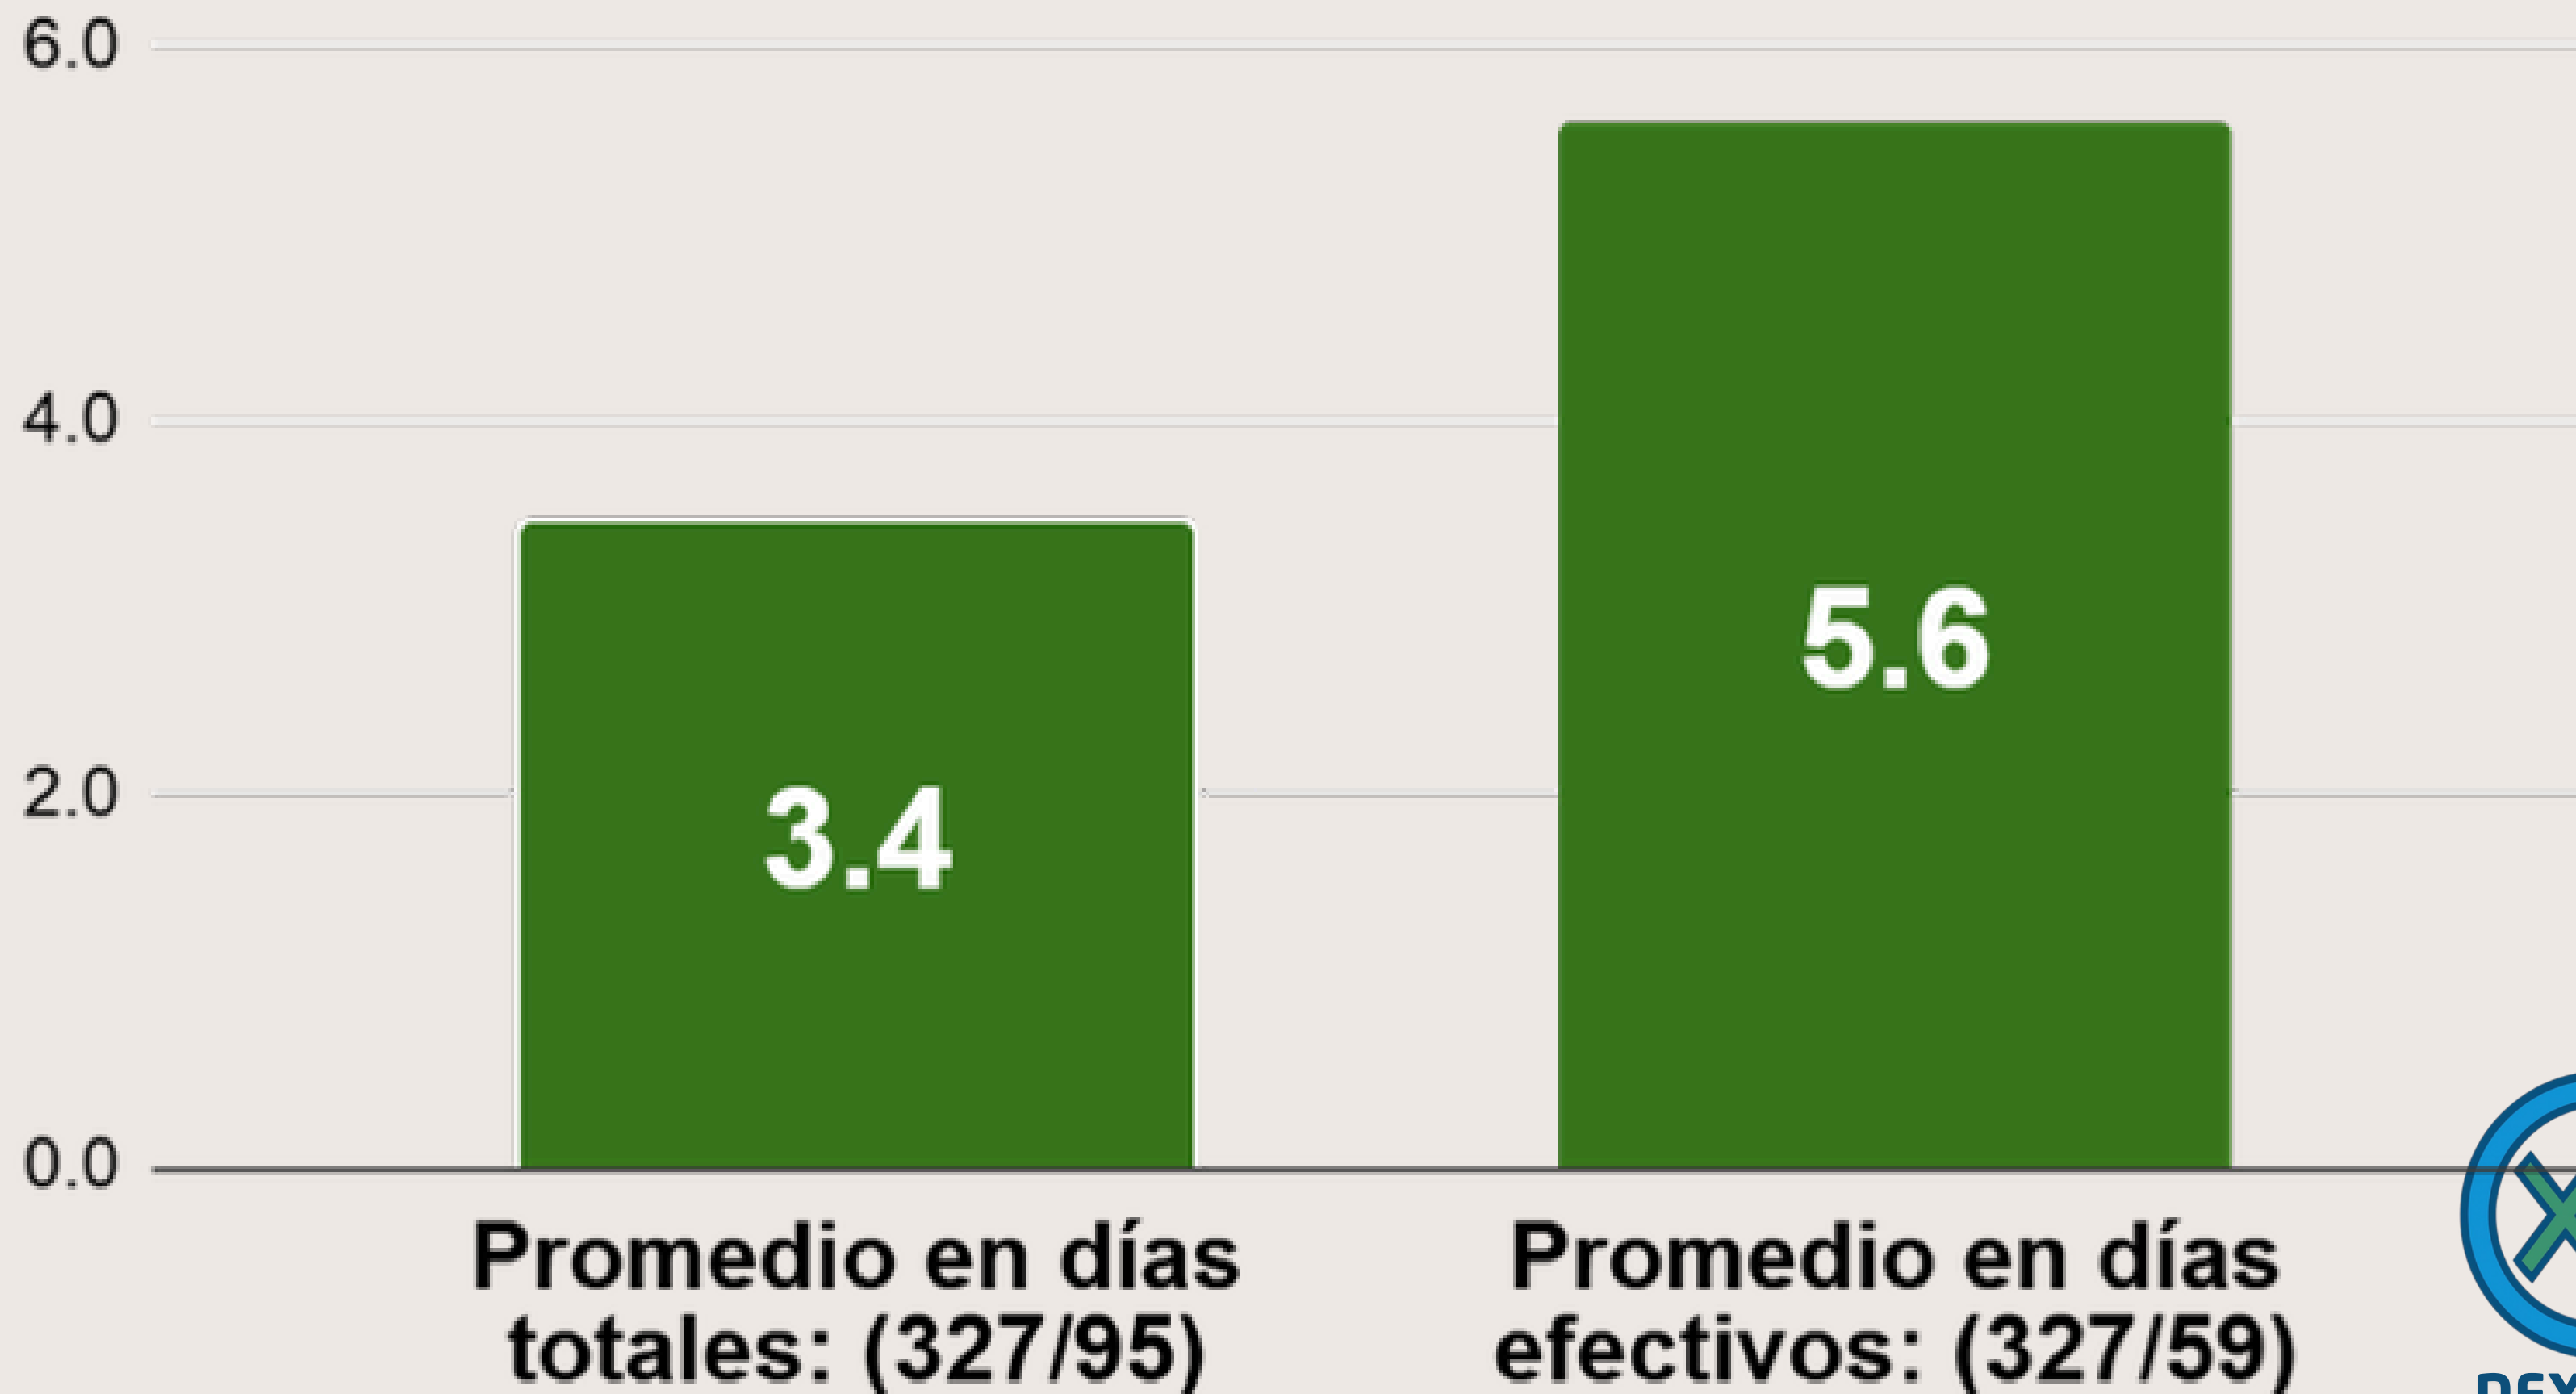


Política de Commits

- Programación:
 - **fix:** *Para agregar funcionalidades.*
 - **feat:** *Para corrección de errores.*
 - **dev:** *Cambios generales.*
- Documentación:
 - **docs**(*documento específico*)
 - **docs:** Actualización de varios documentos

Clasificación de Commits

Total: 327

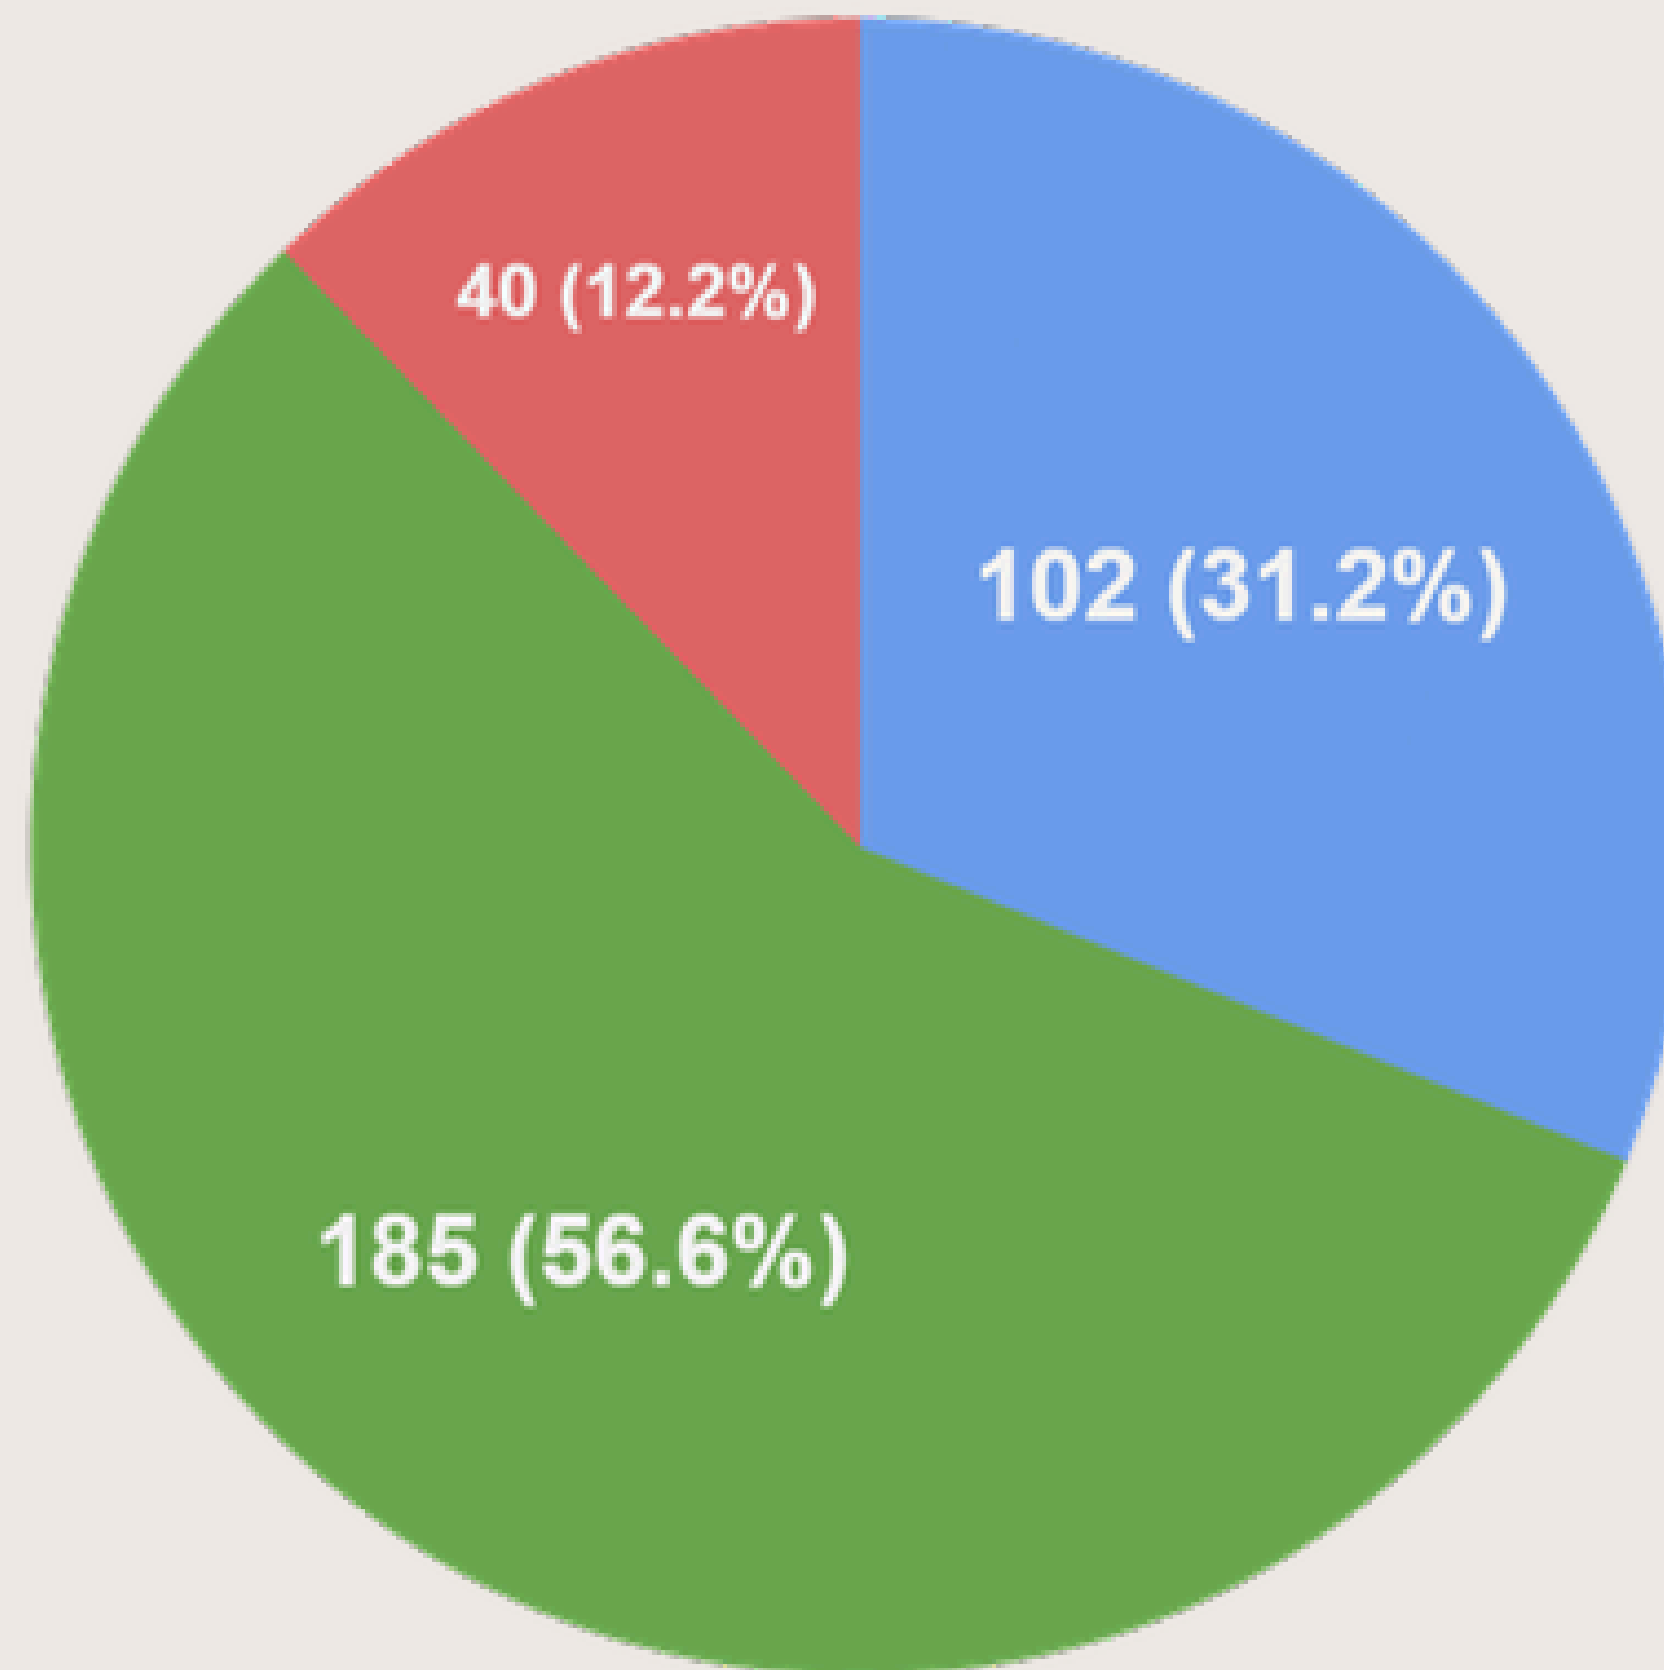

- Documentación
- Programación
- Otros






ESTADO DE CASOS DE USO



ESTADO ACTUAL DE LOS CASOS DE USO

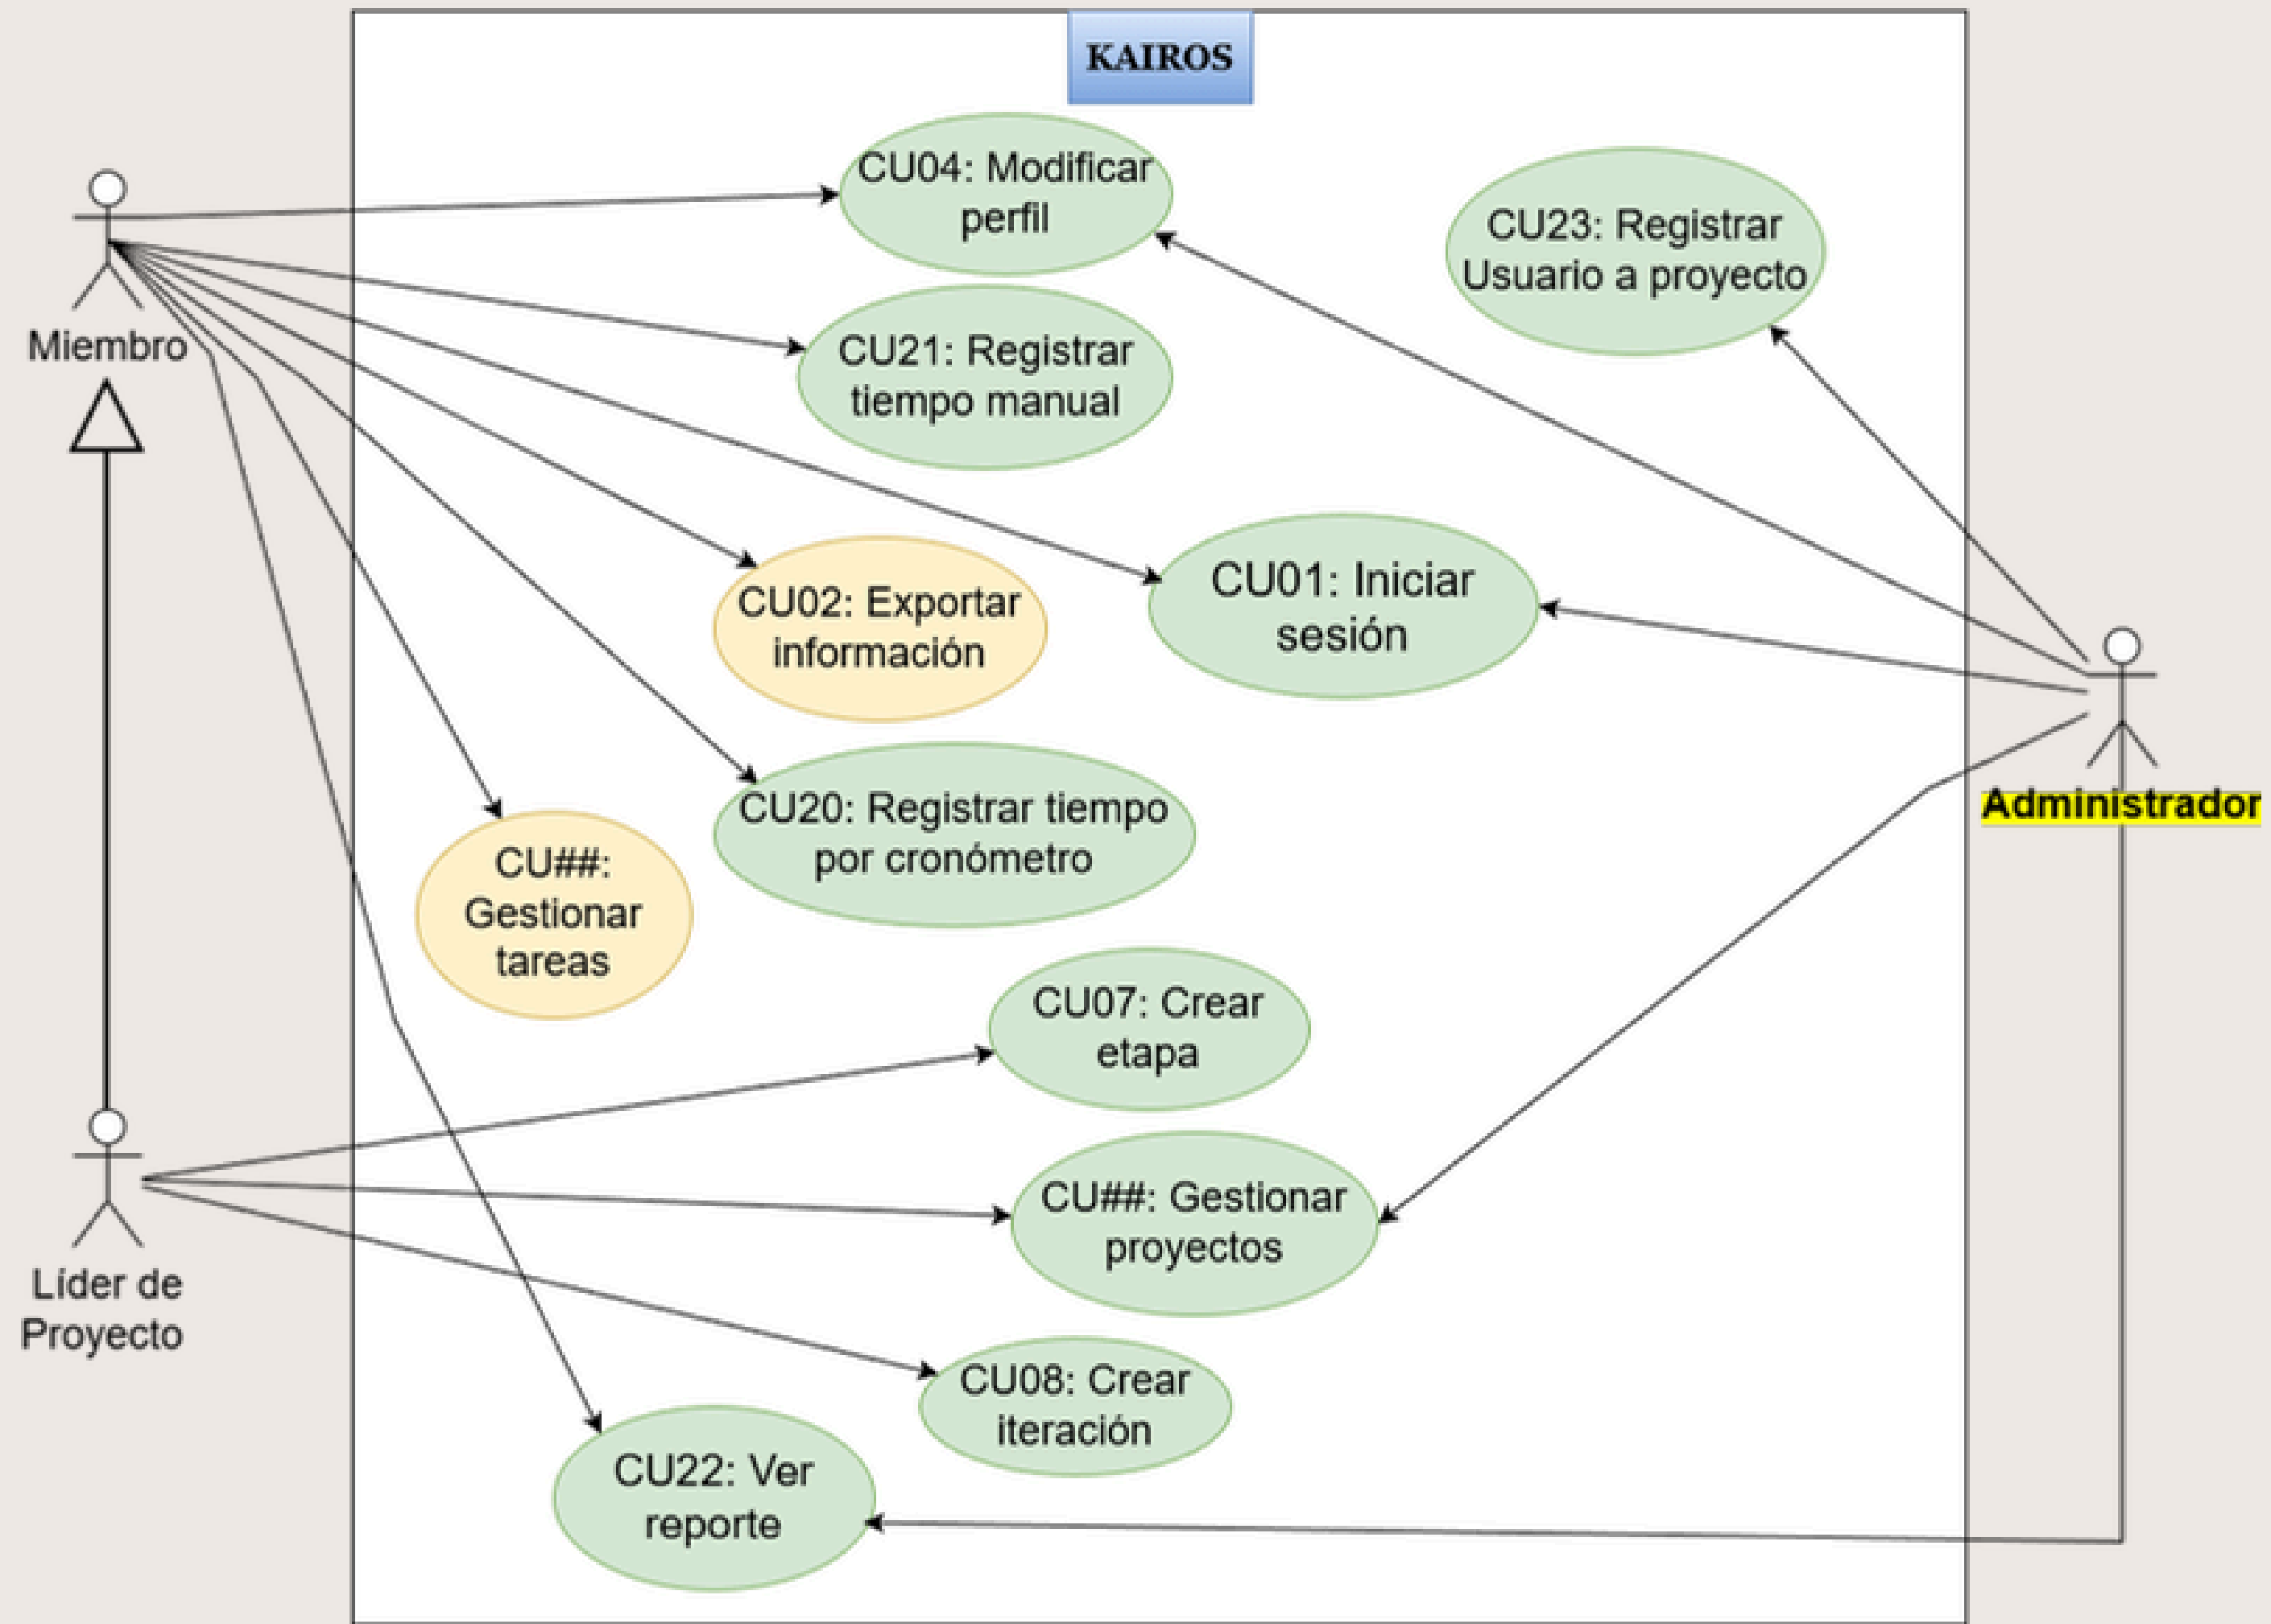

ESTADO ACTUAL DE LOS CASOS DE USO

Caso de Uso	Estado	Caso de Uso	Estado
CU01: Iniciar Sesión	Completado	CU09: Crear Tarea	Completado
CU02: Exportar informacion	En curso	CU10: Proponer Tarea	En curso
CU03: Asignar Rol	Completado	CU11: Aprobar Tarea	En curso
CU04: Modificar Perfil	Completado	CU12: Estimar Tarea	Completado
CU05: Crear Proyecto	Completado	CU13: Asignar dependencia	Completado
CU06: Modificar Proyecto	Completado	CU14: Modificar estado de tarea	Completado
CU07: Crear Etapa	Completado	CU15: Visualizar Tarea	Completado
CU08: Crear iteración	Completado		

CU16: Comentar Tarea	Completado
CU17: Categorizar tarea	Completado
CU18: Añadir Categoría	Completado
CU19: Modificar Categoría	Completado
CU20: Registrar tiempo por cronómetro	Completado
CU21: Registrar tiempo manual	Completado
CU22: Ver reporte	Completado
CU23: Registrar usuario al proyecto	Completado



CU implementados: 20
CU no implementados: 3


Total CU: 23



RESUMEN DE CASOS DE PRUEBA



Pruebas ejecutadas por iteración

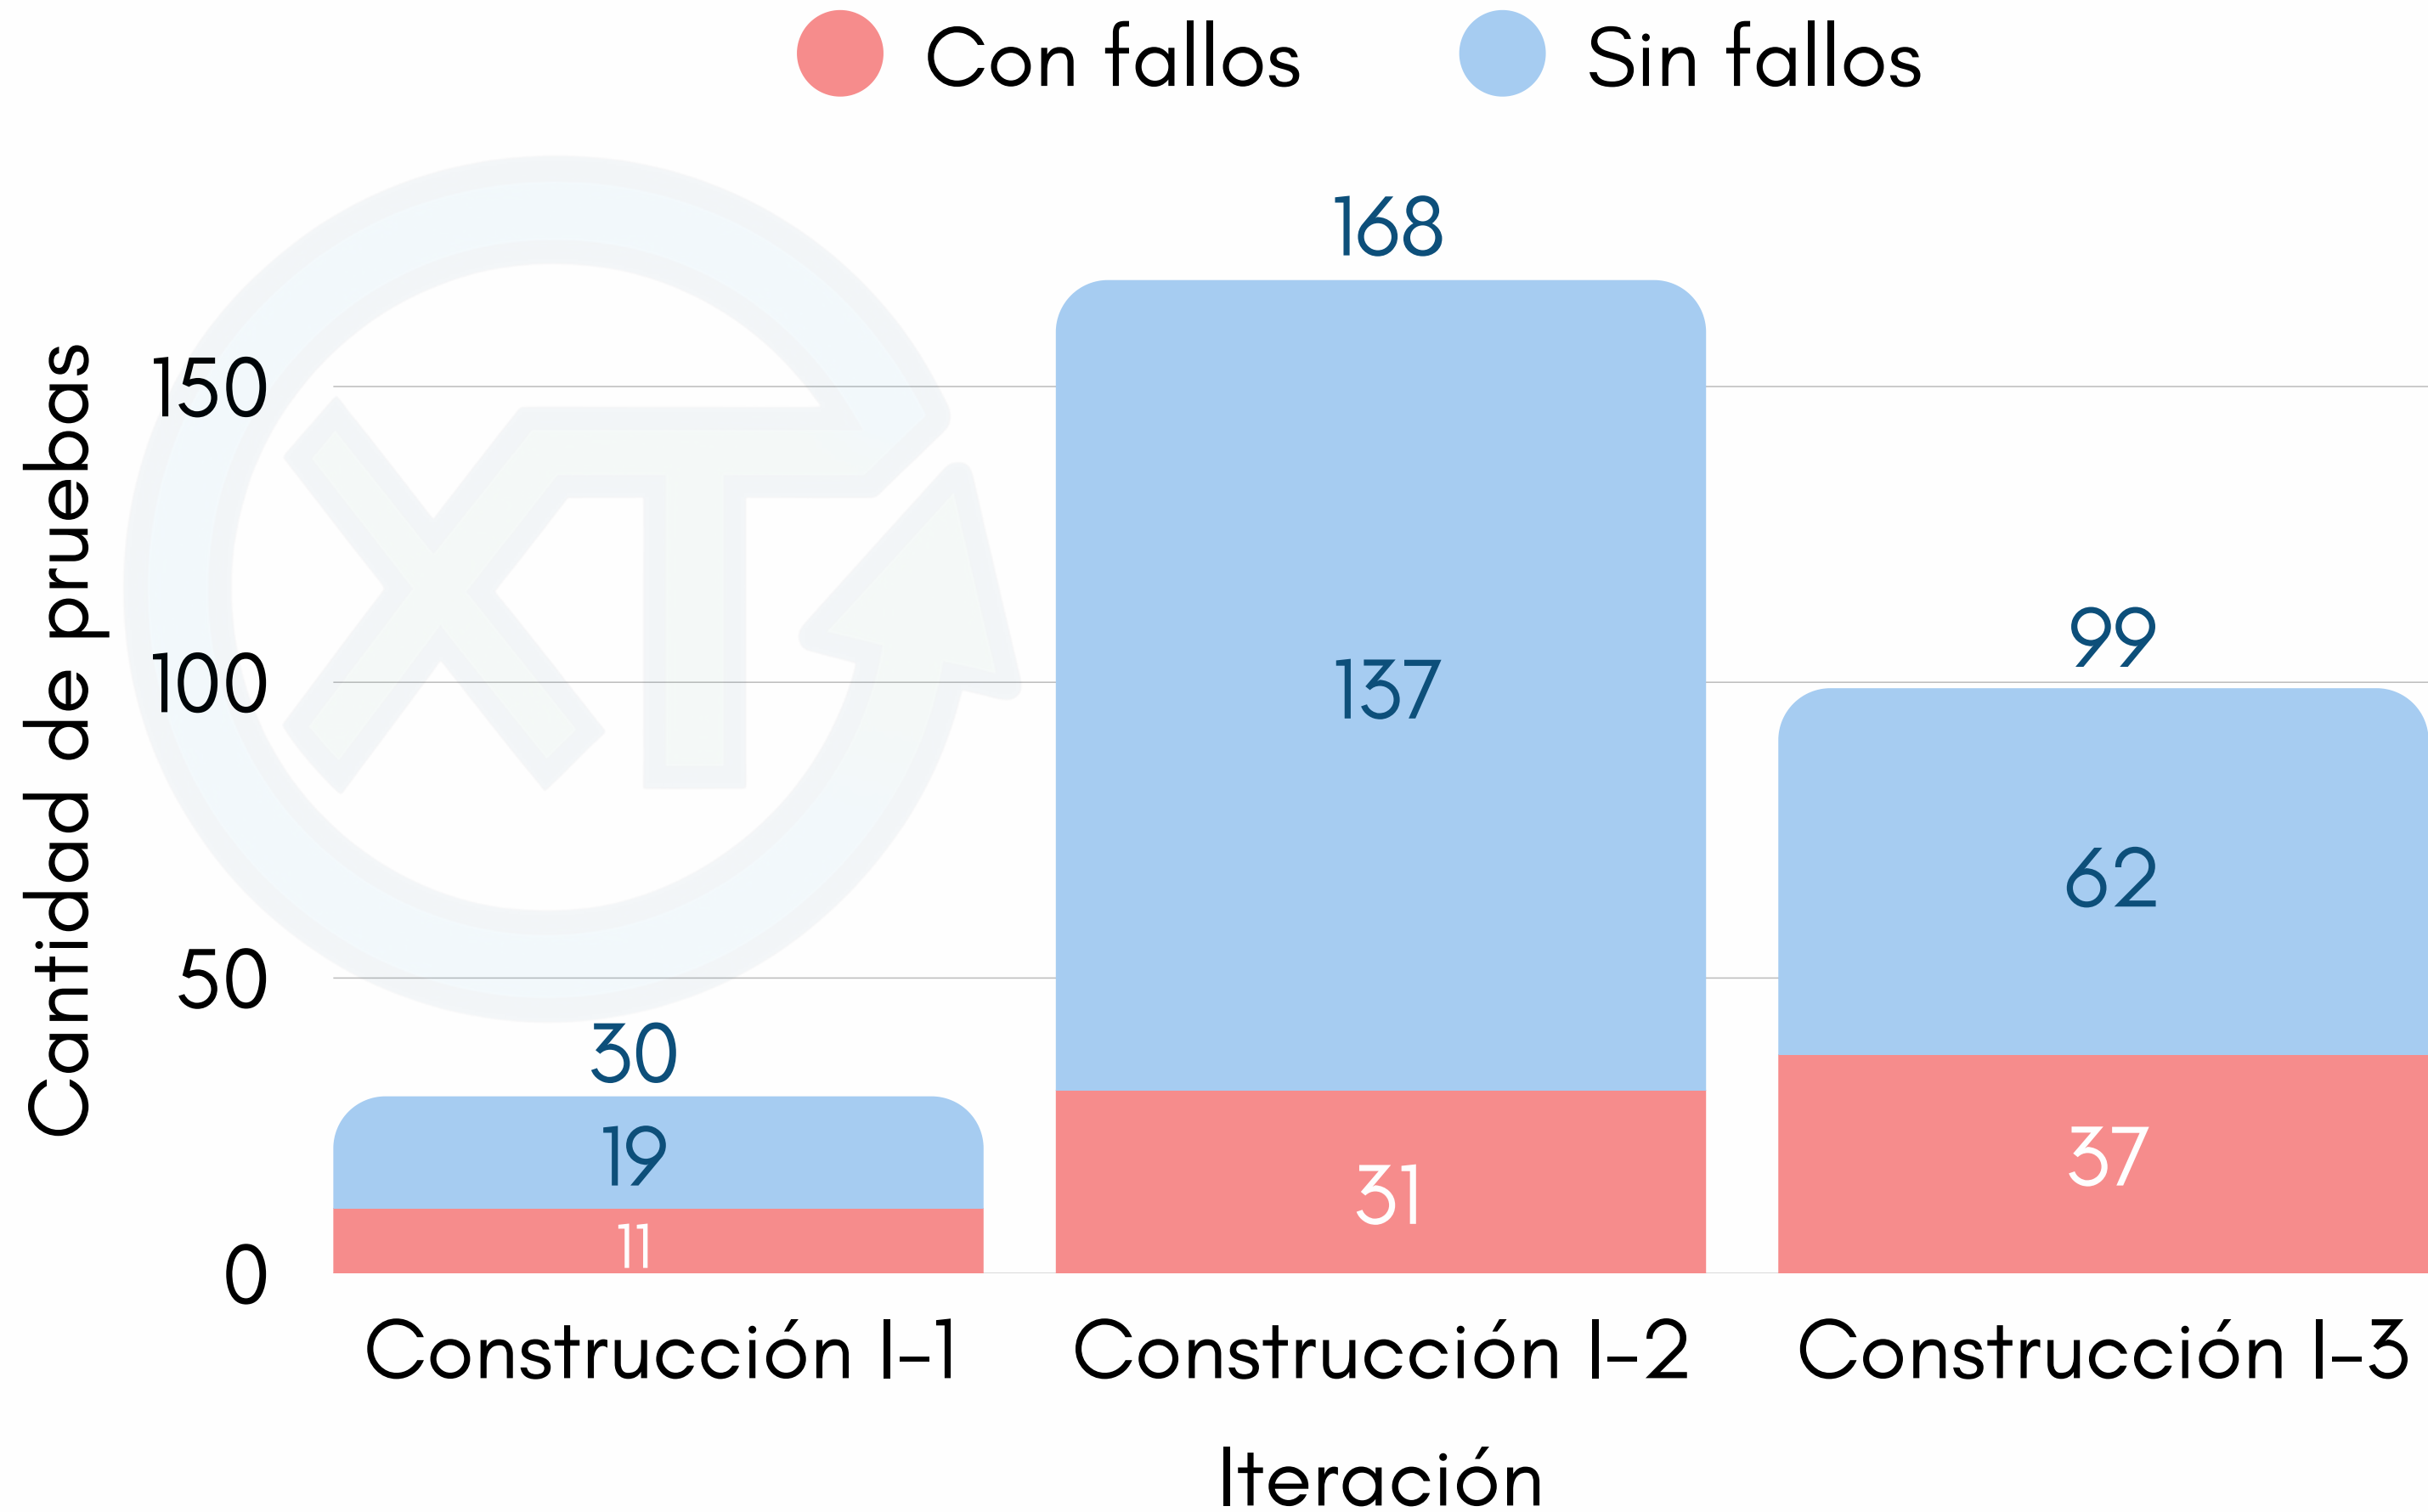

RESUMEN DE PRUEBAS

TEST UNITARIOS

105

OTRAS PRUEBAS

194

EJECUTADOS

299

CON FALLOS

79

ERRORES ENCONTRADOS POR TIPO DE PRUEBA

FUNCIONALIDAD

34

VALORES LIMITES

21

SEGURIDAD

5

INTEGRACIÓN

11

UNITARIOS

8




MÉTRICAS



MÉTRICAS DE CALIDAD
PLANIFICADO (100%) VS EJECUTADO

- RTF
- Reuniones
- Revisiones de documentos
- Documentos sin ajustes

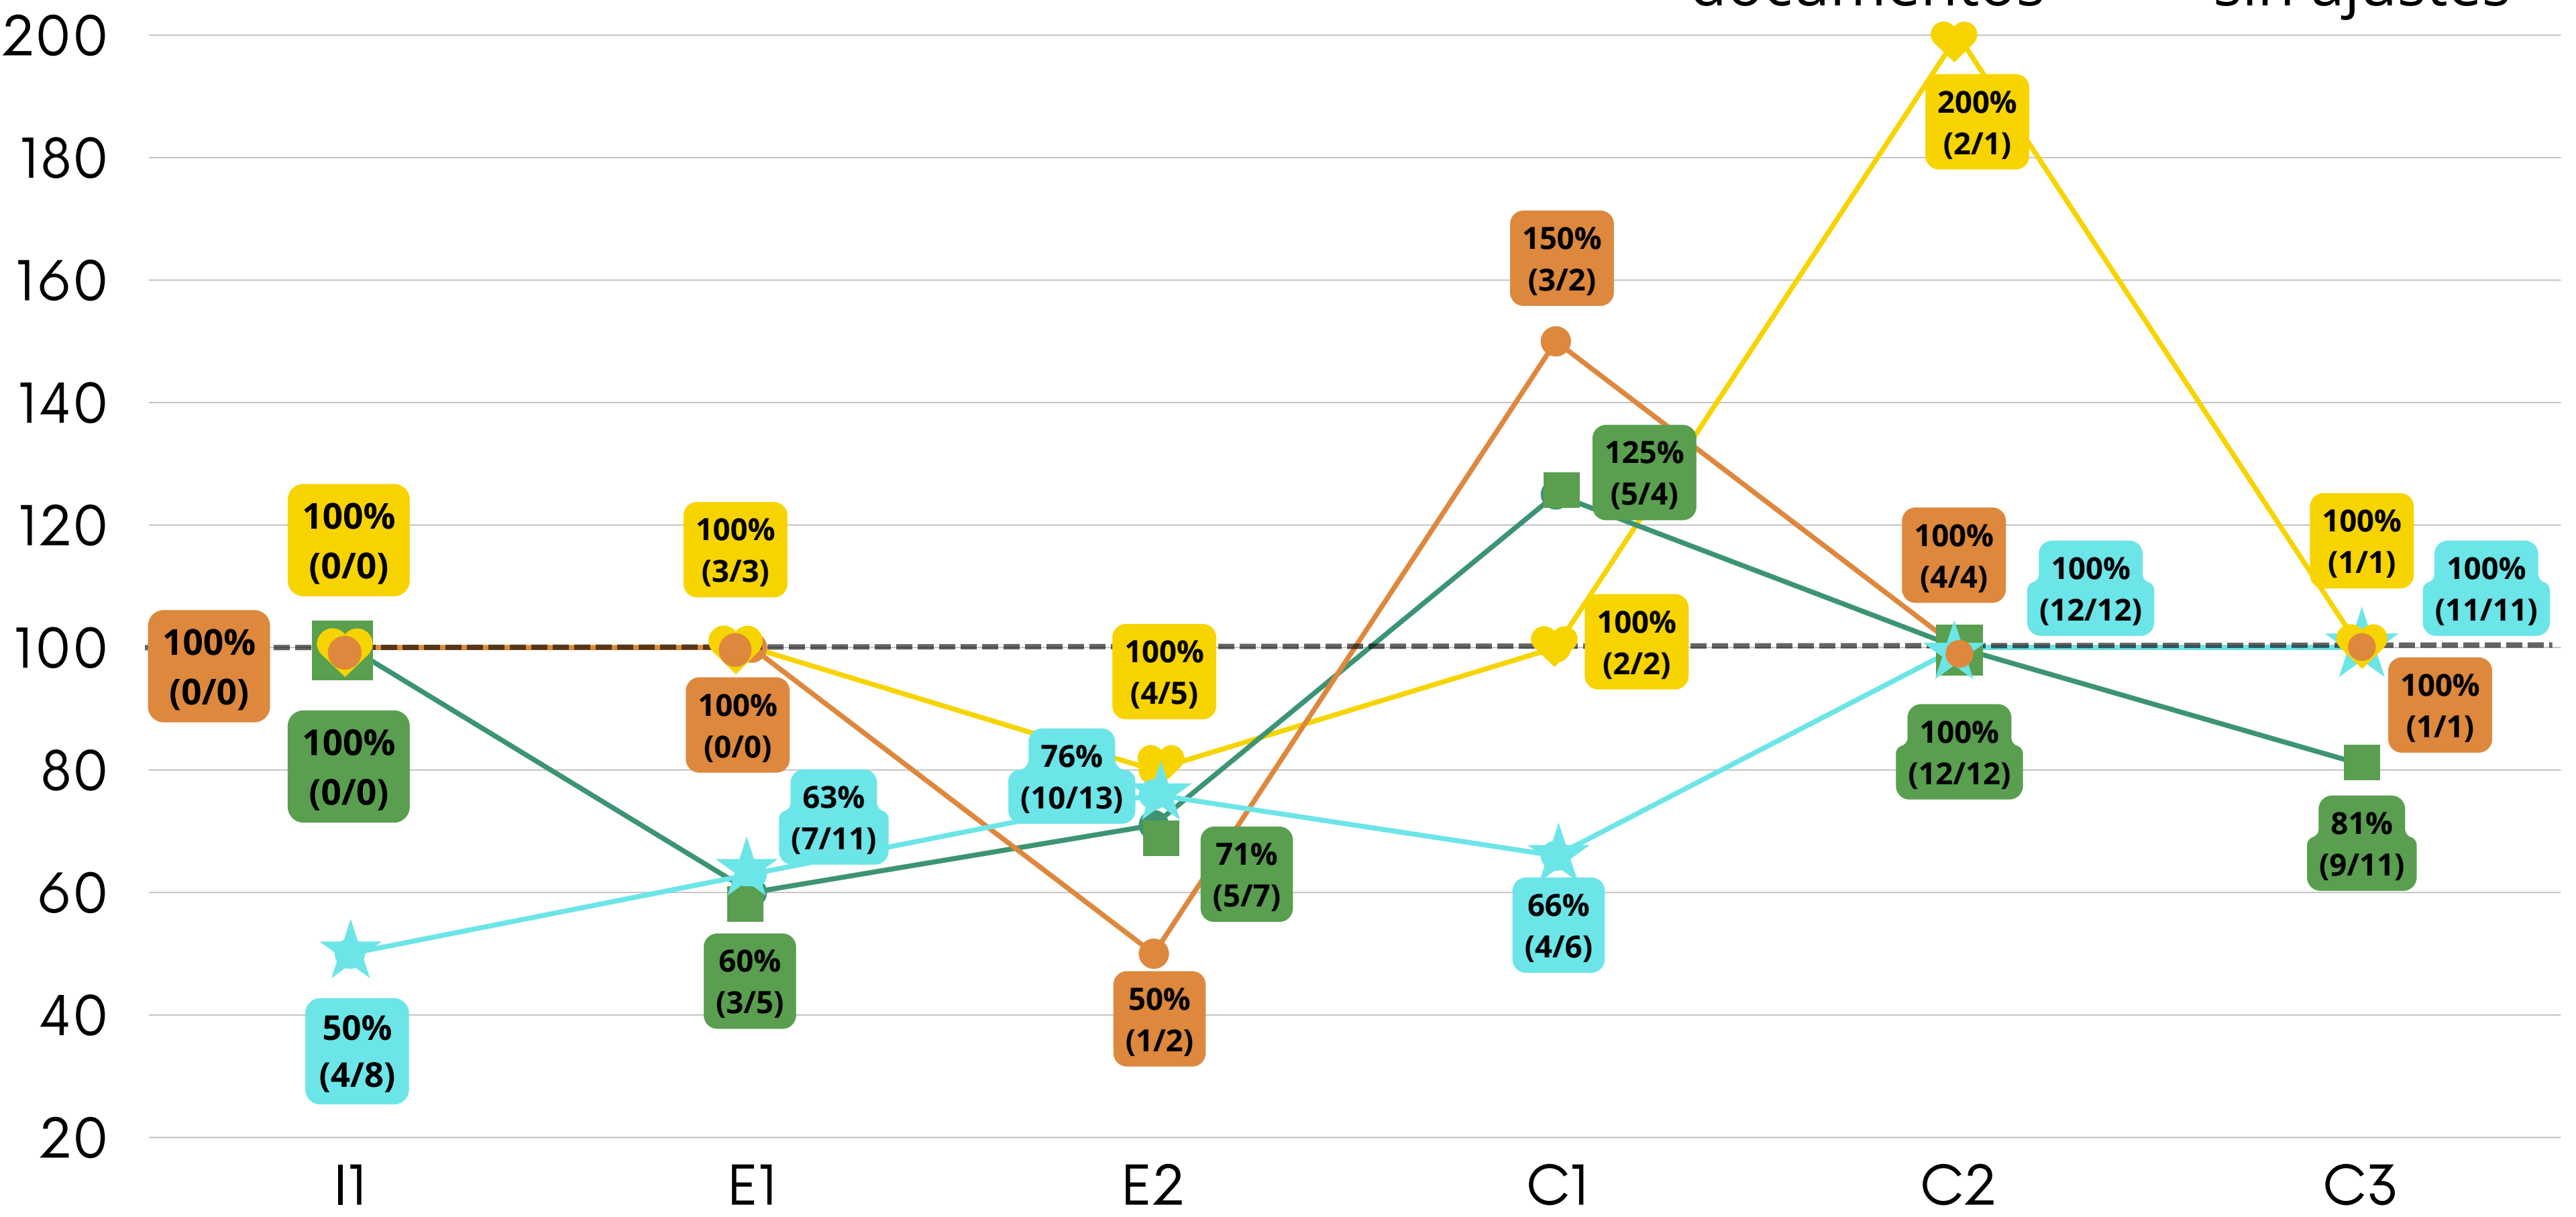



IMPLEMENTACIÓN





**MUCHAS
GRACIAS**

Equipo NexTech
