KAIROS



HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN, REGISTRO DE TIEMPOS Y VISUALIZACIÓN DEL TRABAJO

CENTURIÓN VALERIA , **ESCALANTE** GUILLERMO,
MALDONADO AGUSTINA, **MENDEZ** FLORENCIA, **ULLOA** GONZALO

NEXTECH

ÍNDICE



1 REGISTRO DE TIEMPOS / COMMITS

2 ESTIMACIÓN

3 SEGUIMIENTO DE RIESGOS

4 RESUMEN DE CASOS DE USO

5 RESUMEN DE CASOS DE PRUEBA

6 MÉTRICAS

7 PRIORIZACIÓN DE CASOS DE USO


NEXTECH

TIEMPOS

NEXTECH

ESFUERZO SEMANAL POR CATEGORÍA

TOTAL GENERAL: 300.34 HORAS

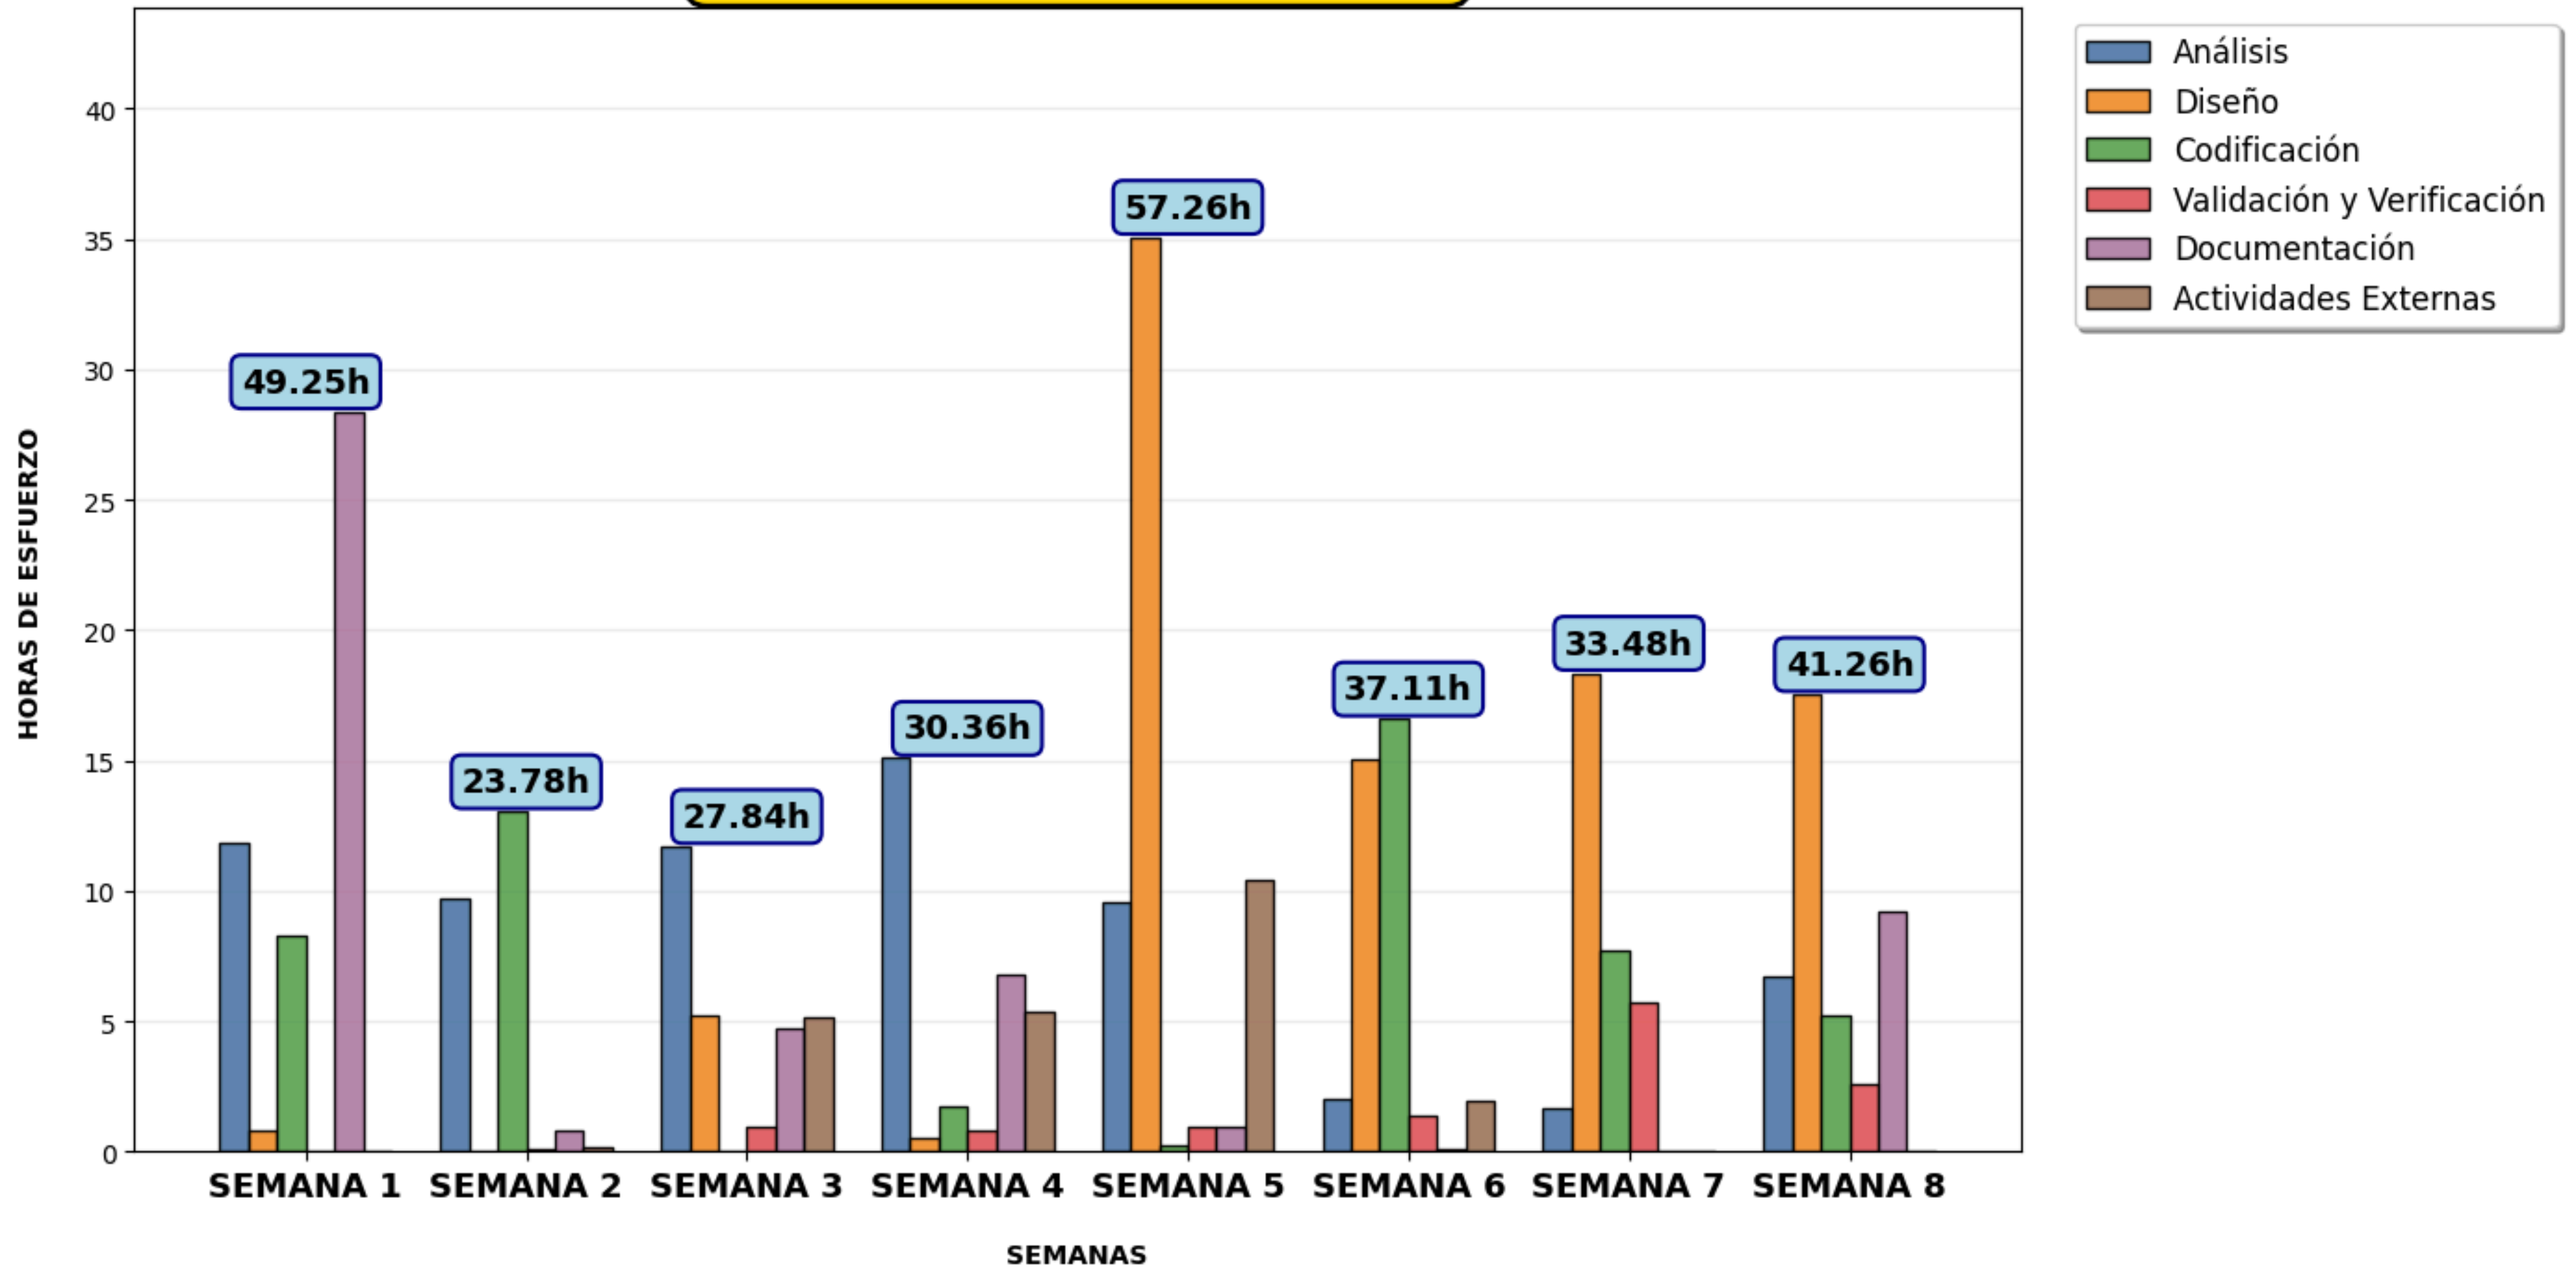




COMMITS

NEXTECH


Cantidad de Commits

Total: 80

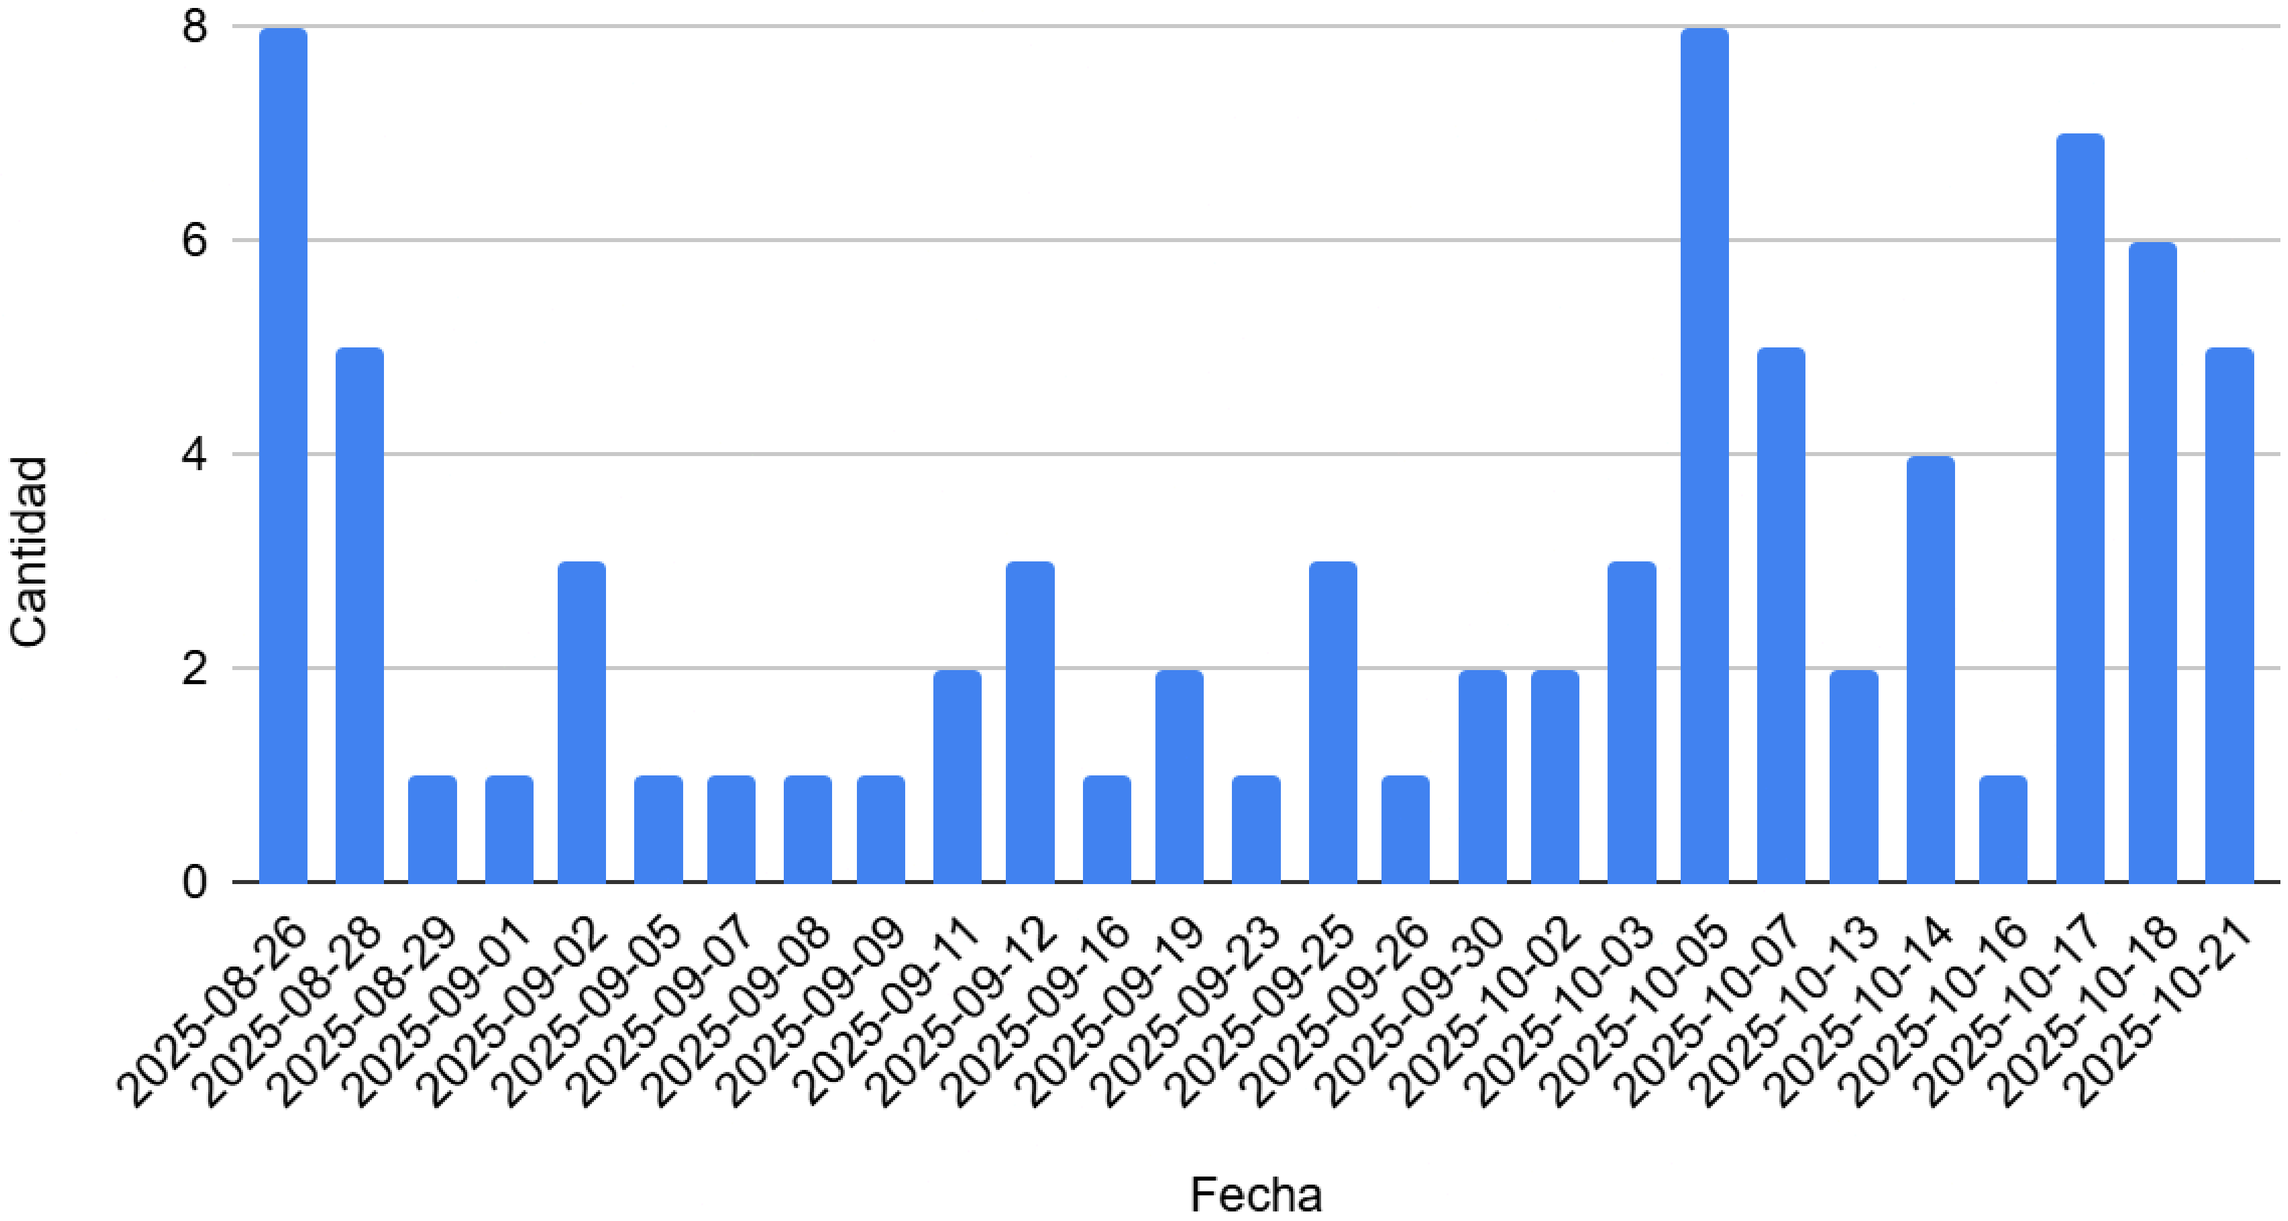

ESTIMACIÓN

NEXTECH

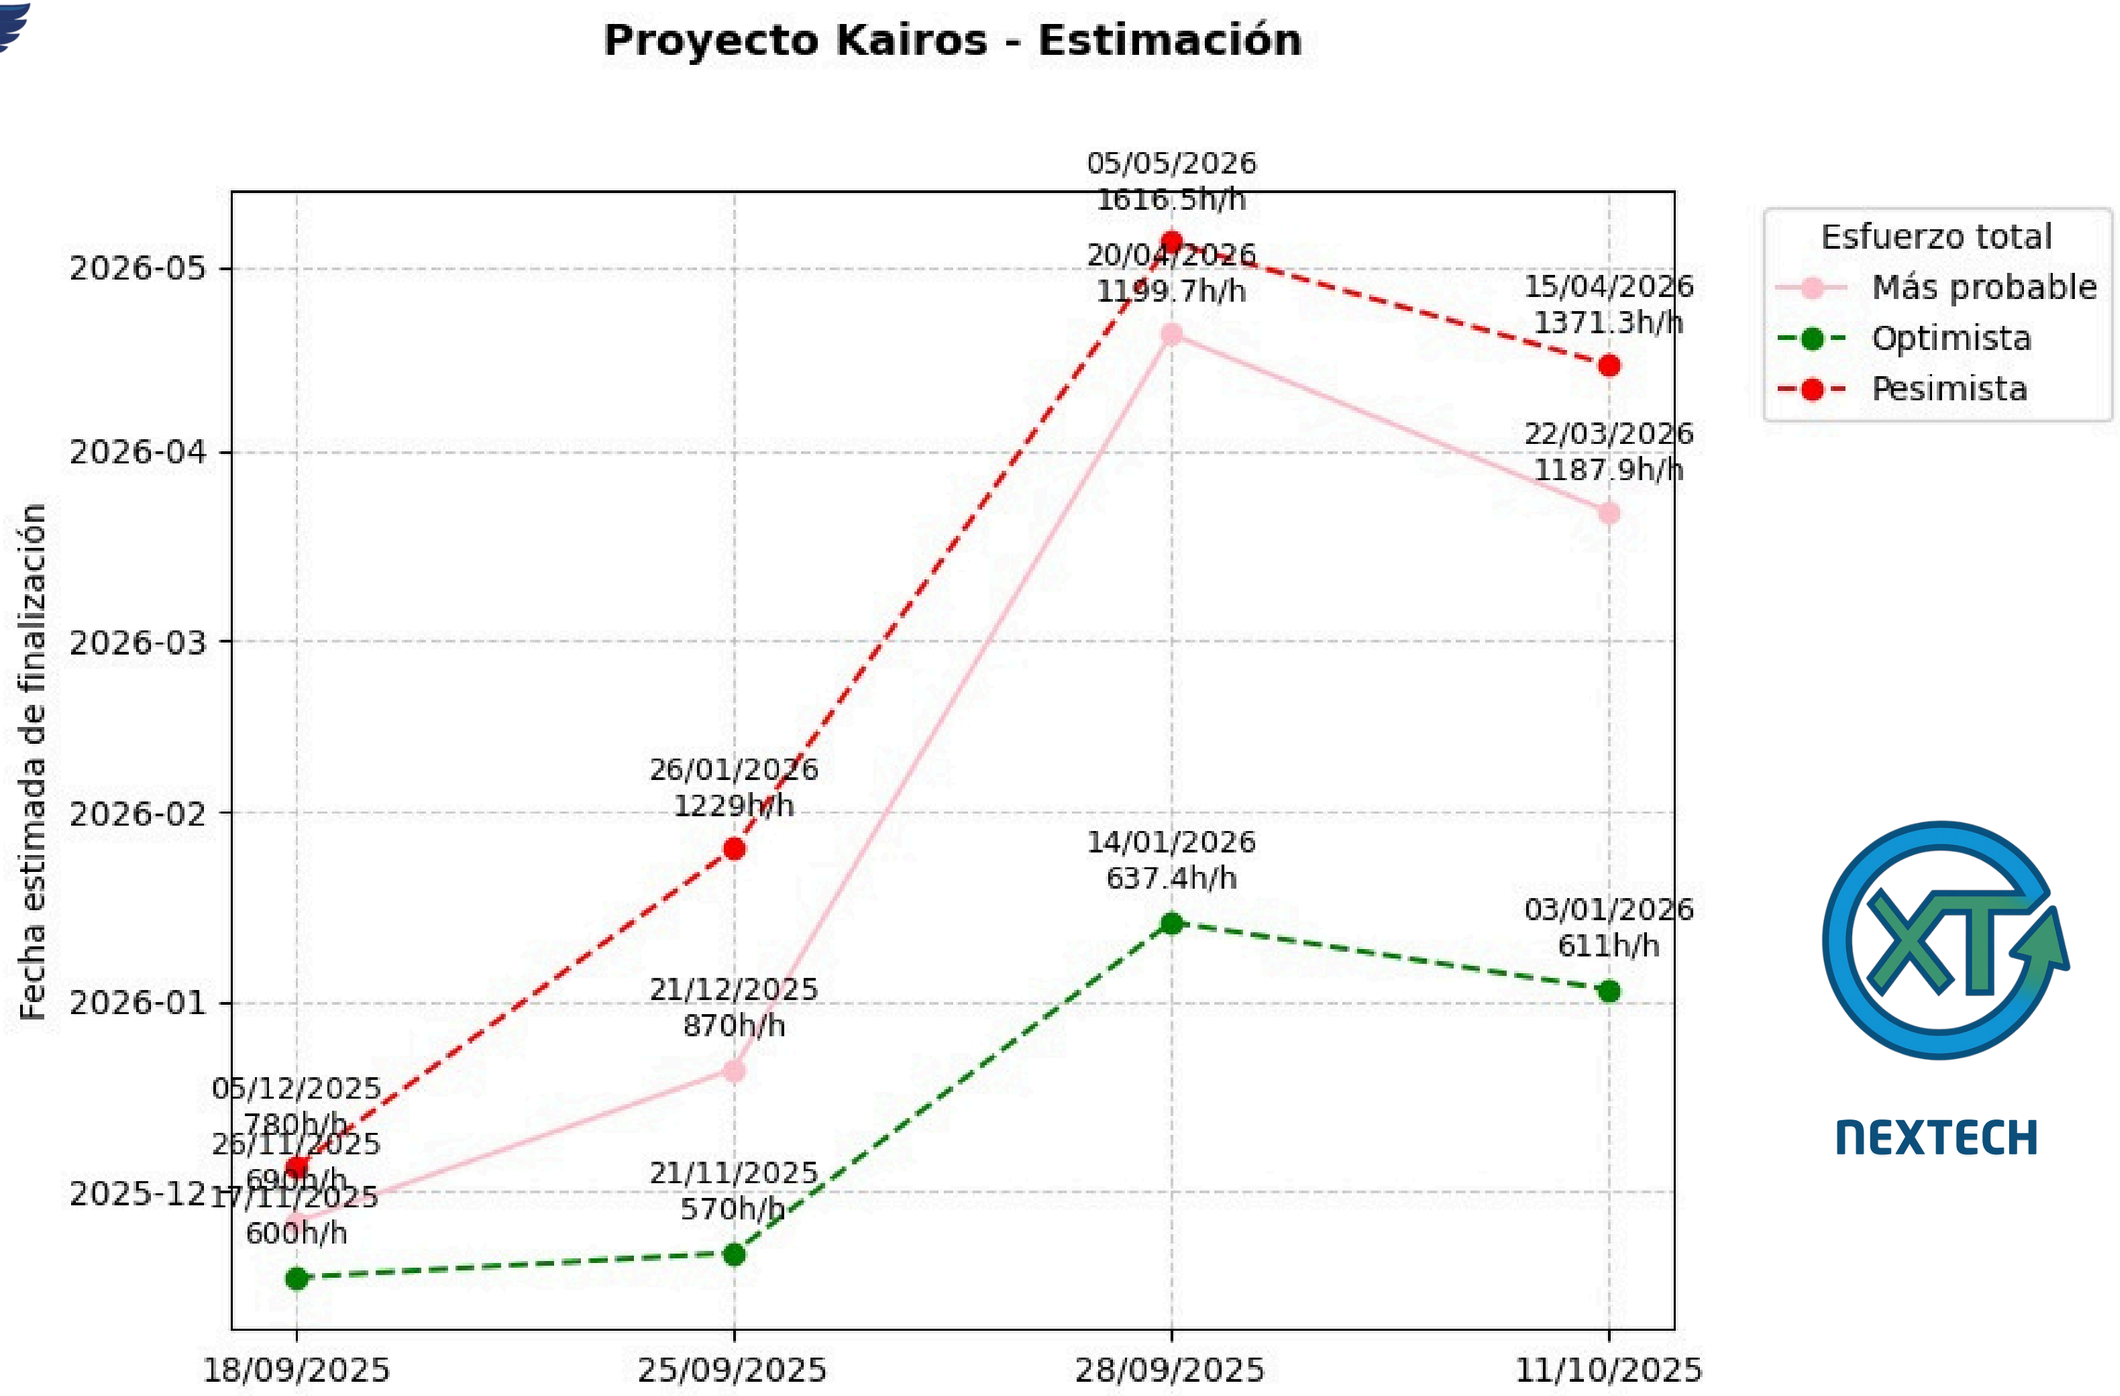
Proyecto Kairos - Estimación
Fecha estimada de finalización
2026-05
2026-04
2026-03
2026-02
2026-01
2025-12
18/09/2025
25/09/2025
28/09/2025
11/10/2025
Esfuerzo total
Más probable
Optimista
Pesimista
05/05/2026
1616.5h/h
20/04/2026
1199.7h/h
15/04/2026
1371.3h/h
22/03/2026
1187.9h/h
26/01/2026
1229h/h
14/01/2026
637.4h/h
03/01/2026
611h/h
21/12/2025
870h/h
05/12/2025
780h/h
26/11/2025
690h/h
17/11/2025
600h/h
21/11/2025
570h/h

NEXTECH

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

NEXTECH

RIESGOS

RK15: Dada la posible ausencia de algún integrante del grupo, podría ocurrir que ciertas tareas queden sin responsable, lo que conduciría a sobrecarga de trabajo para el resto del equipo y retrasos en entregas.

Plan de Riesgos

Estrategia de Respuesta	Responsable	Tarea	Fecha inicio	Fecha fin
Mitigación	Gonzalo Ulloa	Definir responsabilidades	20/10/25	22/10/25

NEXTECH

RESUMEN DE CASOS DE USO

NEXTECH

ESTADO ACTUAL DE LOS CASOS DE USO

Caso de Uso	Estado
CU01: Iniciar Sesión	Completado
CU02: Exportar informacion	No implementado
CU03: Asignar Rol	No implementado
CU04: Modificar Perfil	No implementado
CU05: Crear Proyecto	No implementado
CU06: Modificar Proyecto	No implementado
CU07: Crear Etapa	No implementado
CU08: Crear iteración	No implementado

Caso de Uso	Estado
CU09: Crear Tarea	No implementado
CU10: Proponer Tarea	No implementado
CU11: Aprobar Tarea	No implementado
CU12: Estimar Tarea	No implementado
CU13: Asignar dependencia	No implementado
CU14: Modificar estado de tarea	No implementado
CU15: Visualizar Tarea	No implementado

ESTADO ACTUAL DE LOS CASUS DE USO

CU16: Comentar Tarea	**No implementado**
CU17: Categorizar tiempo	**No implementado**
CU18: Añadir Categoría	**No implementado**
CU19: Modificar Categoría	**No implementado**
CU21: Categorizar tiempo	**No implementado**
CU20: Registrar tiempo por cronómetro	**No implementado**
CU21: Registrar tiempo manual	**No implementado**
CU22: Ver reporte	**No implementado**
CU23: Registrar usuario al proyecto	**No implementado**


ESTADO ACTUAL DE LOS CASOS DE PRUEBA

Caso de Uso	Tipo de Prueba	Casos Ejecutados
CU01: Iniciar Sesión	**Valores límite**	**4**
Totales	**—**	**4**


MÉTRICAS

NEXTECH


DOCUMENTOS SIN NECESIDAD DE AJUSTE

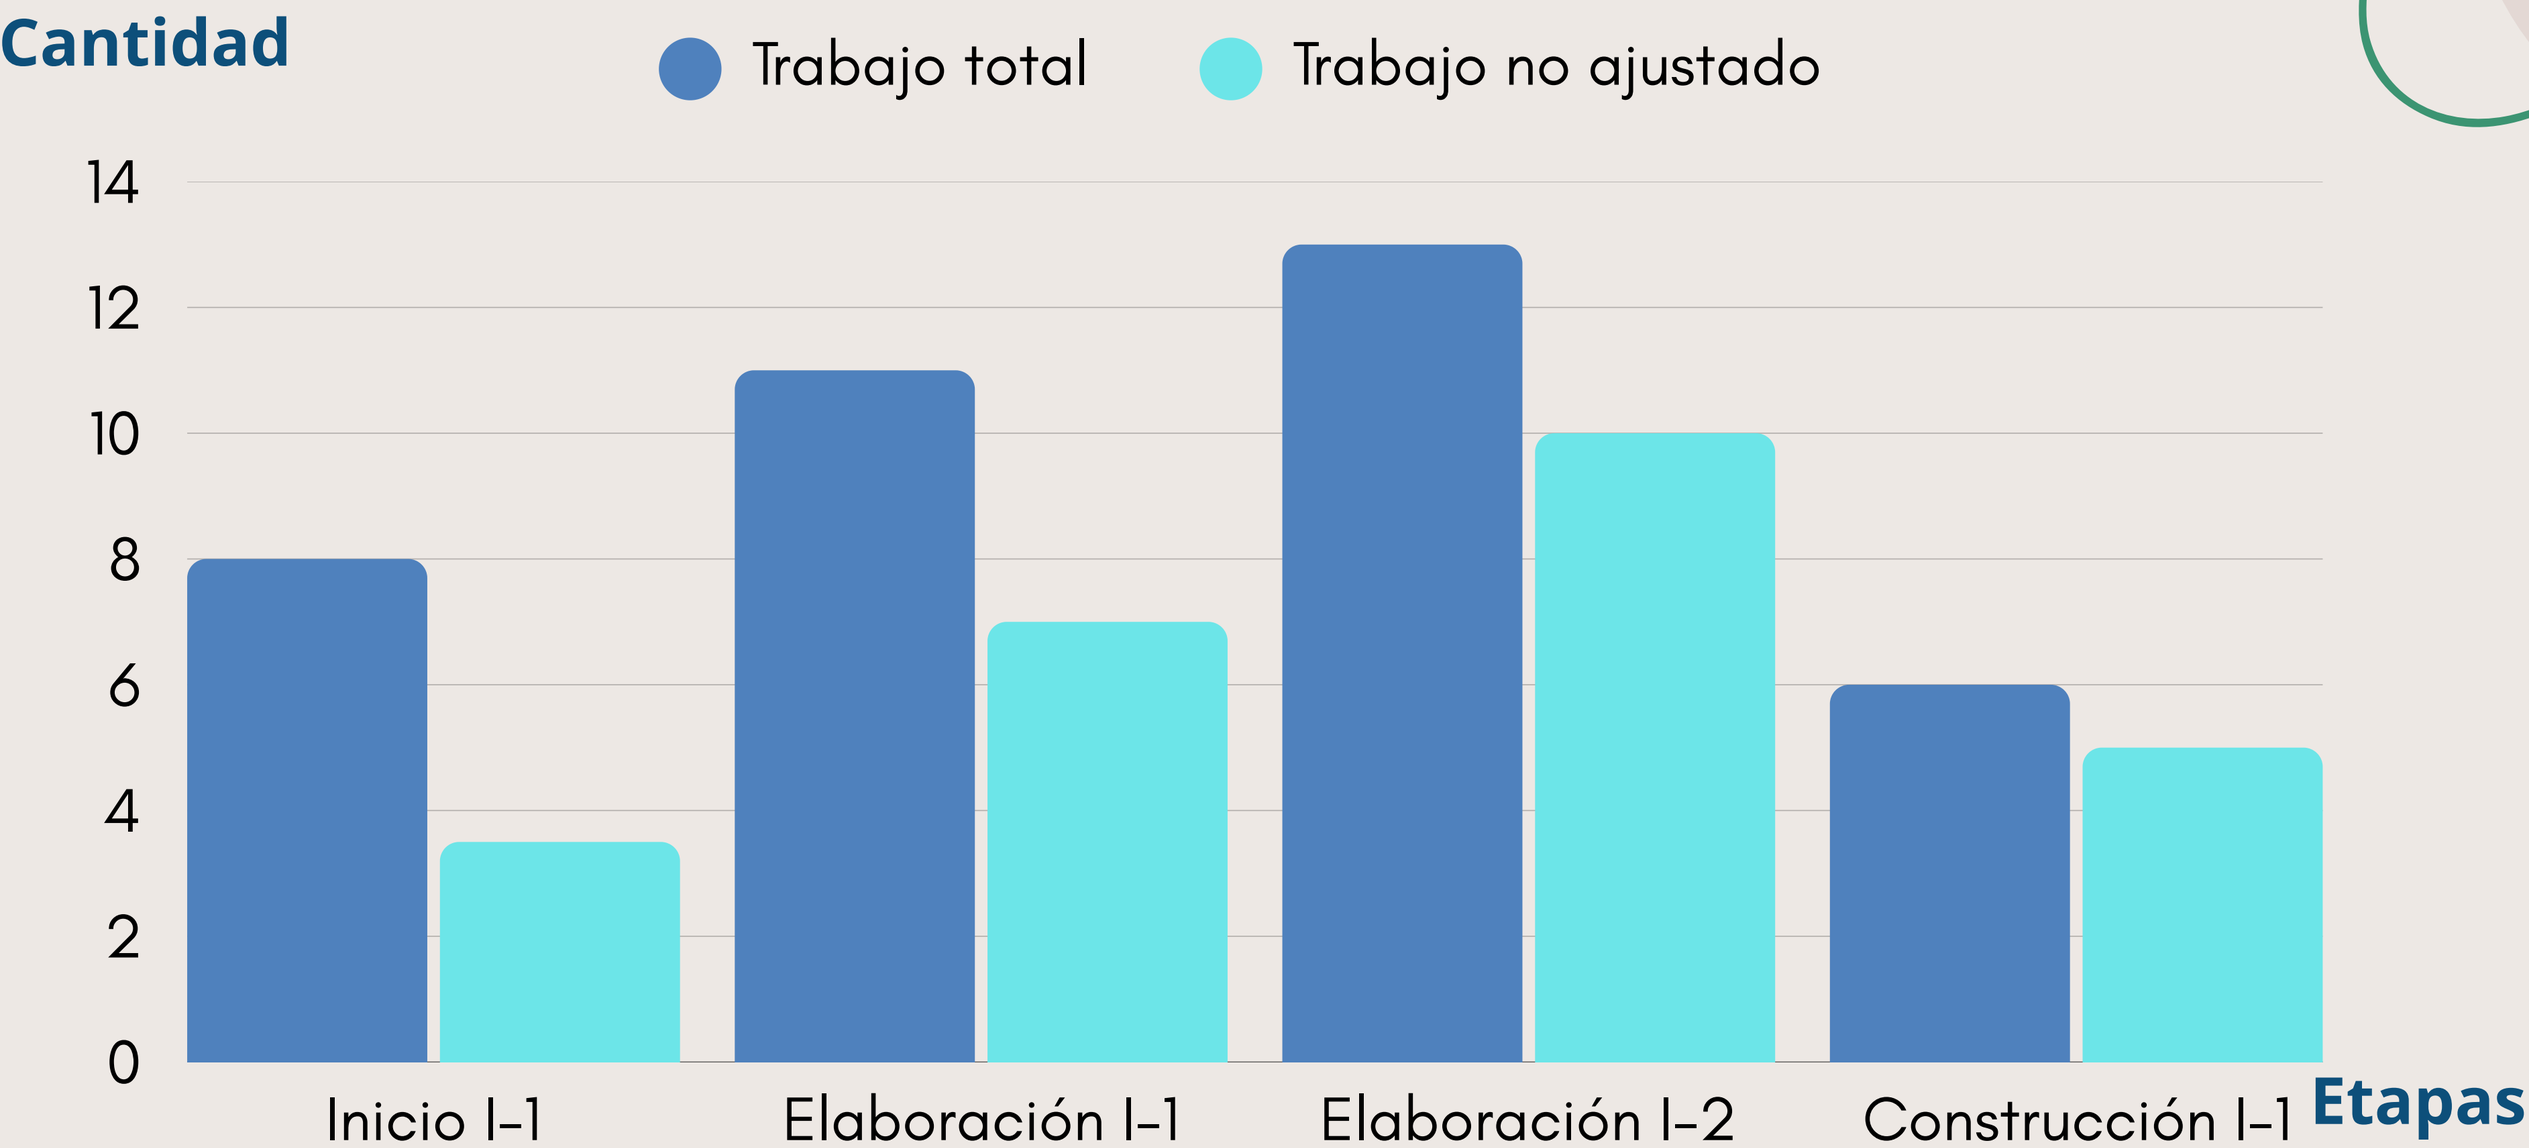


REUNIONES

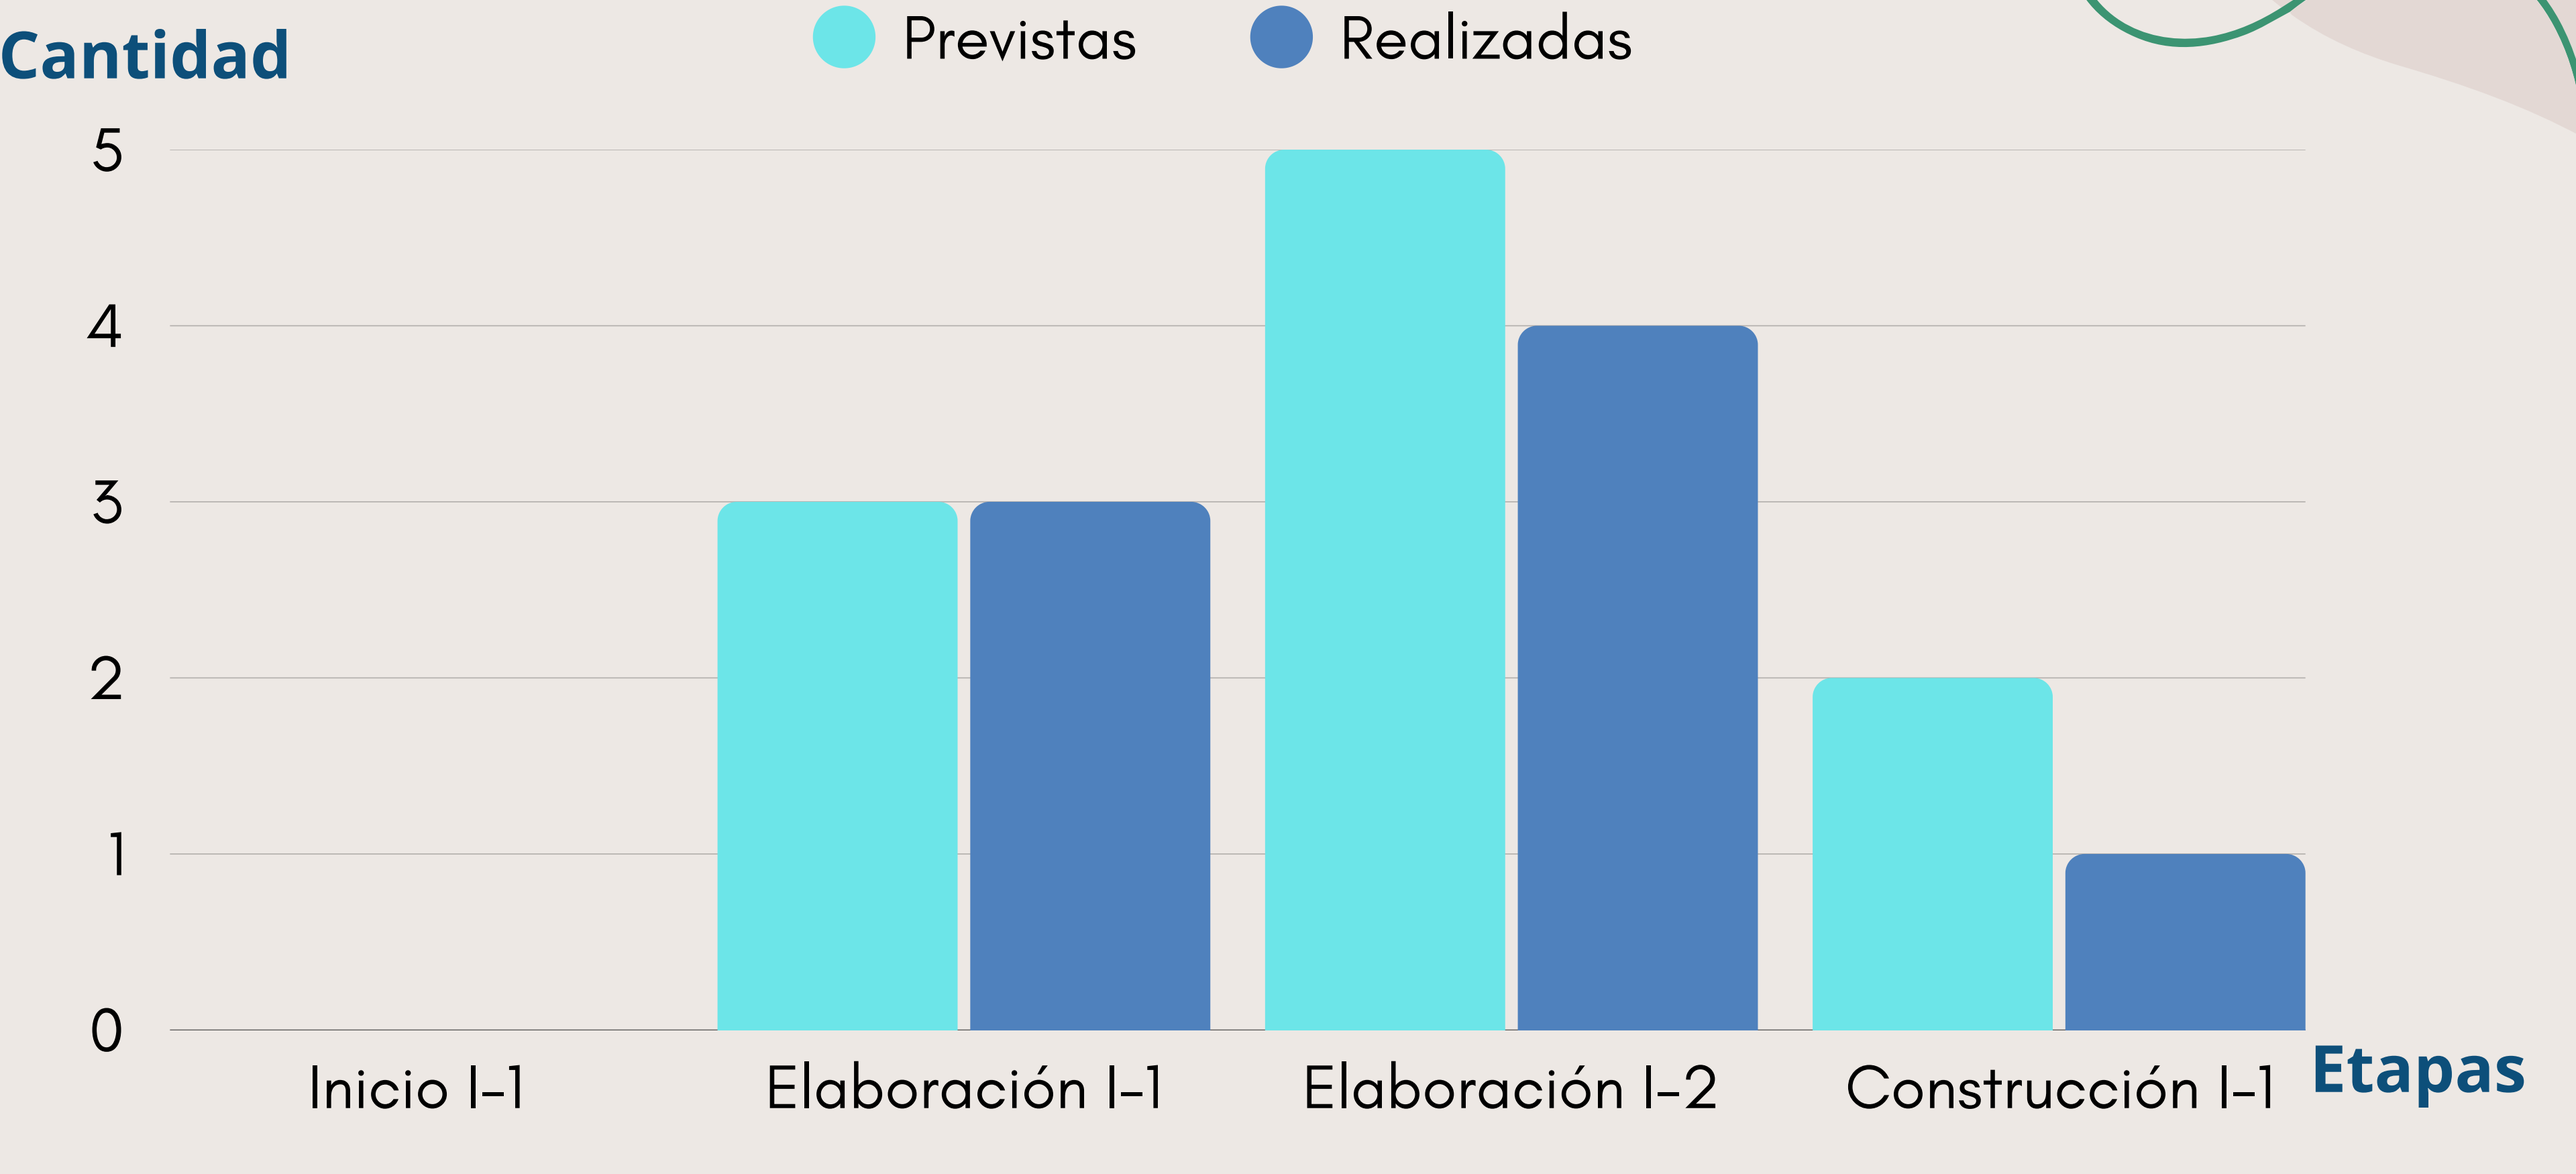
Cantidad
Previstas
Realizadas
5
4
3
2
1
0
Inicio I-1
Elaboración I-1
Elaboración I-2
Construcción I-1
Etapas


RTF POR ITERACIÓN

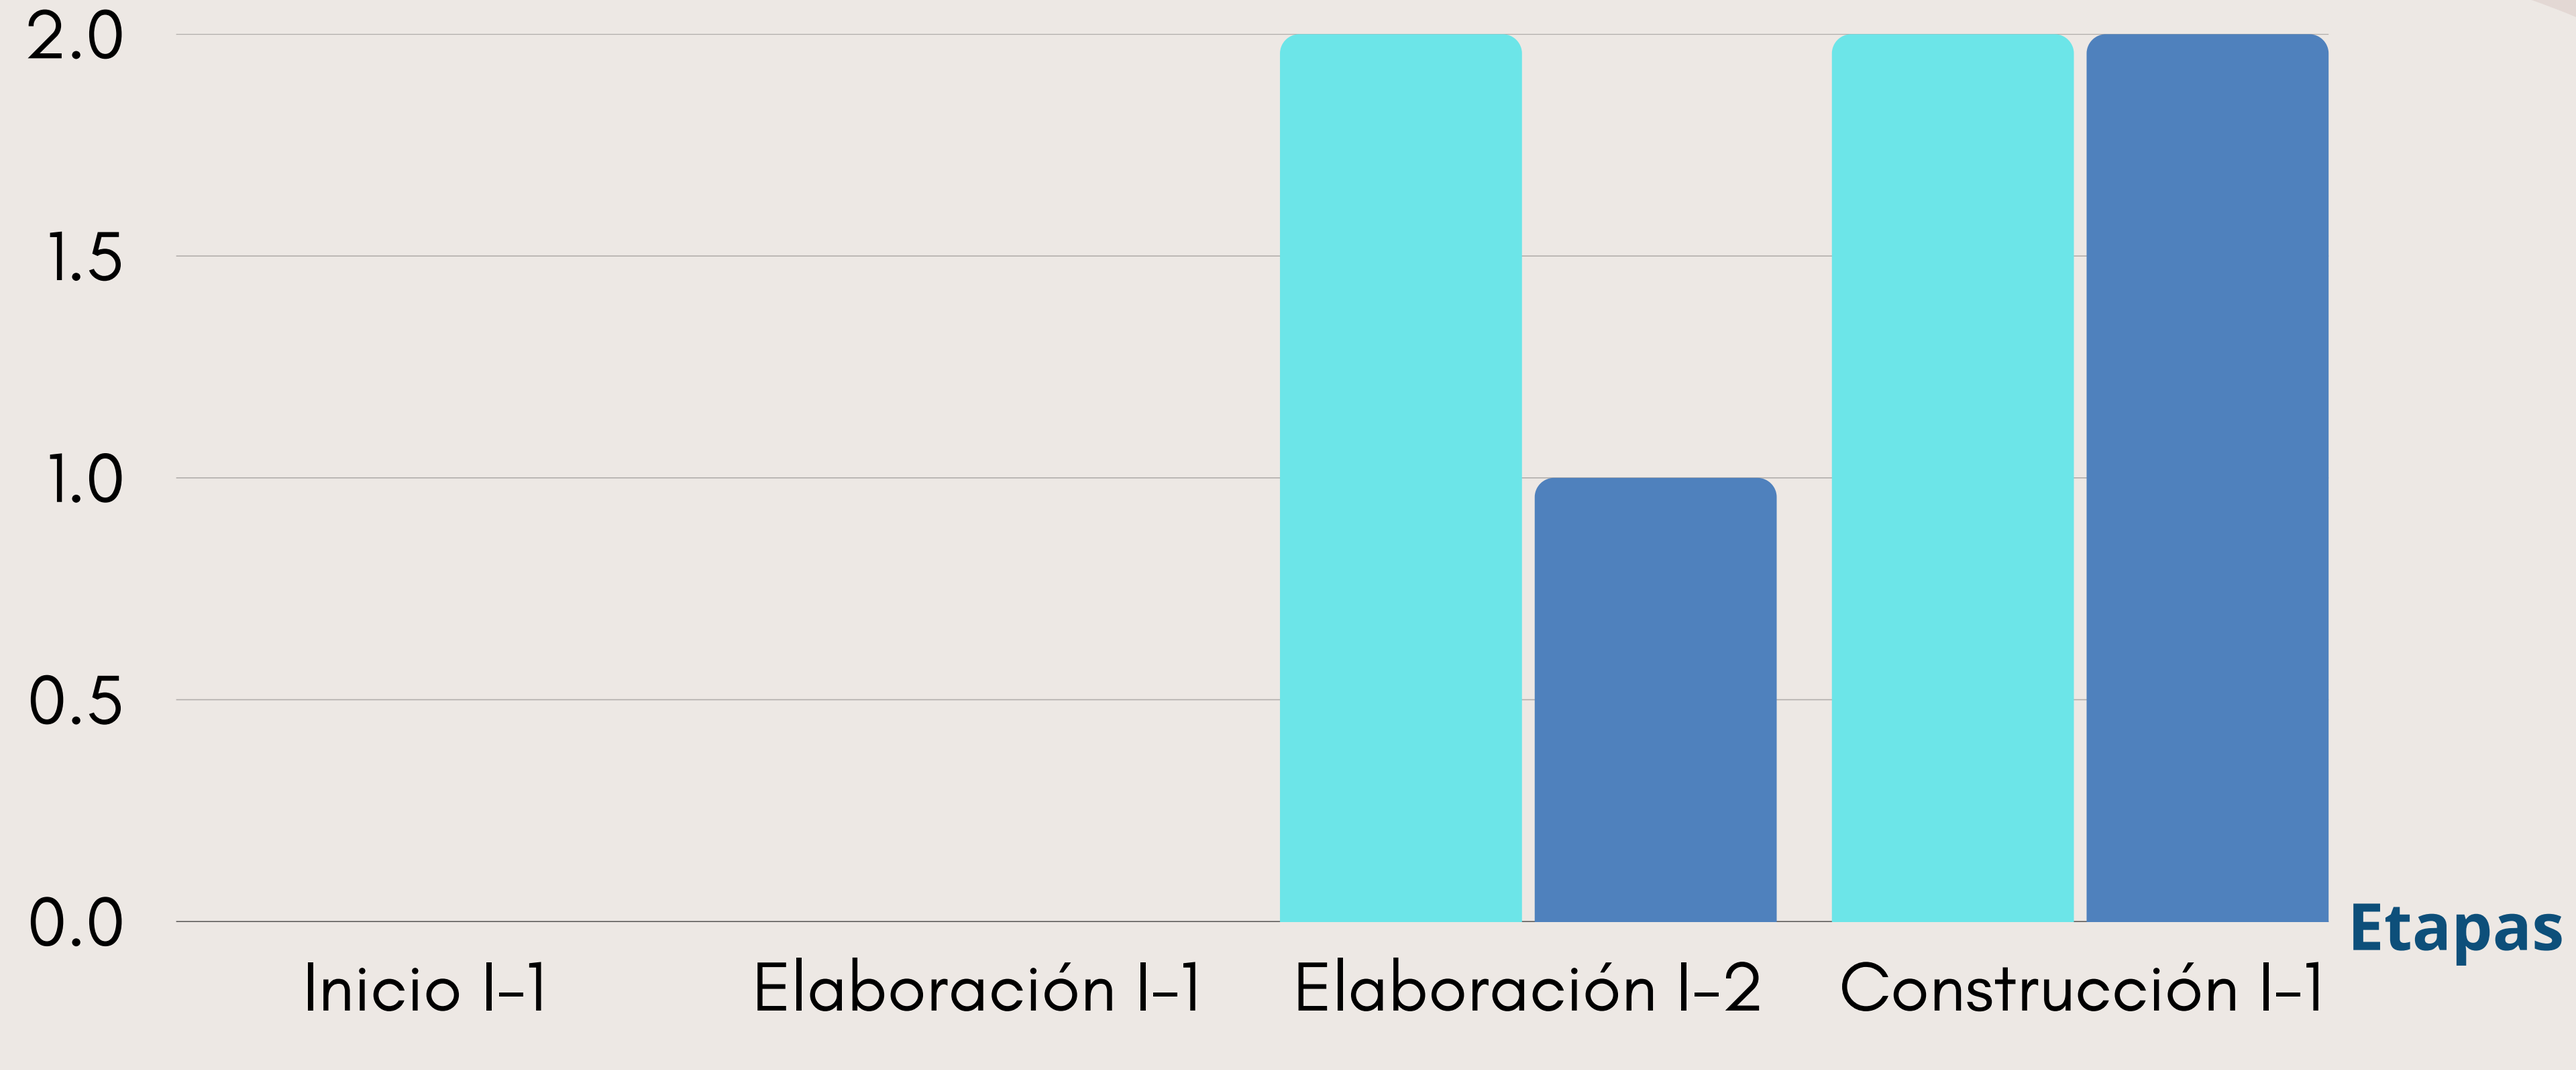

REVISIÓN DE DOCUMENTOS

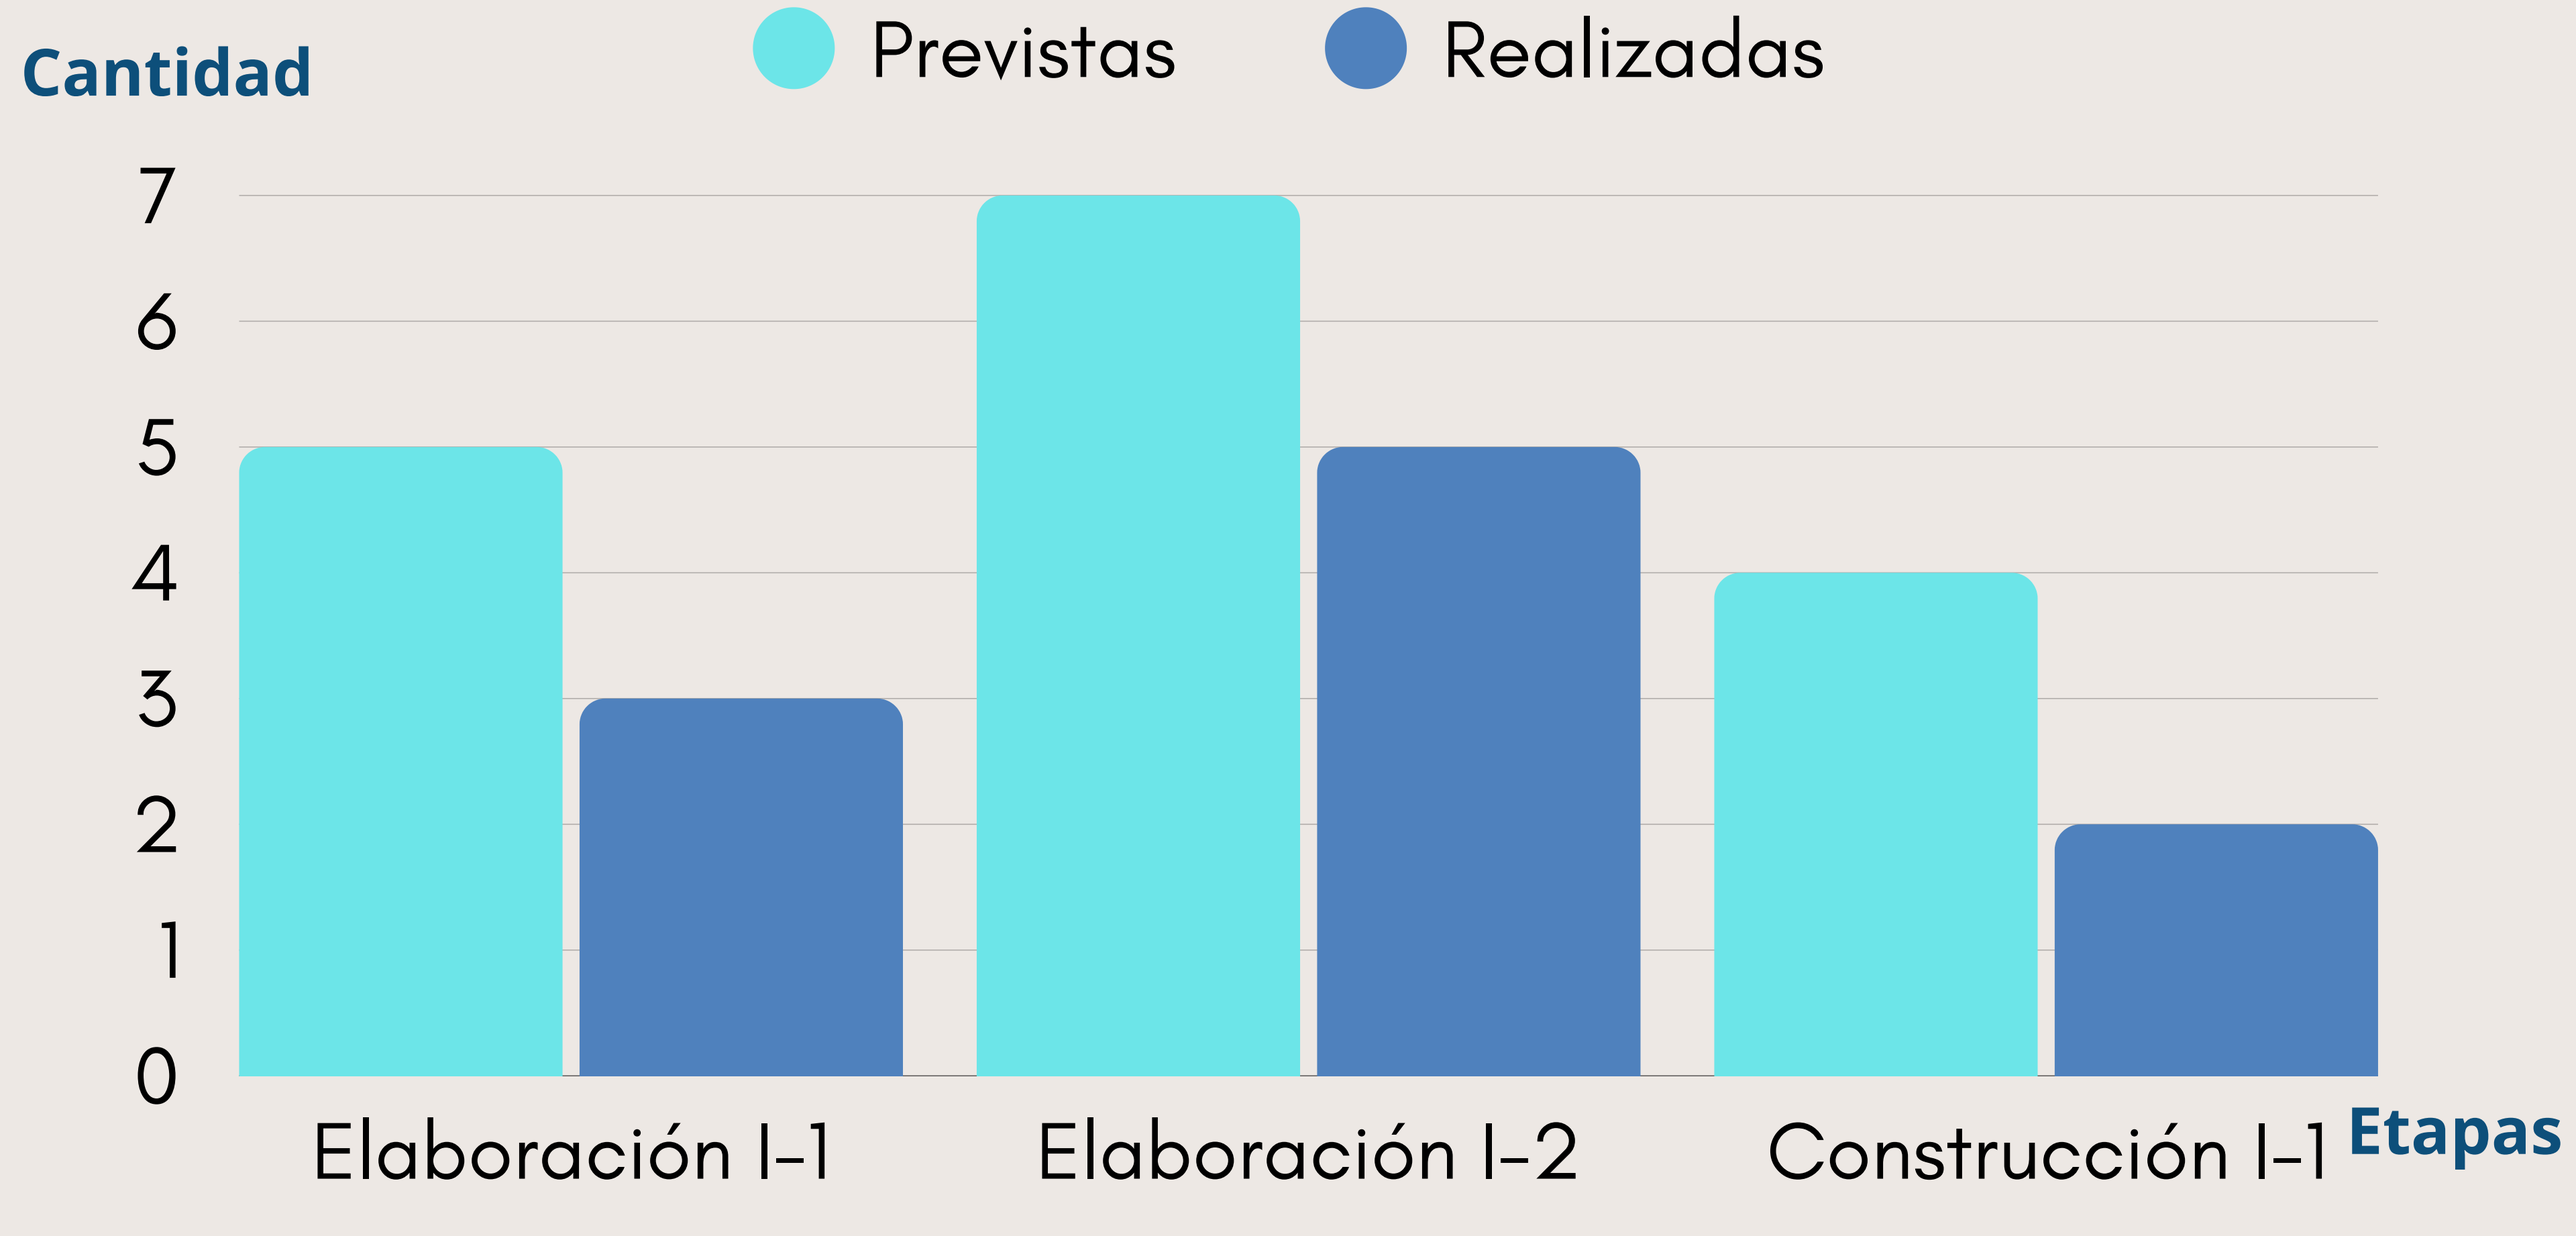

MÉTRICAS DE CALIDAD
EJECUCIÓN VS PLANIFICADO (100%)

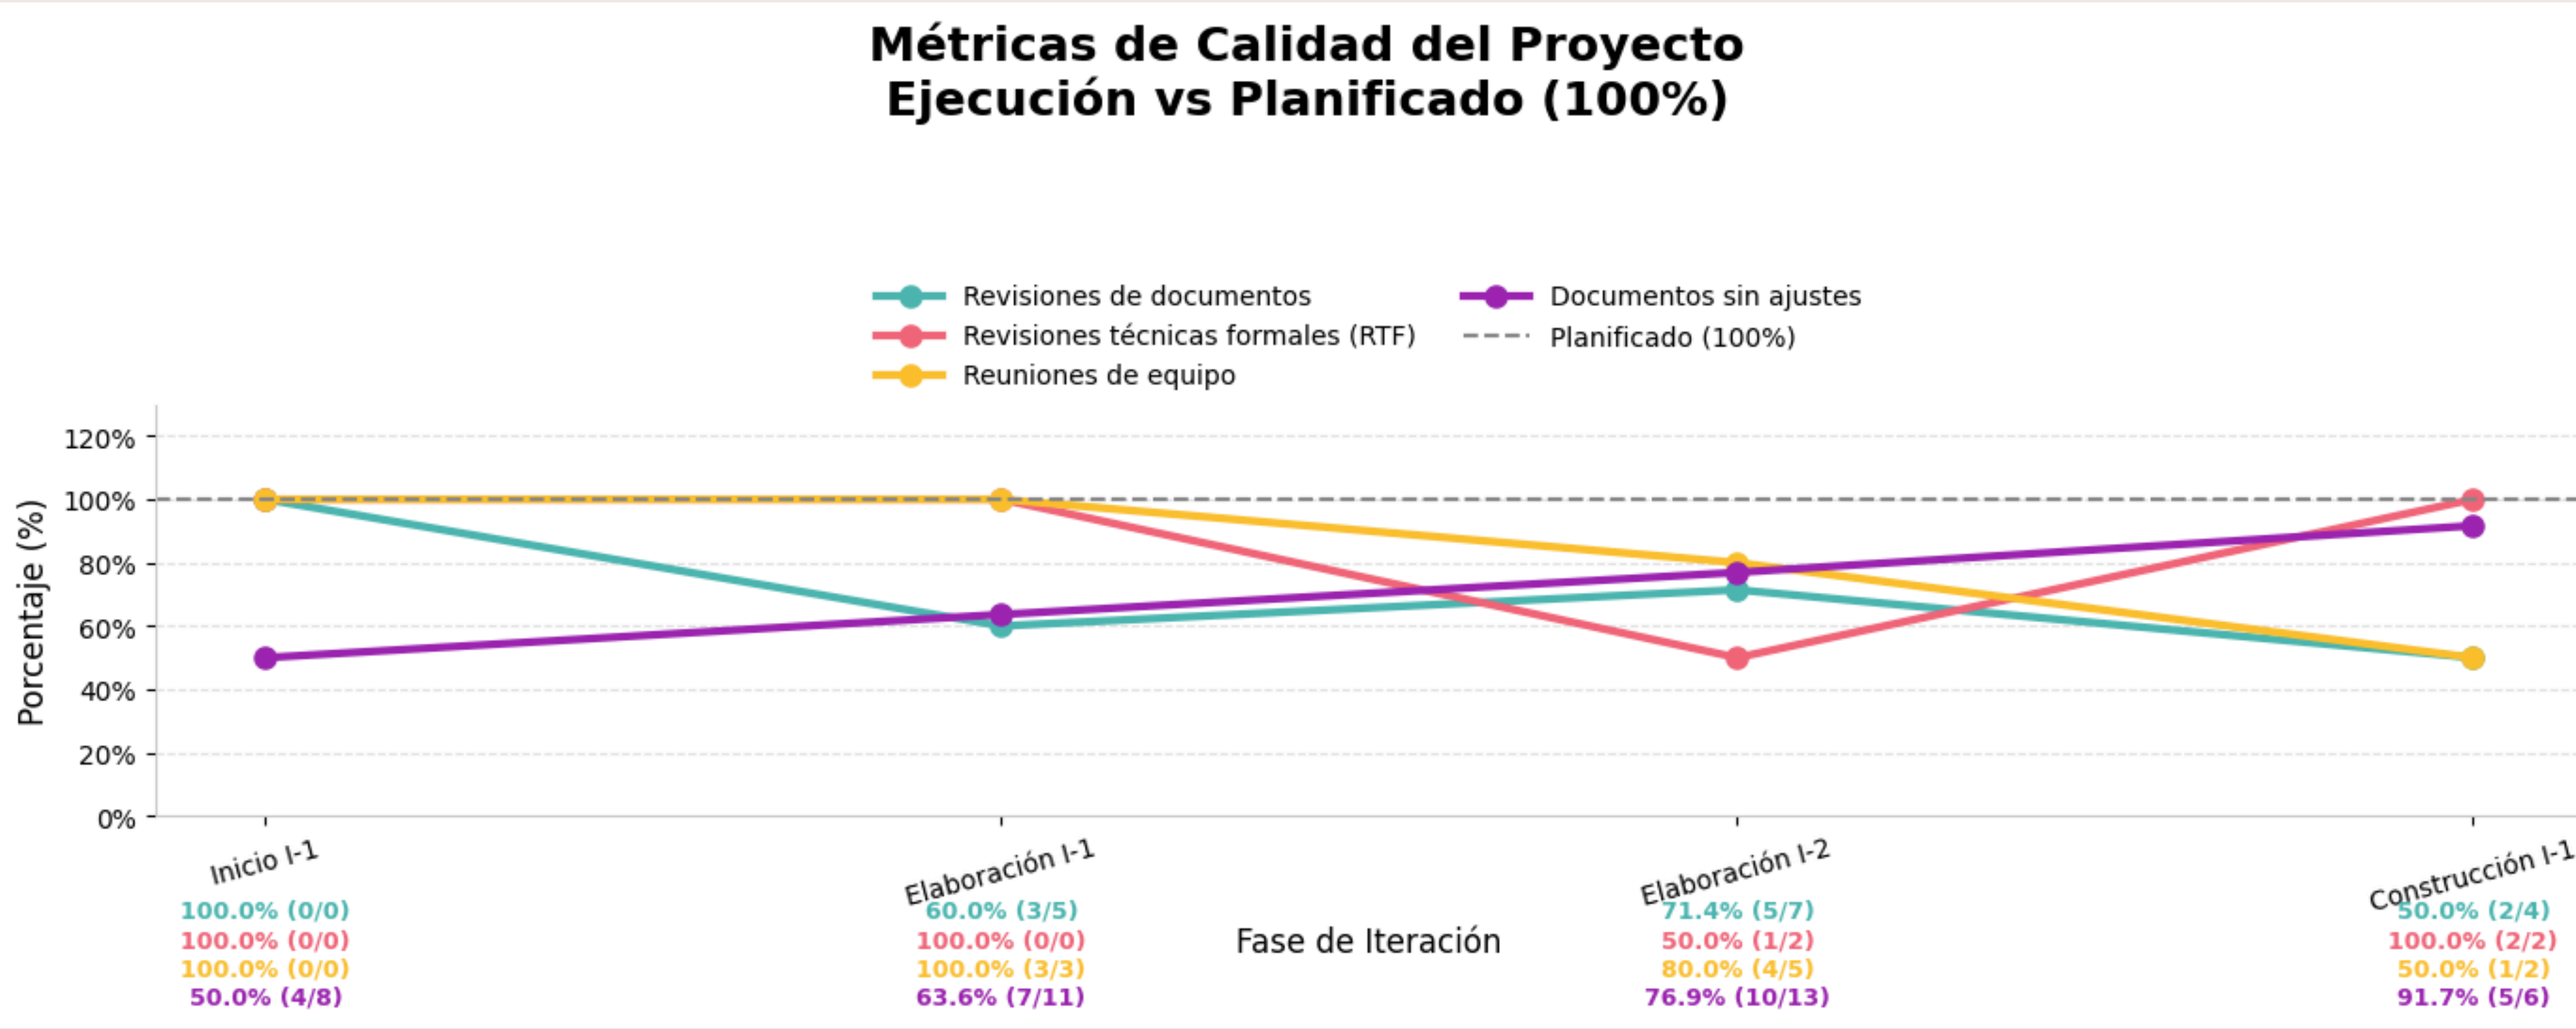




PRIORIZACIÓN DE CASOS DE USO

NEXTECH

EVALUACIÓN

Técnica	Estimación	Revisión
MoSCoW	**PCU**	**Prioridades**







NEXTECH

MOSCOW

Must

ID	Caso de Uso	Justificación breve
CU01	Iniciar Sesión	Acceso al sistema
CU05	Crear Proyecto	Inicio de estructura de trabajo
CU07	Crear etapa	Organización por fases
CU08	Crear iteración	Organización por etapas
CU09	Crear tarea	Unidad básica de trabajo
CU12	Estimar tarea	Necesario para planificación
CU13	Asignar dependencia	Orden lógico de tareas
CU20	Registrar tiempo por cronómetro	Registro de tiempo a través del sistema
CU21	Registrar tiempo manual	Alternativa al cronómetro

MOSCOW

Should

ID	Caso de Uso	Justificación breve
CU02	Exportar información	Compartir fuera del sistema
CU14	Modificar estado de tarea	Seguimiento de progreso
CU15	Visualizar tareas	Visualización y gestión
CU22	Ver reporte	Seguimiento y análisis
CU23	Registrar usuario al proyecto	Colaboración entre usuarios
CU11	Aprobar tarea	Validación del trabajo
CU17	Categorizar tiempo	Análisis más detallado

MOSCOW

Could

ID	Caso de Uso	Justificación breve
CU04	Modificar perfil	Personalización no crítica
CU06	Modificar proyecto	ABM secundaria
CU18	Añadir categoría	Mejora en organización
CU19	Modificar categoría	ABM no esencial

MOSCOW

Won’t

ID	Caso de Uso	Justificación breve
CU03	**Asignar rol**	**Etiqueta de usuarios dentro de cada proyecto, no prioritaria**
CU10	**Proponer tarea**	**Mejora sugerida**
CU16	**Comentar tarea**	**Comunicación extra**

CASOS DE USO: ESTIMACIÓN

ID	Caso de Uso	Número de transacciones	Complejidad	Peso
CU##	Gestionar tareas	10	Complejo	15
CU20	Registrar tiempo por cronómetro	4	Intermedio	10

CASOS DE USO: PLAN DE PRUEBAS

ESENCIALES

01: Iniciar Sesión

05: Crear Proyecto

09: Crear Tarea

14: Modificar Estado de Tarea

15: Ver Tareas

20: Registrar Tiempo por Cronómetro

21: Registrar Tiempo Manual

12: Estimar tarea

ESPERADOS

02: Exportar Información

07: Crear Etapa

11: Aprobar Tarea

22: Ver Reporte

17: Categorizar Tiempo

23: Registrar Usuario al Proyecto.

DESEADOS

10: Sugerir Tarea

08:Crear Iteración.

CASOS DE USO PRIORIZADOS

CU ## Gestionar tareas

- CU09: Crear tarea.
- CU12: Estimar tarea



CU20: Registrar tiempo por cronómetro



NEXTECH

MUCHAS GRACIAS

Equipo NexTech
