KAIROS



HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN, REGISTRO DE TIEMPOS Y VISUALIZACIÓN DEL TRABAJO

CENTURIÓN VALERIA , **ESCALANTE** GUILLERMO,
MALDONADO AGUSTINA, **MENDEZ** FLORENCIA, **ULLOA** GONZALO

NEXTECH

ÍNDICE



1 REGISTRO DE TIEMPOS / COMMITS

2 ESTIMACIÓN

3 SEGUIMIENTO DE RIESGOS

4 RESUMEN DE CASOS DE USO

5 RESUMEN DE CASOS DE PRUEBA

6 MÉTRICAS

7 CASOS DE USO A IMPLEMENTAR

8 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DATOS


NEXTECH

TIEMPOS

NEXTECH

ESFUERZO SEMANAL POR CATEGORÍA

TOTAL GENERAL: 326.19 HORAS

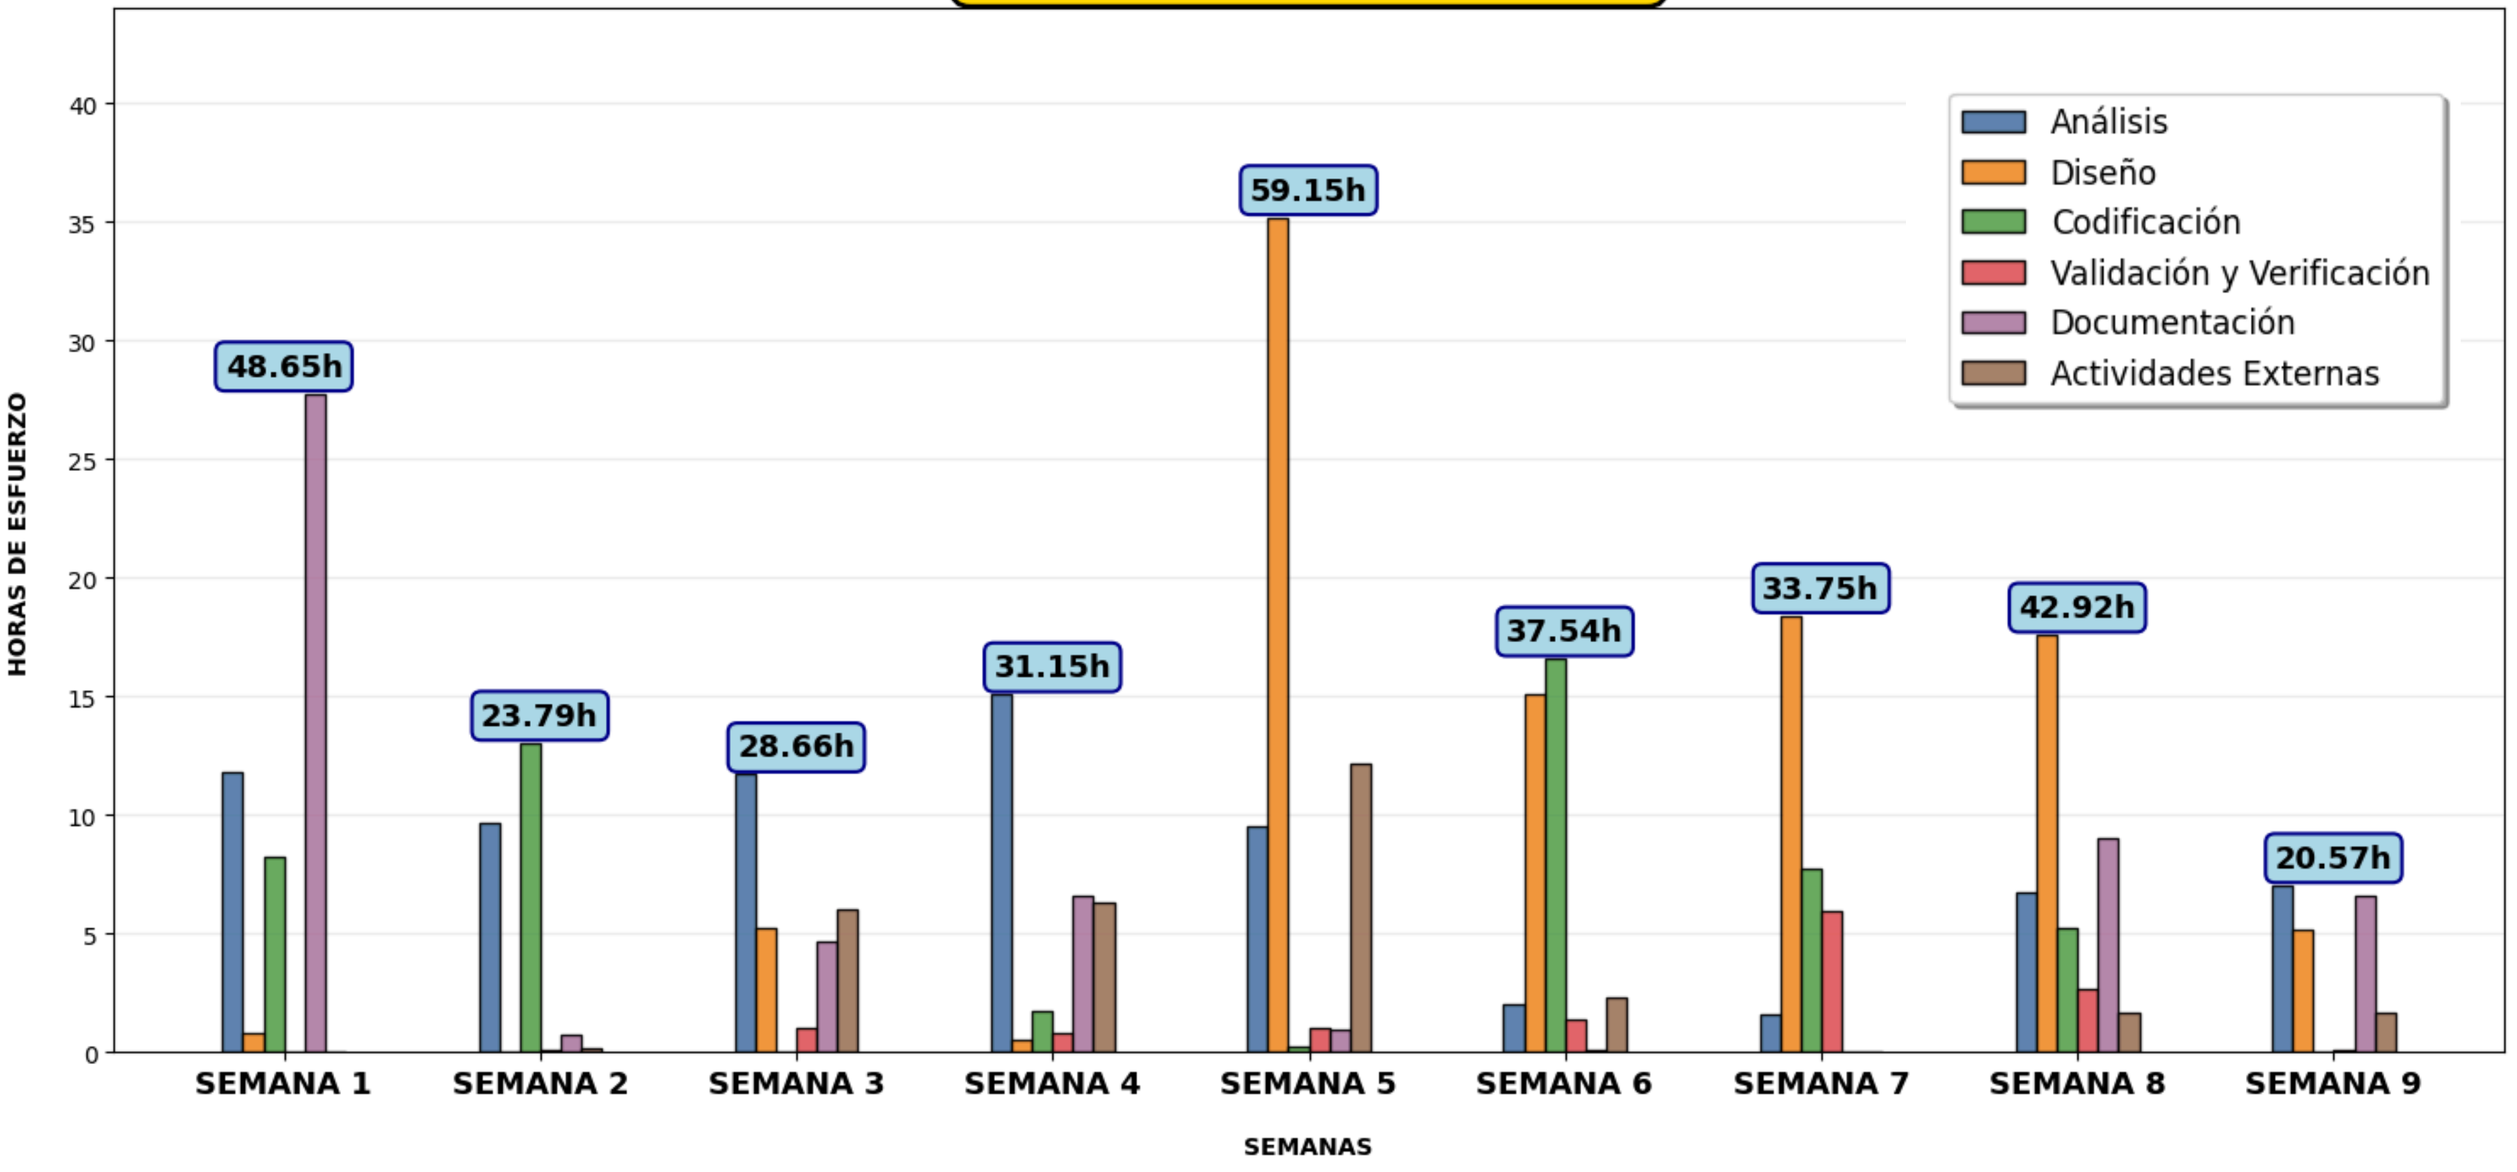




COMMITS

NEXTECH


Cantidad de Commits

Total: 86

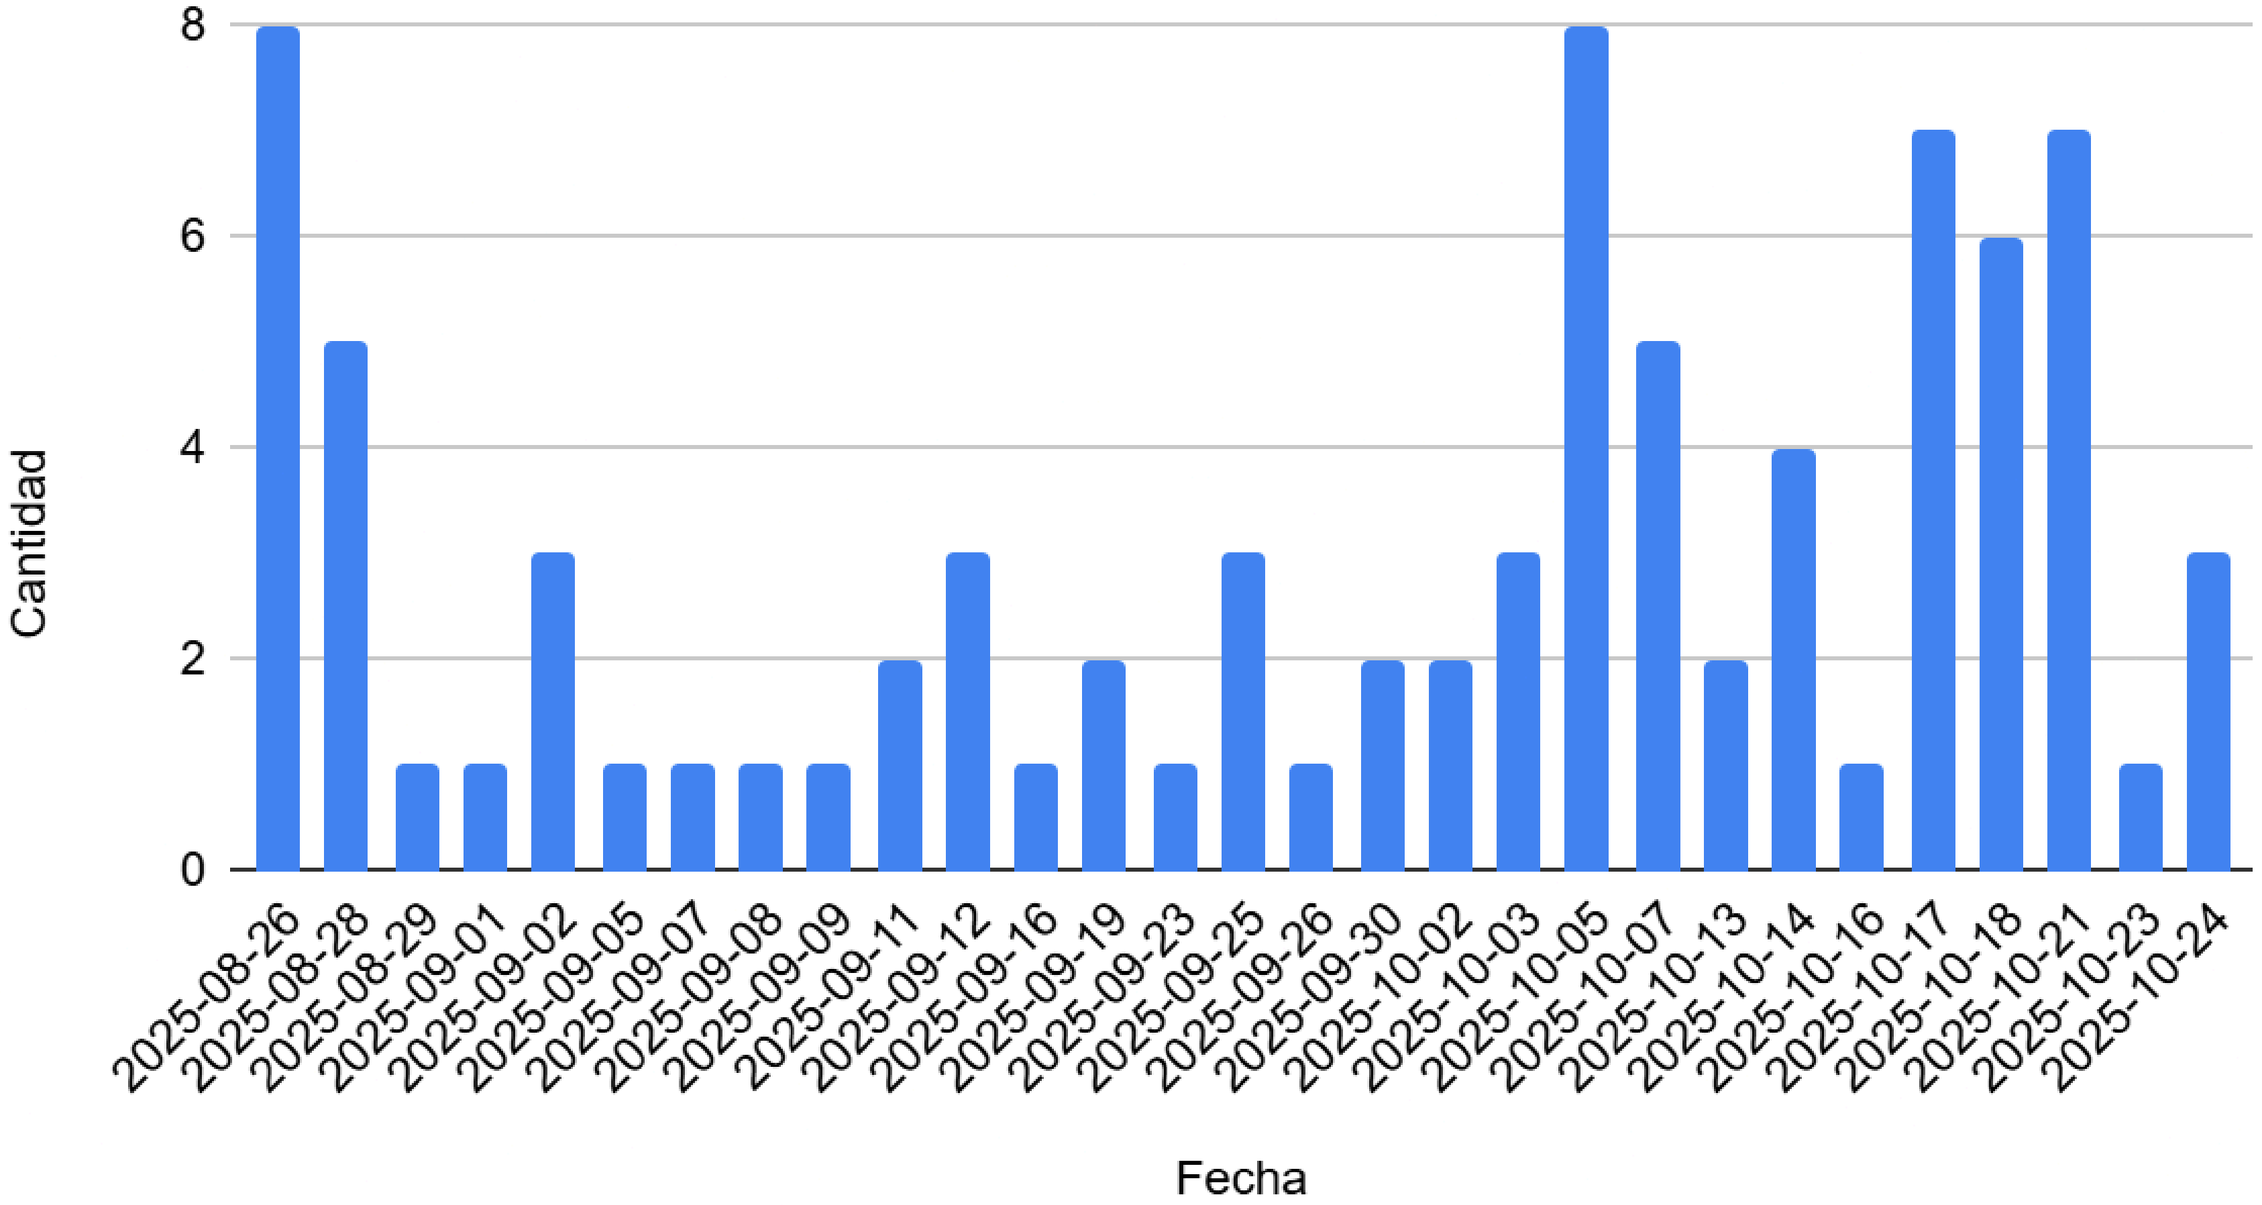

ESTIMACIÓN

NEXTECH

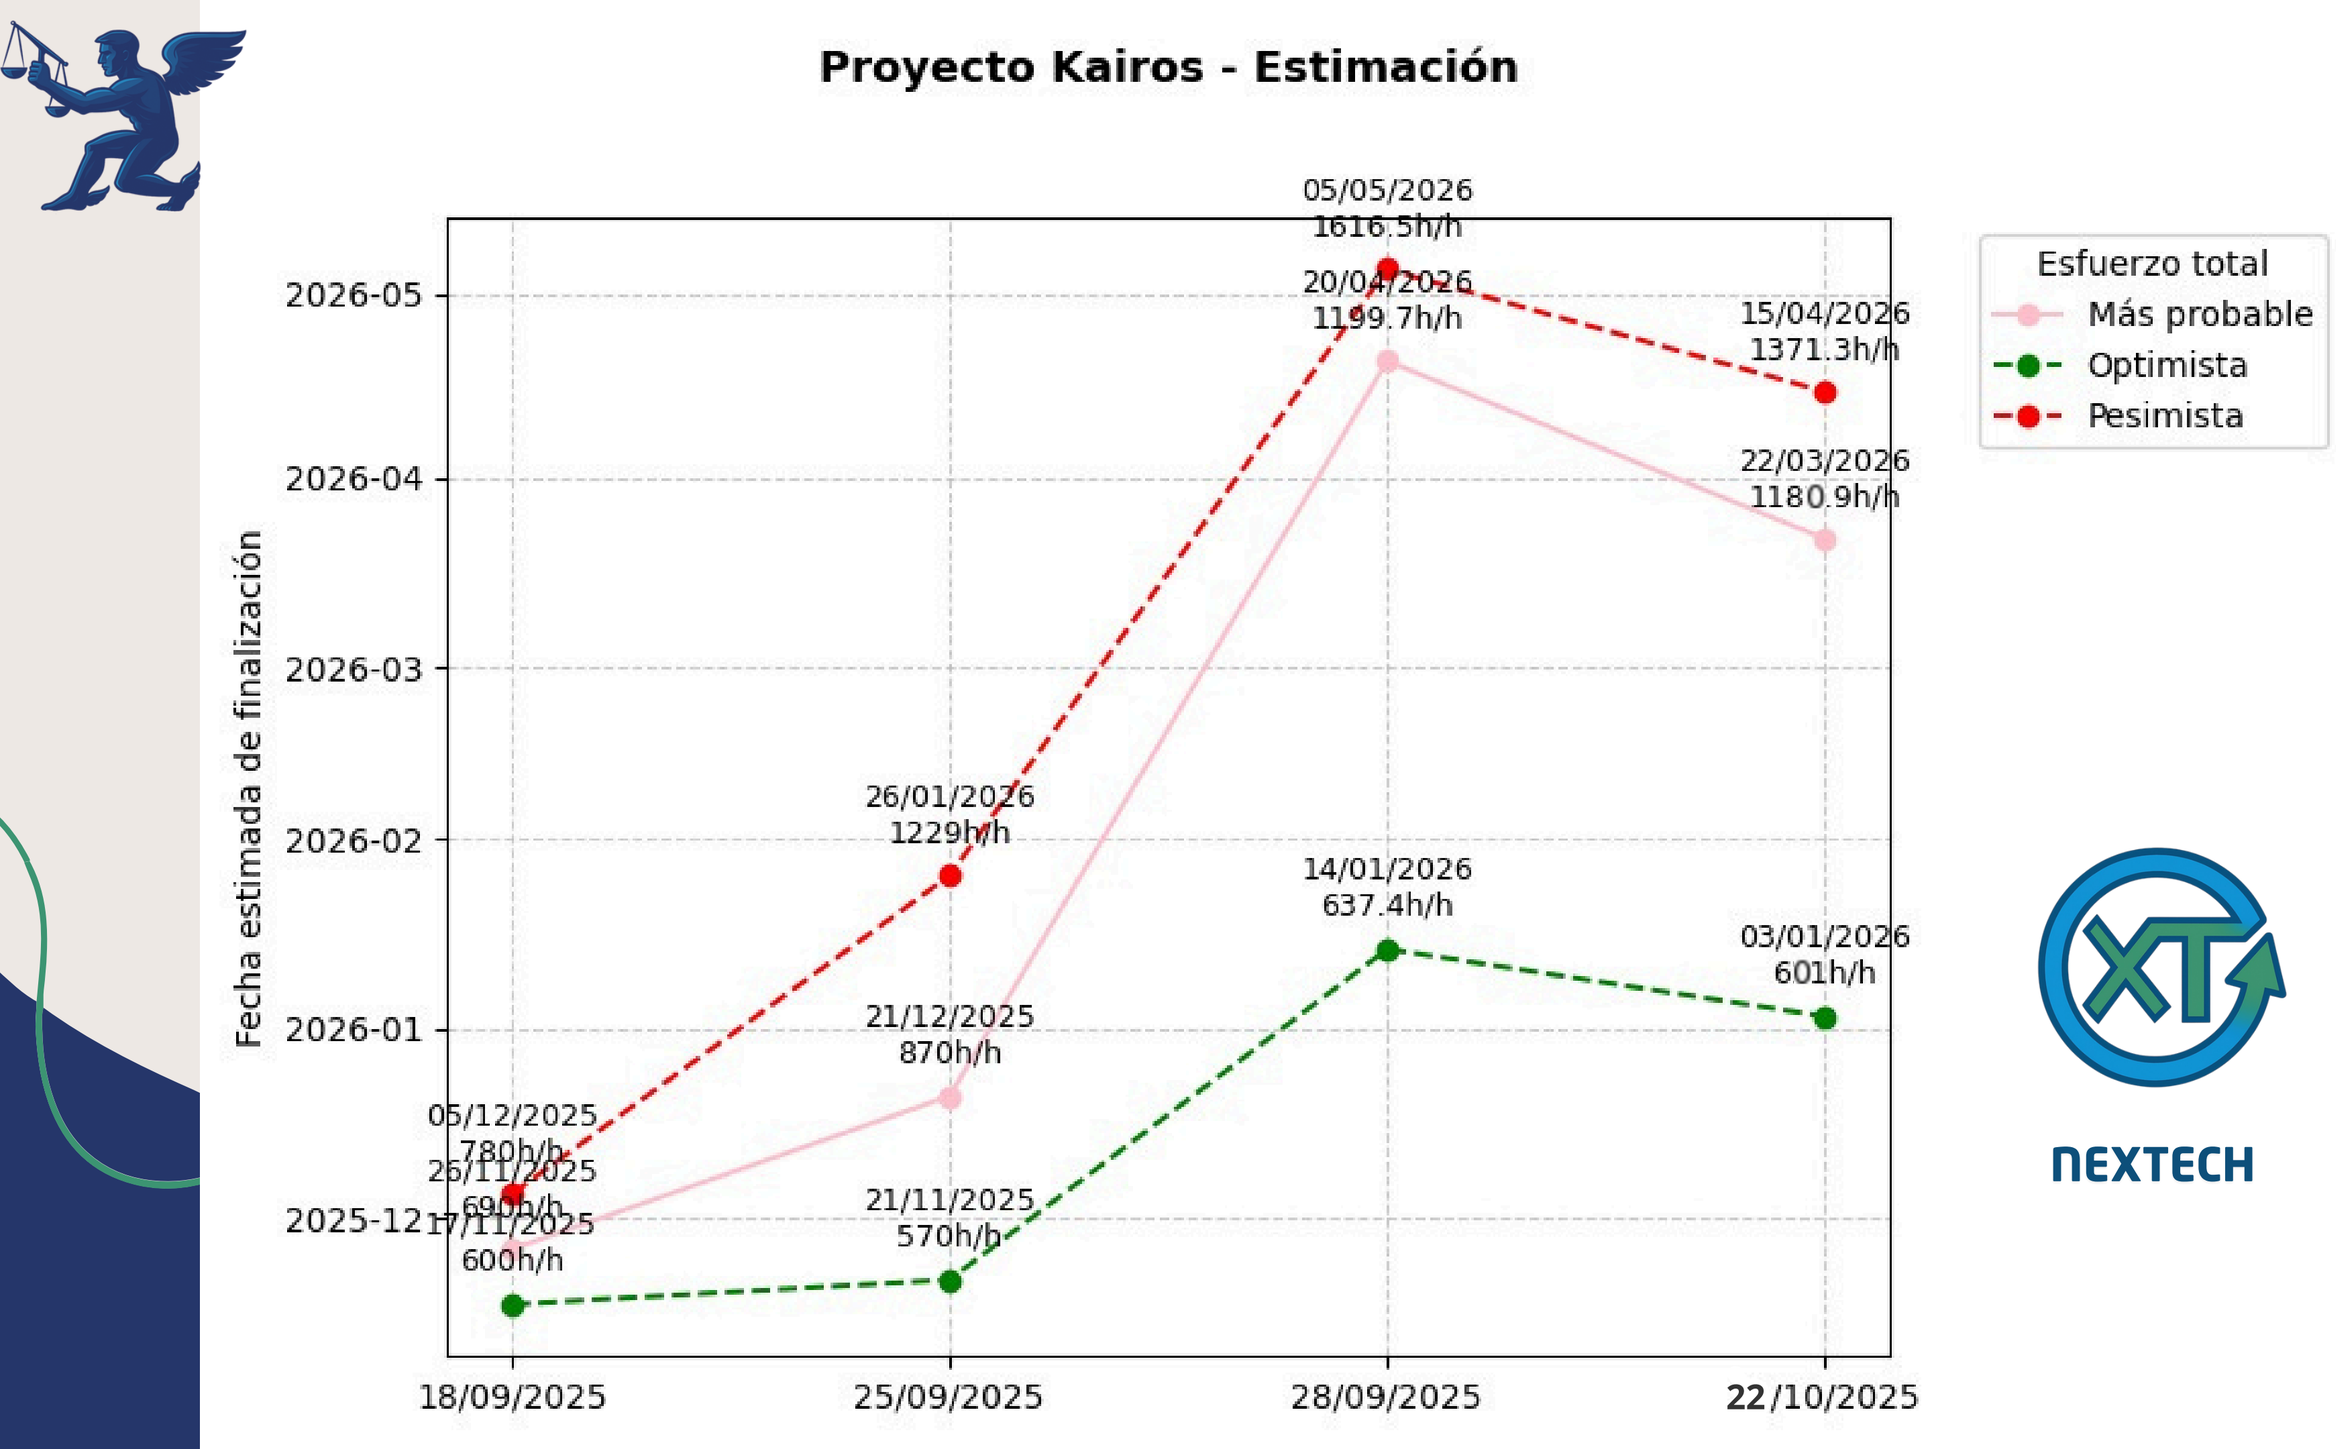
Proyecto Kairos - Estimación
Fecha estimada de finalización
2026-05
2026-04
2026-03
2026-02
2026-01
2025-12
18/09/2025
25/09/2025
28/09/2025
22/10/2025
Esfuerzo total
Más probable
Optimista
Pesimista
05/05/2026
1616.5h/h
20/04/2026
1199.7h/h
15/04/2026
1371.3h/h
22/03/2026
1180.9h/h
26/01/2026
1229h/h
14/01/2026
637.4h/h
03/01/2026
601h/h
21/12/2025
870h/h
05/12/2025
780h/h
26/11/2025
690h/h
17/11/2025
600h/h
21/11/2025
570h/h

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

NEXTECH



ESTADO ACTUAL- RIESGOS

Estado	Cantidad de riesgos
♥ **No requieren acción**	8
🔵 **Reevaluar próxima iteración**	5
🟢 **Planificados / controlados**	3
Total	**16**

NEXTECH

RIESGOS

RK18 - Dada/s la contribución del equipo a la única rama de desarrollo principal (Dev) y la falta de aislamiento de tareas, podría ocurrir la generación constante y frecuente de conflictos de fusión (merge conflicts) y la sobrescritura no intencionada de código, lo que conduciría a retrasos significativos en la integración y el despliegue.

Plan de Contingencia				
	Tarea	Inicio	Fin	Responsables
✓	Resolver conflictos en Git	23/10/2025	24/10/2025	Gonzalo Ulloa
✓	Reunión de investigación	23/10/2025	24/10/2025	Gonzalo Ulloa, Guillermo Escalante

NEXTECH

RIESGOS

RK18 - Dada/s la contribución del equipo a la única rama de desarrollo principal (Dev) y la falta de aislamiento de tareas, podría ocurrir la generación constante y frecuente de conflictos de fusión (merge conflicts) y la sobreescritura no intencionada de código, lo que conduciría a retrasos significativos en la integración y el despliegue.

Plan de Mitigación				
	Tarea	Inicio	Fin	Responsables
✓	Creación de ramas específicas	24/10/2025	24/10/2025	Gonzalo Ulloa, Guillermo Escalante

NEXTECH

RIESGOS

RK19 - Dada la dependencia de cálculos para los tiempos de inicio y detención podría ocurrir una pérdida o un cálculo inexacto del tiempo registrado, lo que conduciría a un seguimiento de tareas incorrecto

Plan de Mitigación				
	Tarea	Inicio	Fin	Responsables
	Almacenar datos temporalmente	24/10/2025	24/10/2025	Gonzalo Ulloa

NEXTECH

RESUMEN DE CASOS DE USO

NEXTECH

ESTADO ACTUAL DE LOS CASOS DE USO

Caso de Uso	Estado
CU01: Iniciar Sesión	Completado
CU02: Exportar informacion	No implementado
CU03: Asignar Rol	No implementado
CU04: Modificar Perfil	No implementado
CU05: Crear Proyecto	No implementado
CU06: Modificar Proyecto	No implementado
CU07: Crear Etapa	No implementado
CU08: Crear iteración	No implementado

Caso de Uso	Estado
CU09: Crear Tarea	No implementado
CU10: Proponer Tarea	No implementado
CU11: Aprobar Tarea	No implementado
CU12: Estimar Tarea	No implementado
CU13: Asignar dependencia	No implementado
CU14: Modificar estado de tarea	No implementado
CU15: Visualizar Tarea	No implementado

ESTADO ACTUAL DE LOS CASUS DE USO

CU16: Comentar Tarea	**No implementado**
CU17: Categorizar tiempo	**No implementado**
CU18: Añadir Categoría	**No implementado**
CU19: Modificar Categoría	**No implementado**
CU21: Categorizar tiempo	**No implementado**
CU20: Registrar tiempo por cronómetro	**No implementado**
CU21: Registrar tiempo manual	**No implementado**
CU22: Ver reporte	**No implementado**
CU23: Registrar usuario al proyecto	**No implementado**


ESTADO ACTUAL DE LOS CASOS DE PRUEBA

Caso de Uso	Tipo de Prueba	Casos Ejecutados
CU01: Iniciar Sesión	**Valores límite**	**4**
Totales	**—**	**4**


MÉTRICAS

NEXTECH


DOCUMENTOS SIN NECESIDAD DE AJUSTE

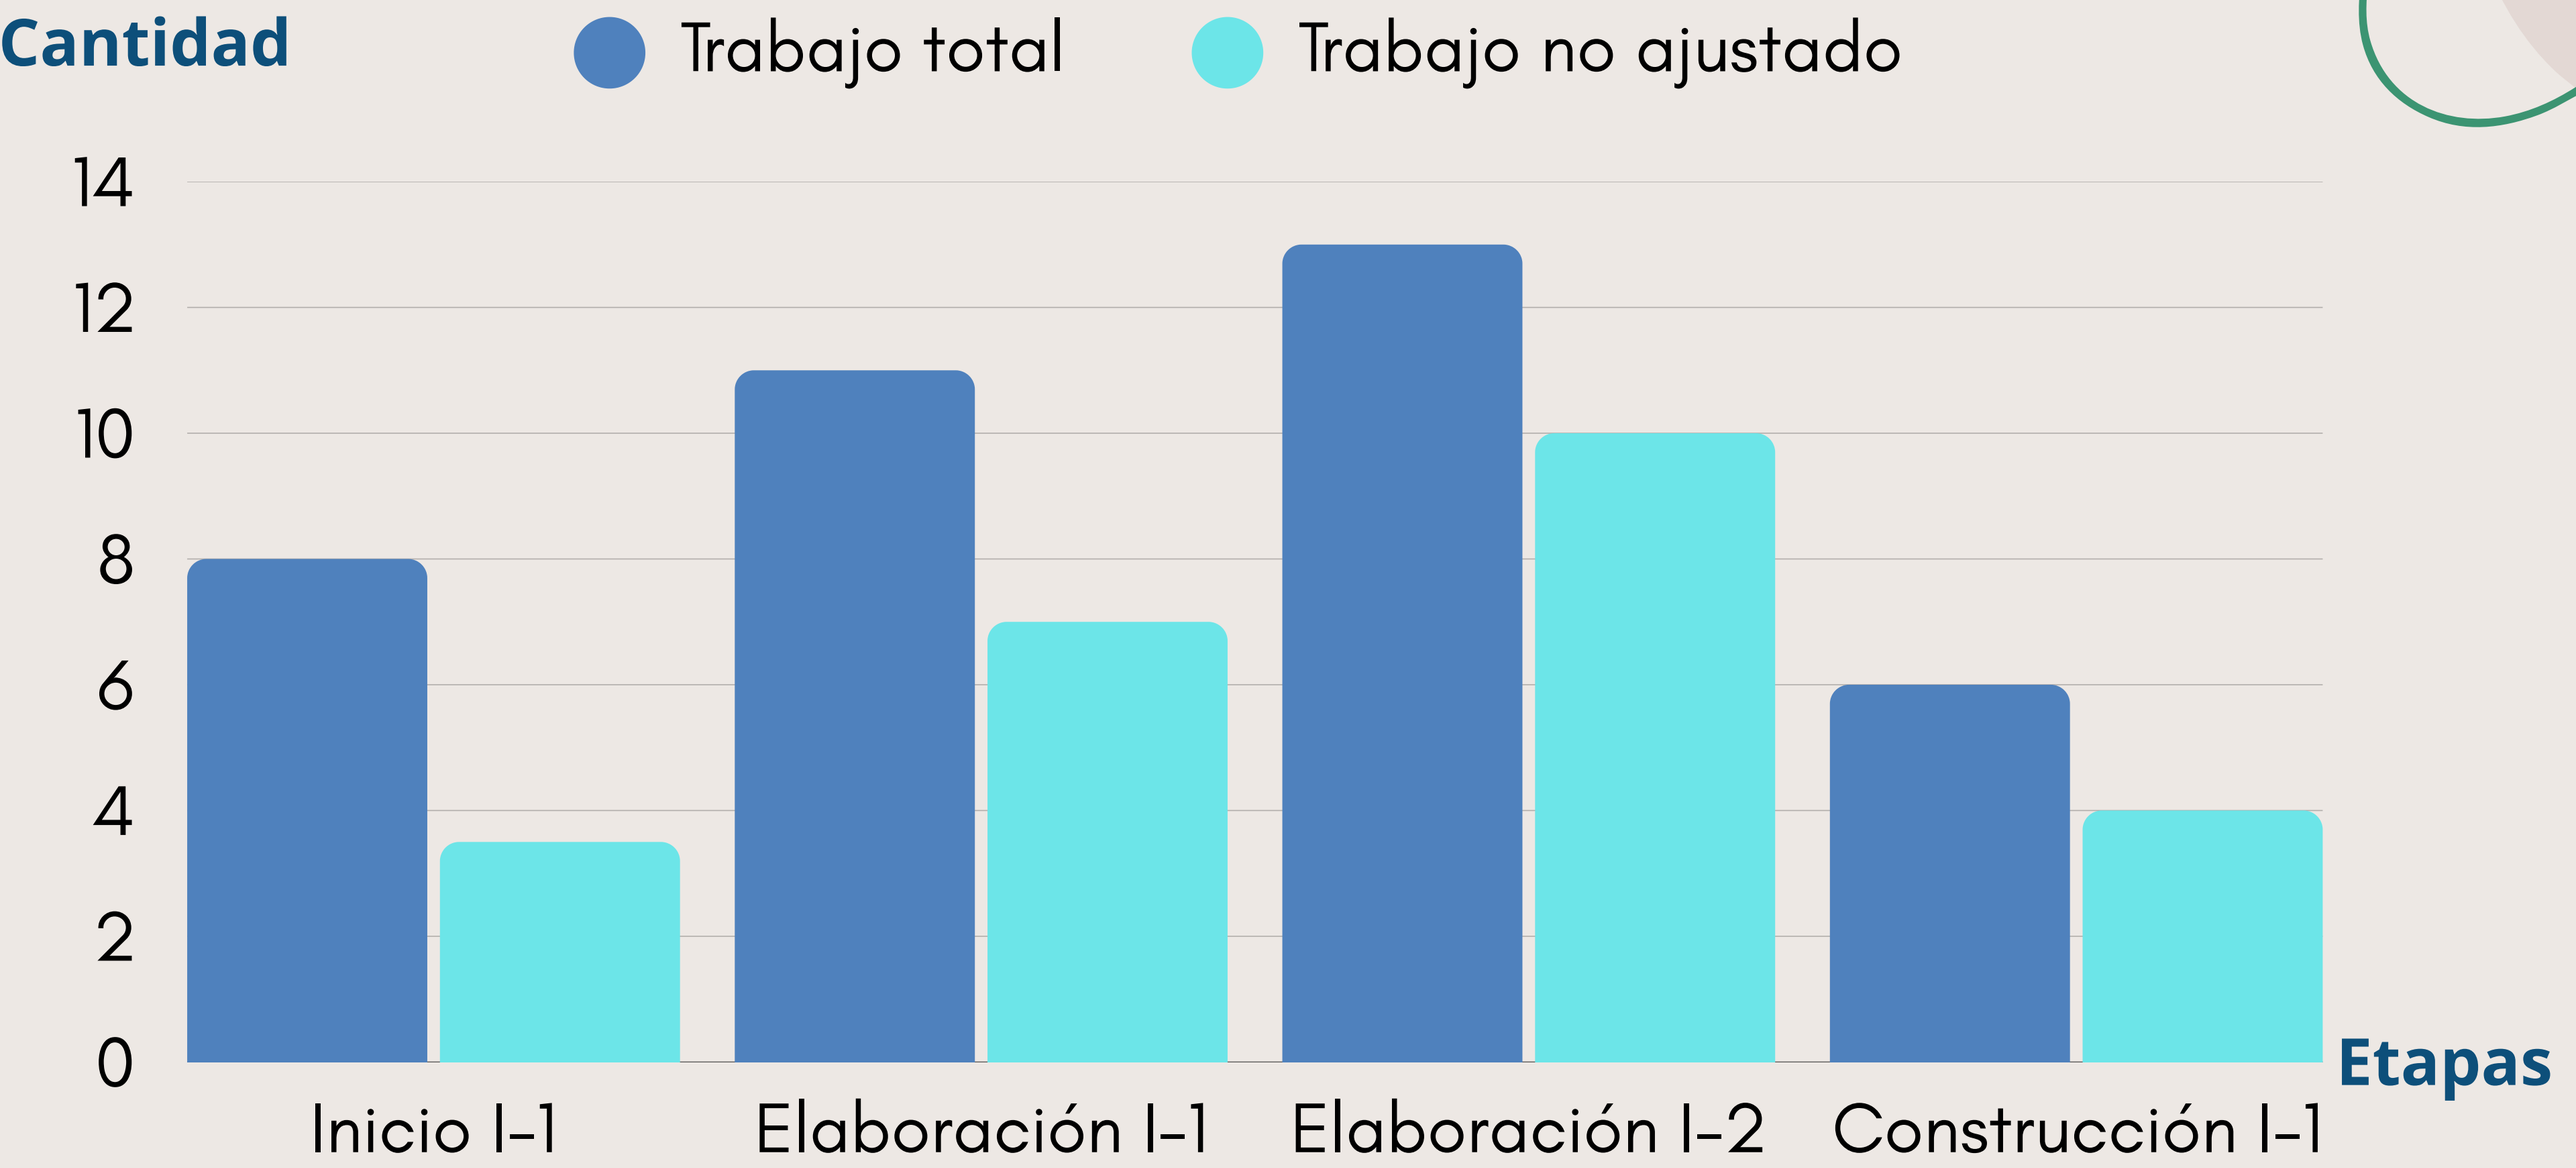


REUNIONES

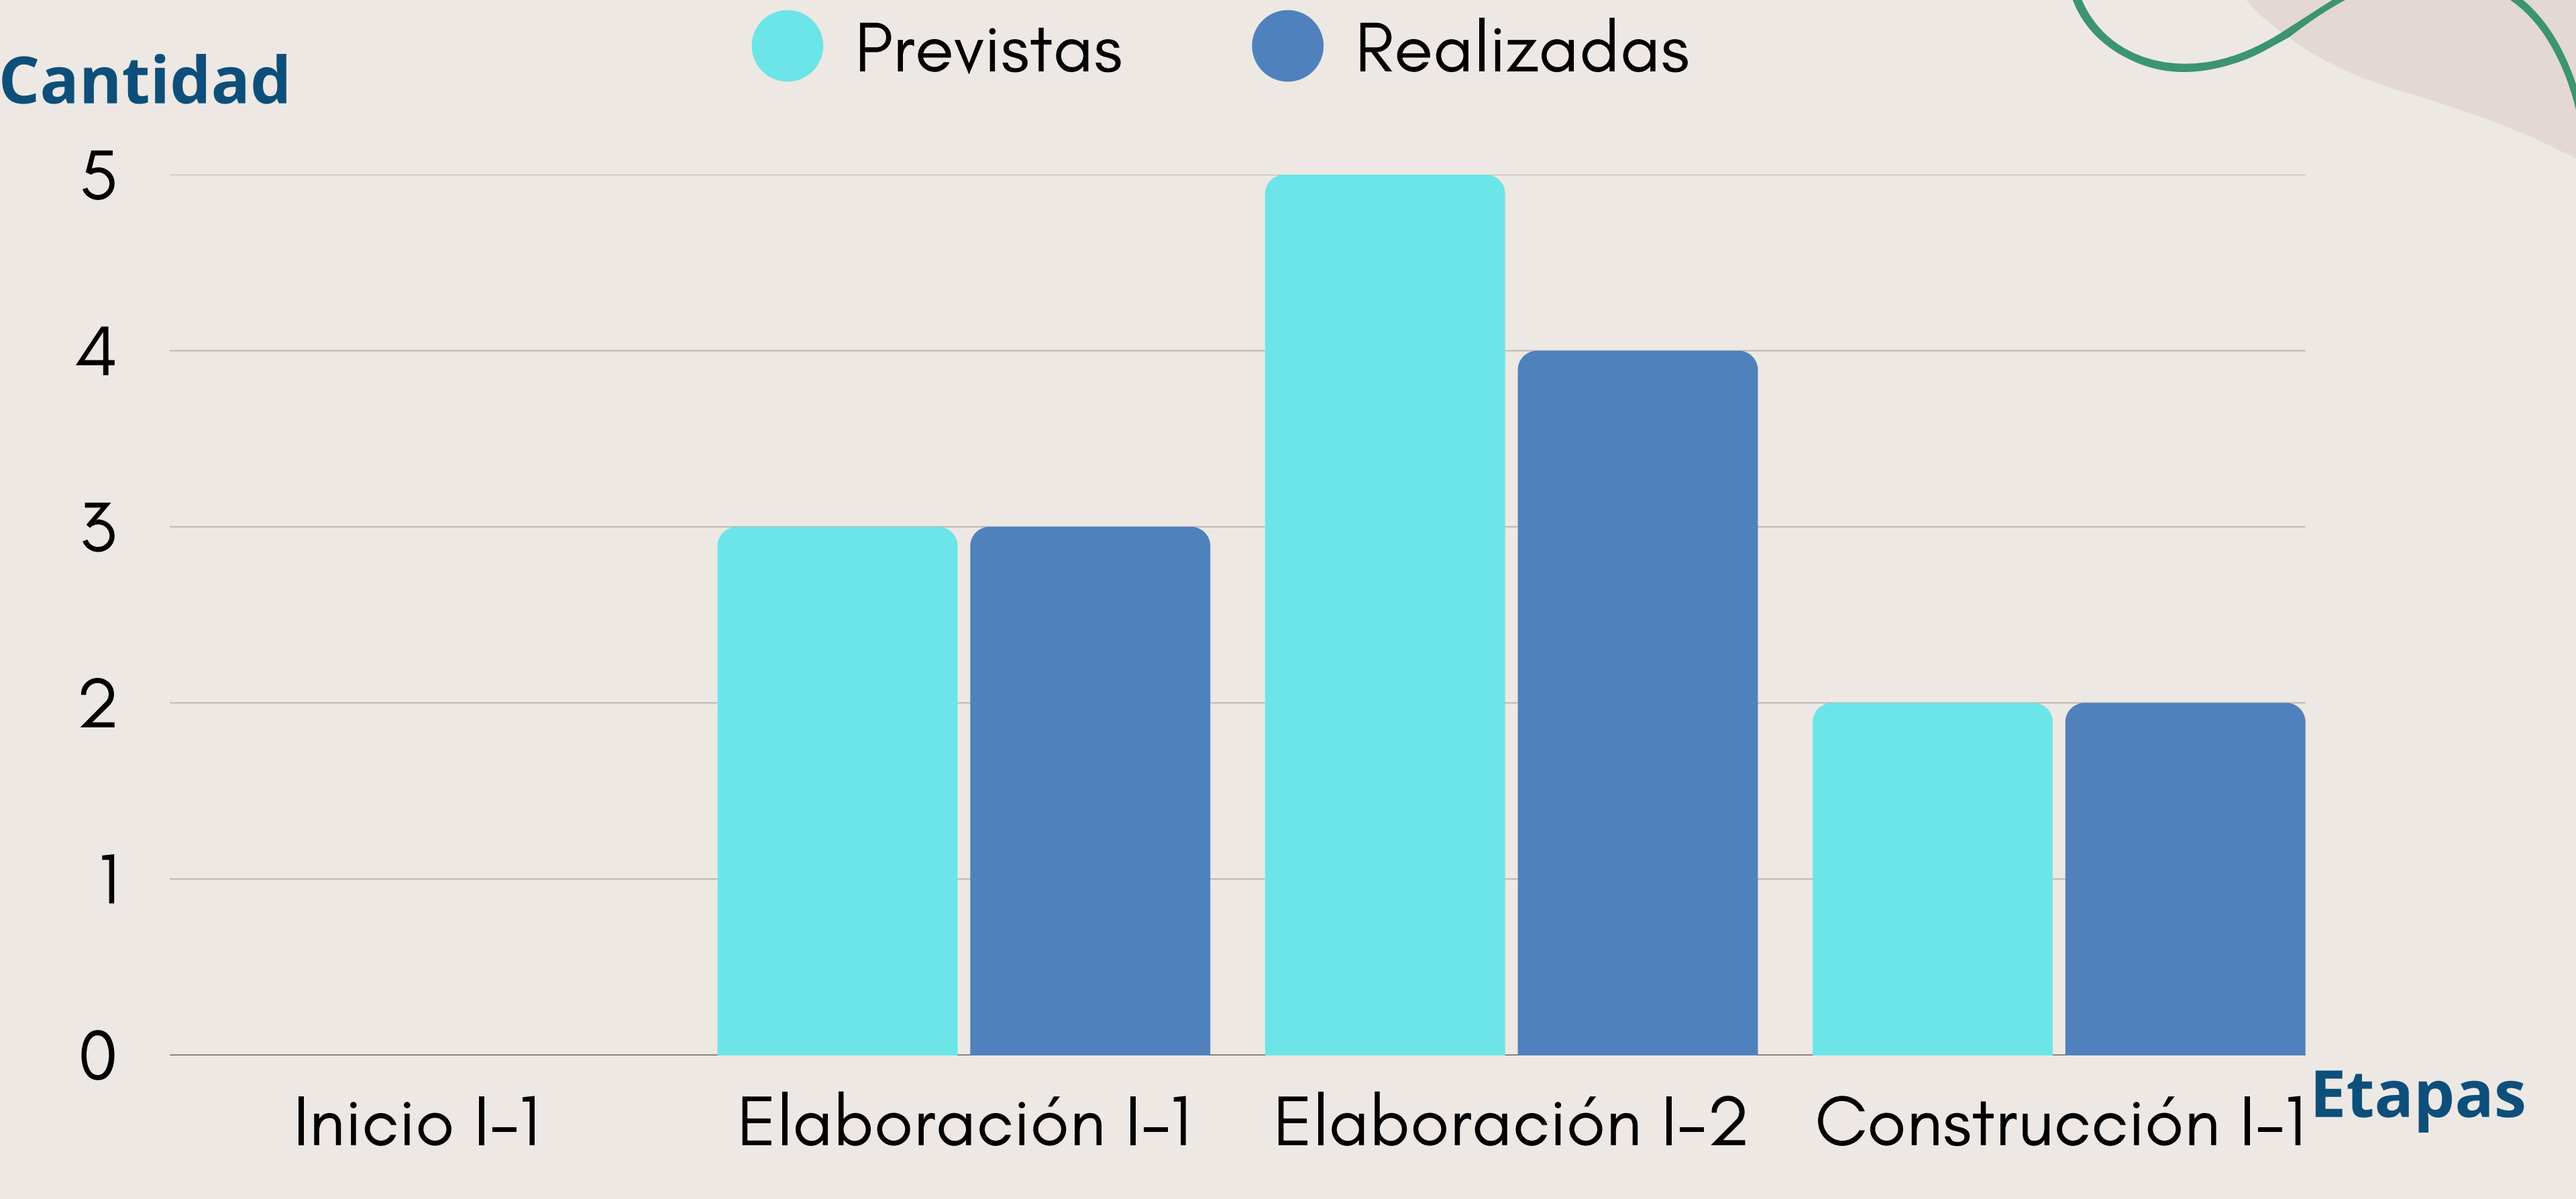
Previstas
Realizadas
Cantidad
5
4
3
2
1
0
Inicio I-1
Elaboración I-1
Elaboración I-2
Construcción I-1
Etapas


RTF POR ITERACIÓN

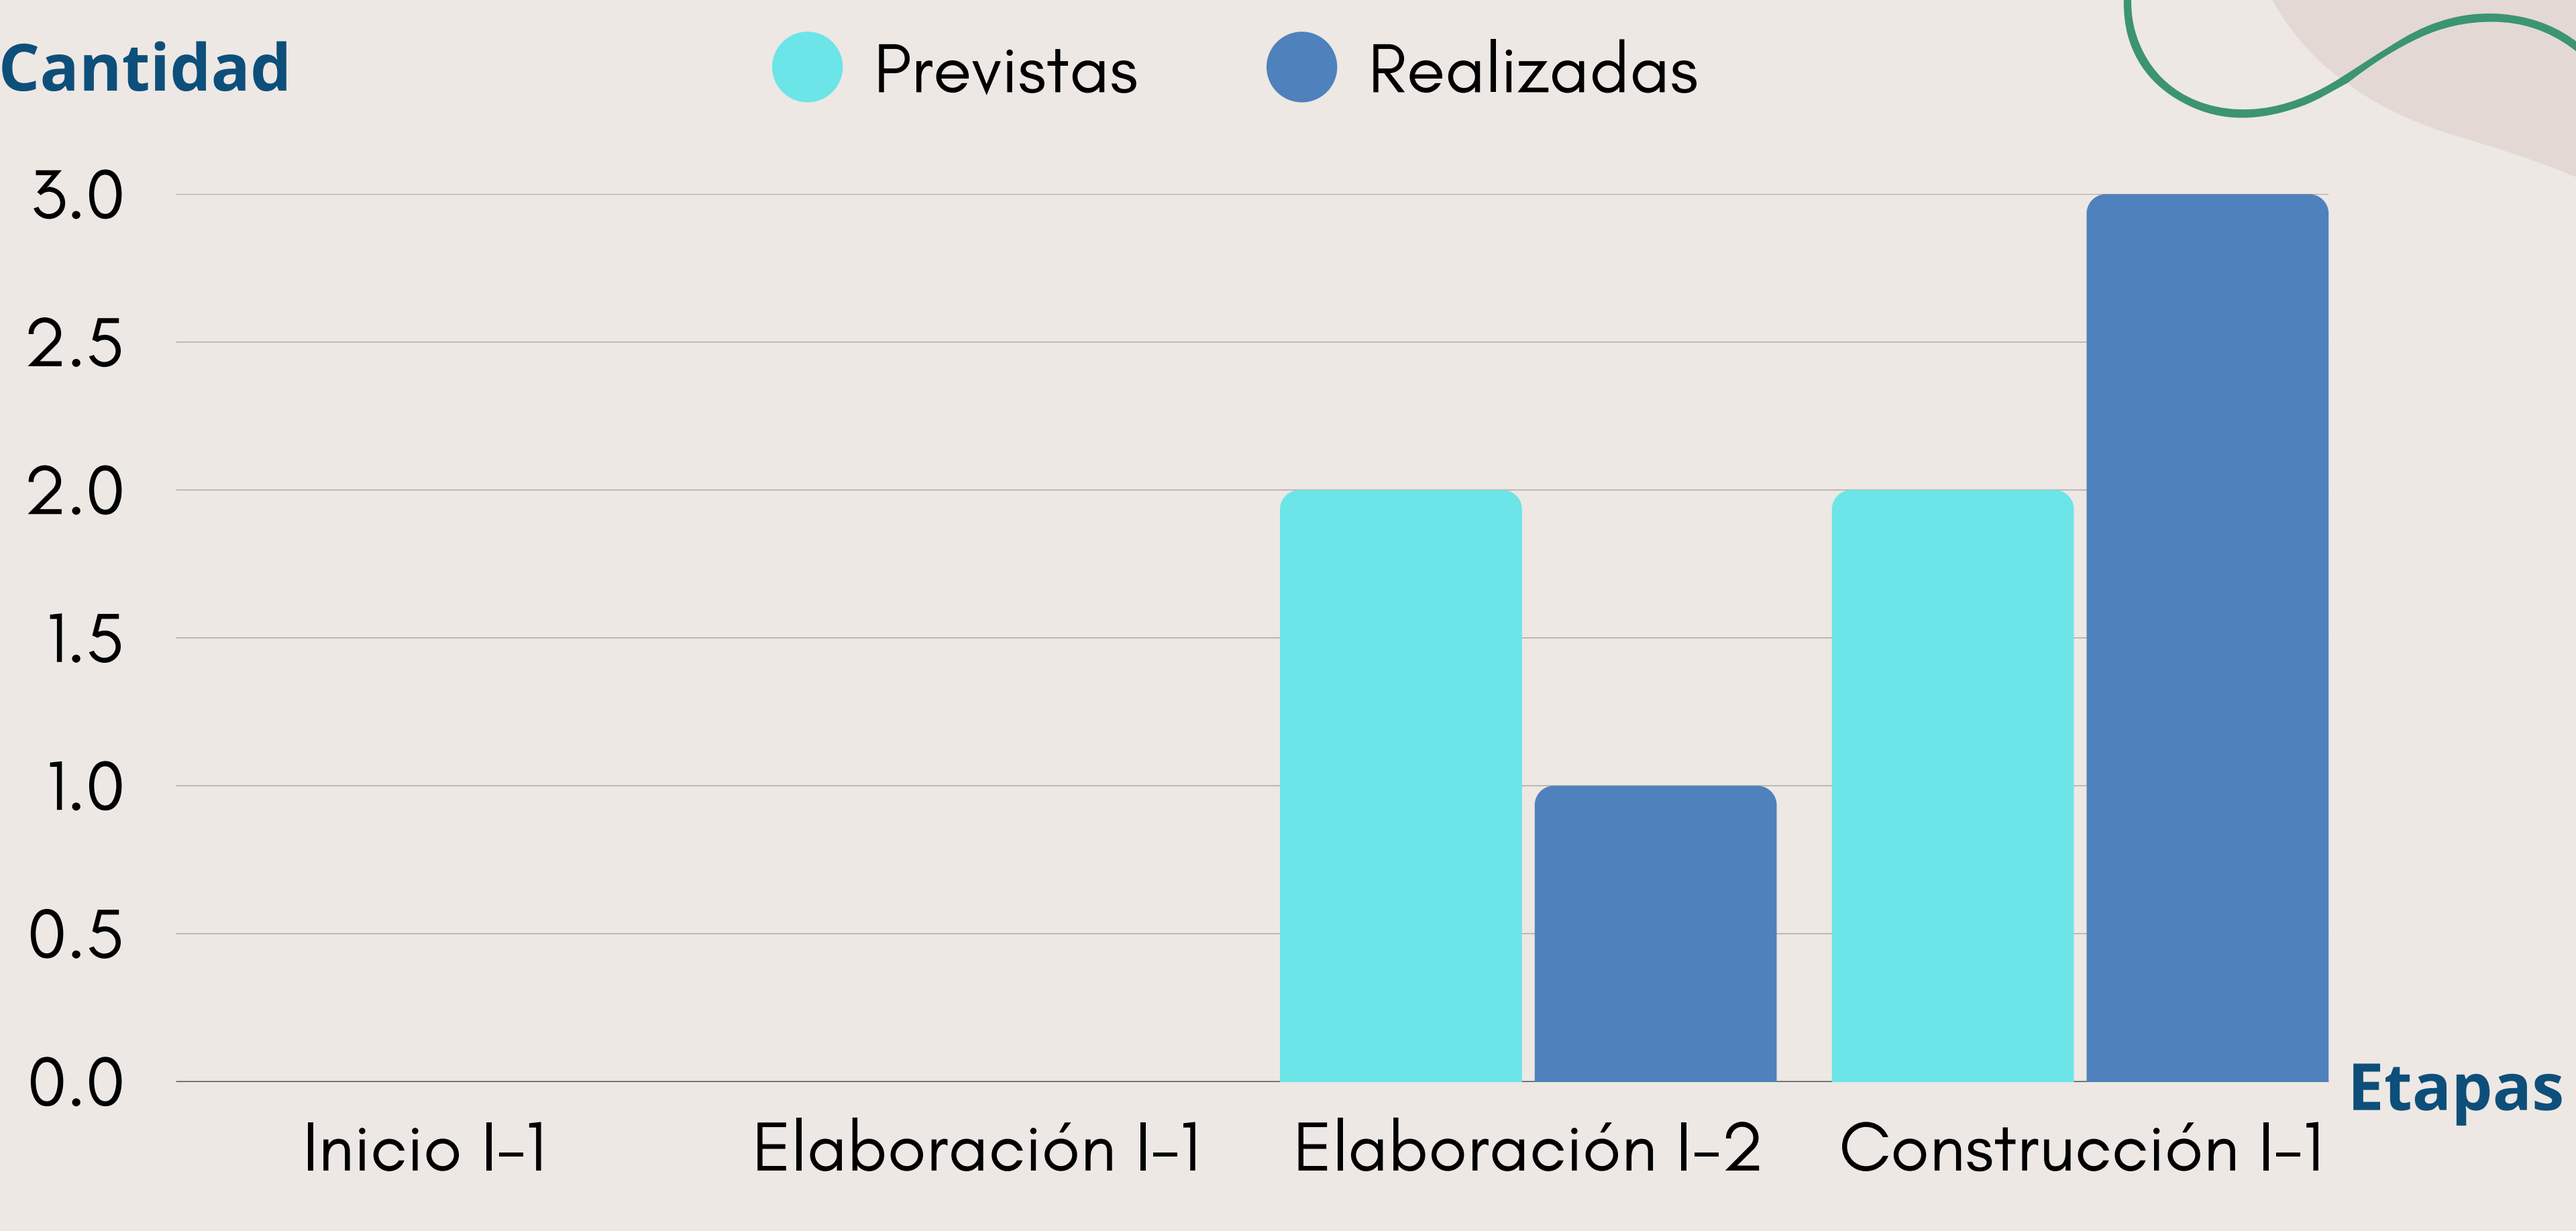

REVISIÓN DE DOCUMENTOS

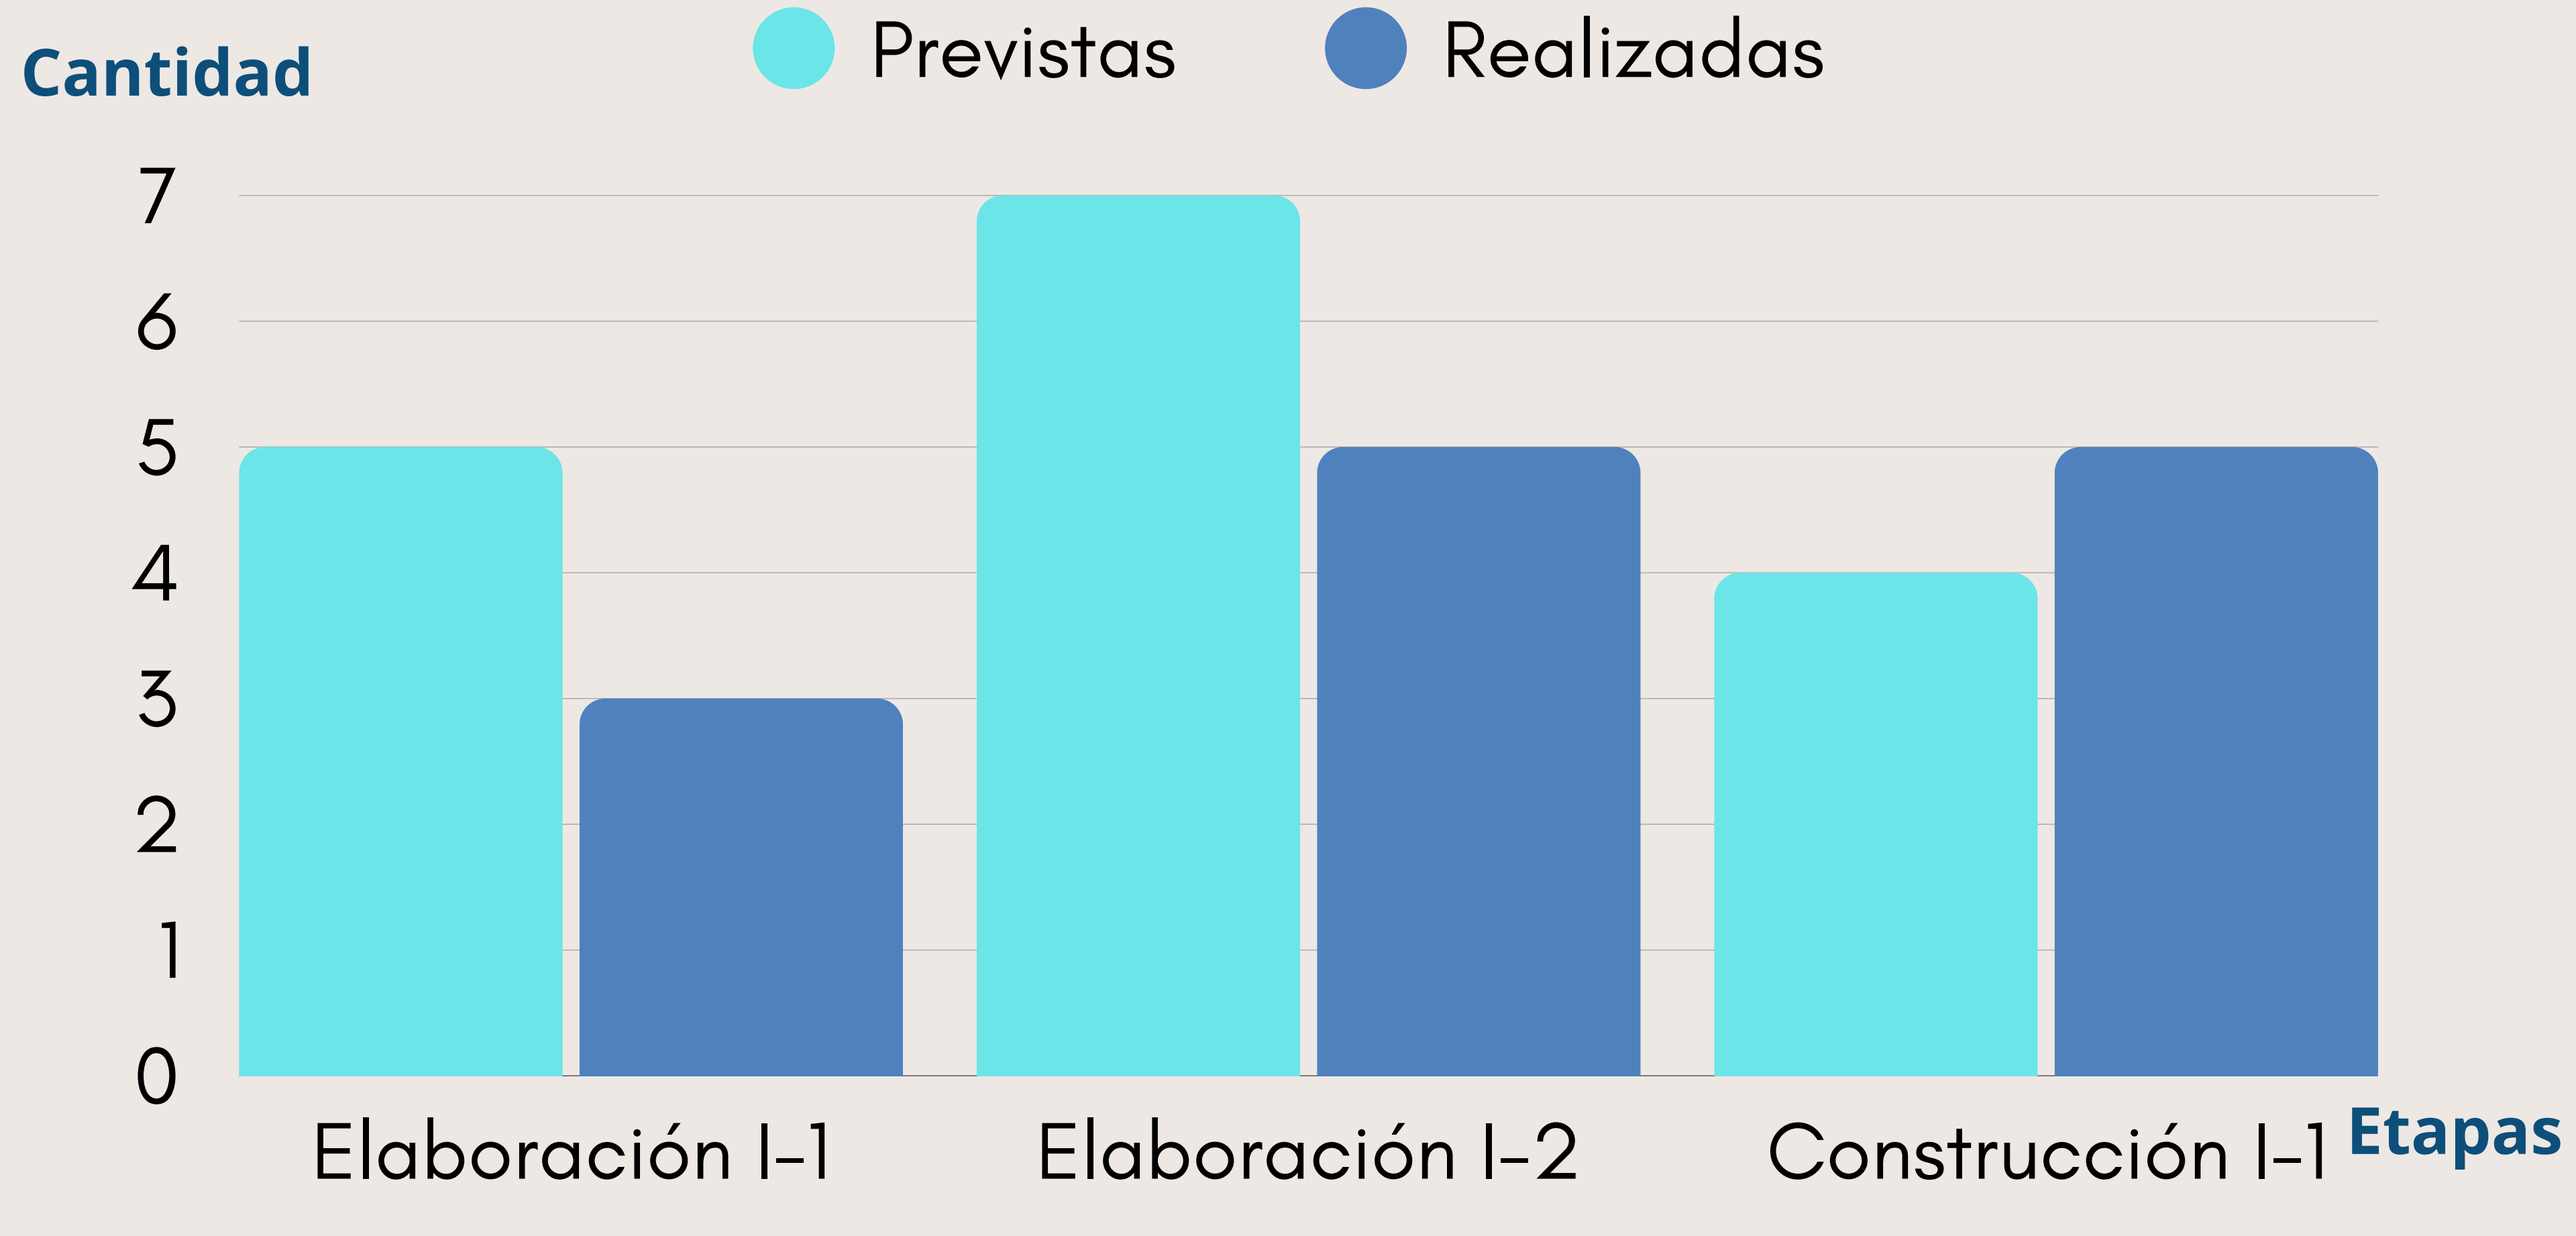


MÉTRICAS DE CALIDAD
PLANIFICADO (100%) VS EJECUTADO

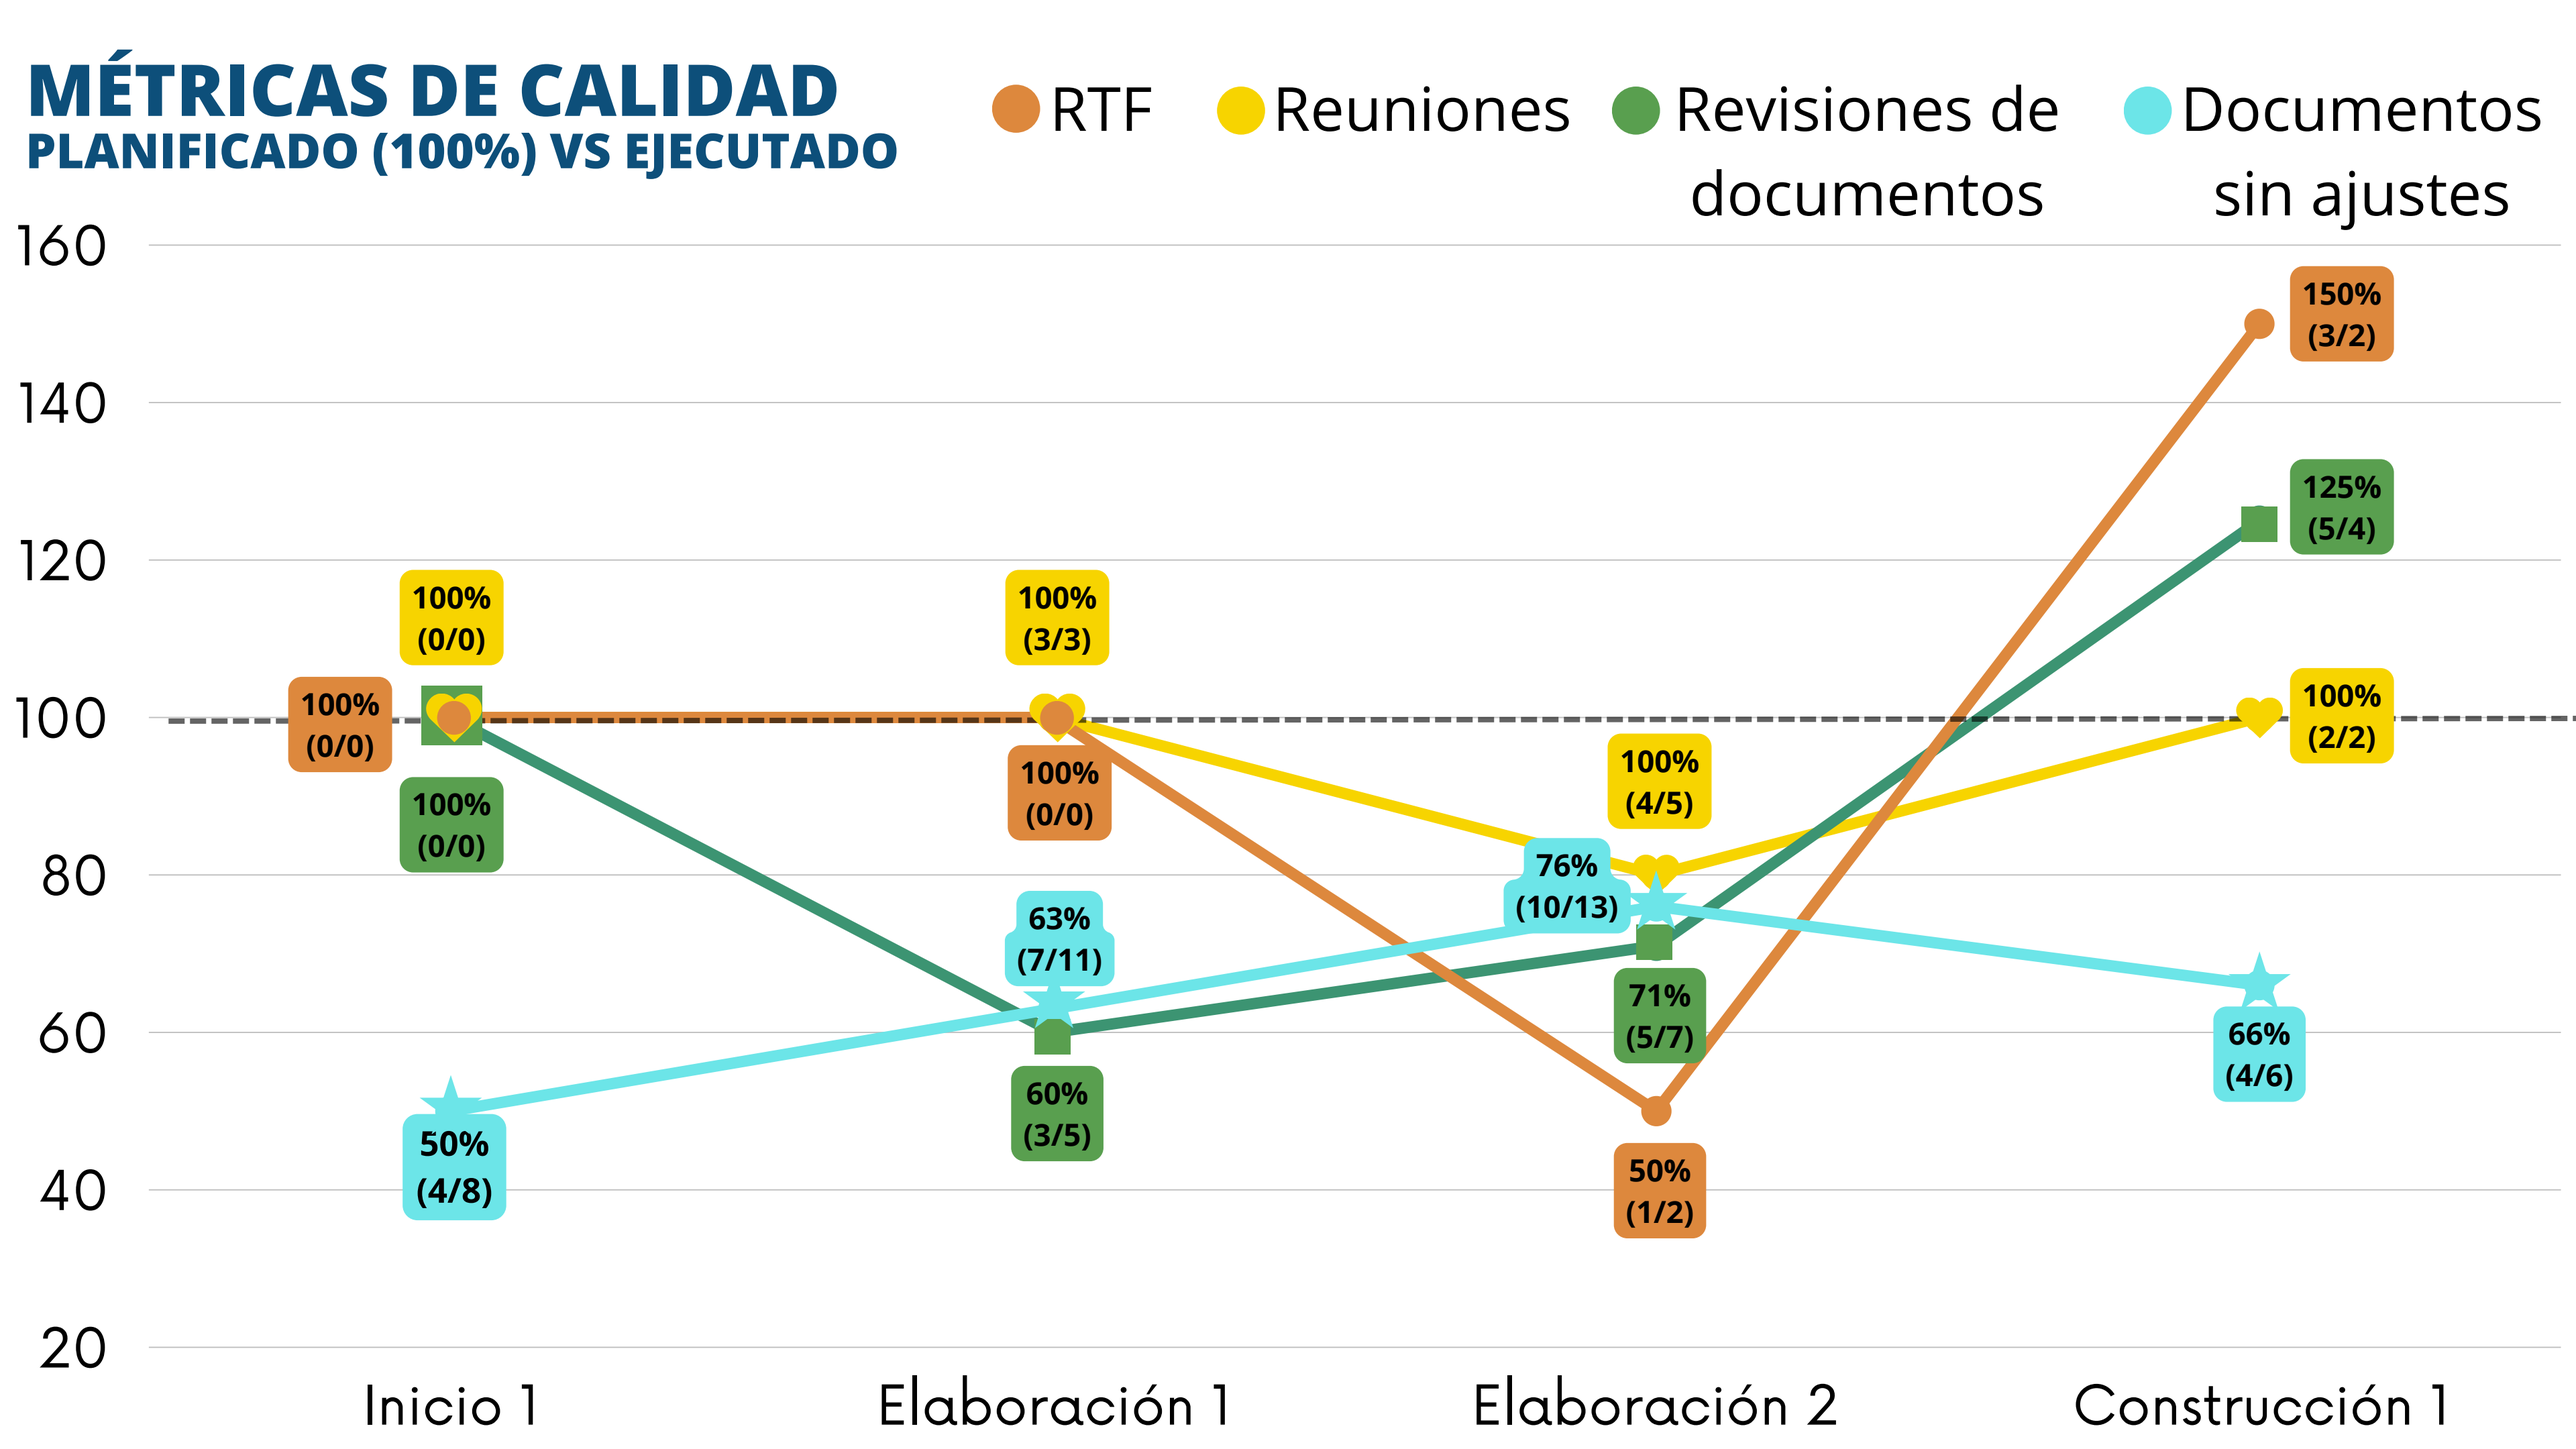


CASOS DE USO A IMPLEMENTAR

NEXTECH


CU 09: CREAR TAREA
FLUJO PRINCIPAL

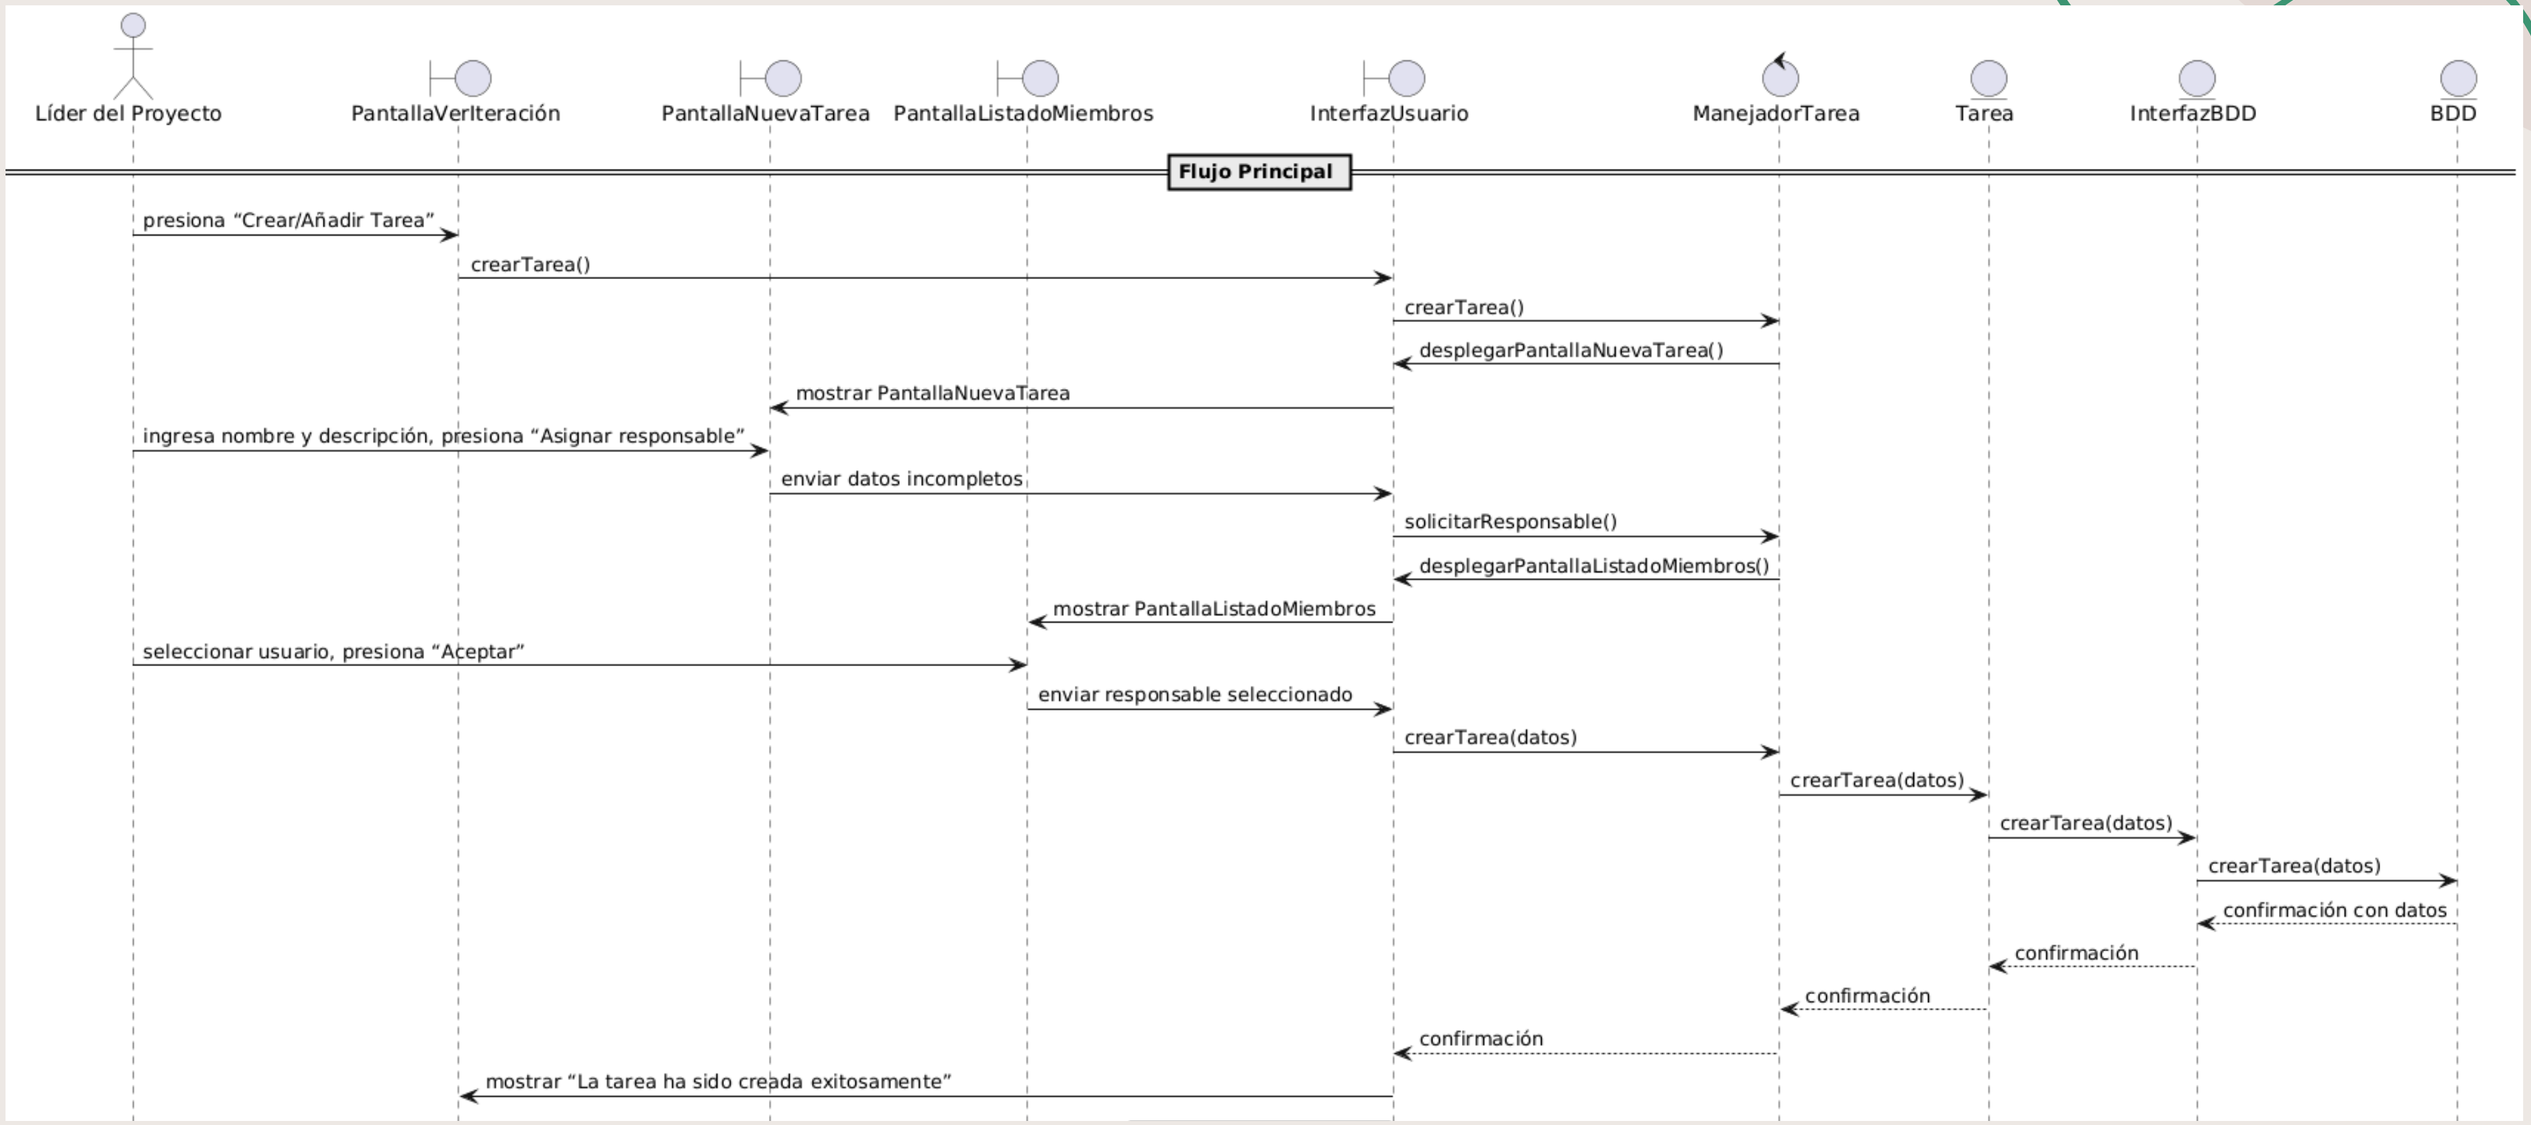

CU 09: CREAR TAREA
FLUJOS ALTERNATIVOS

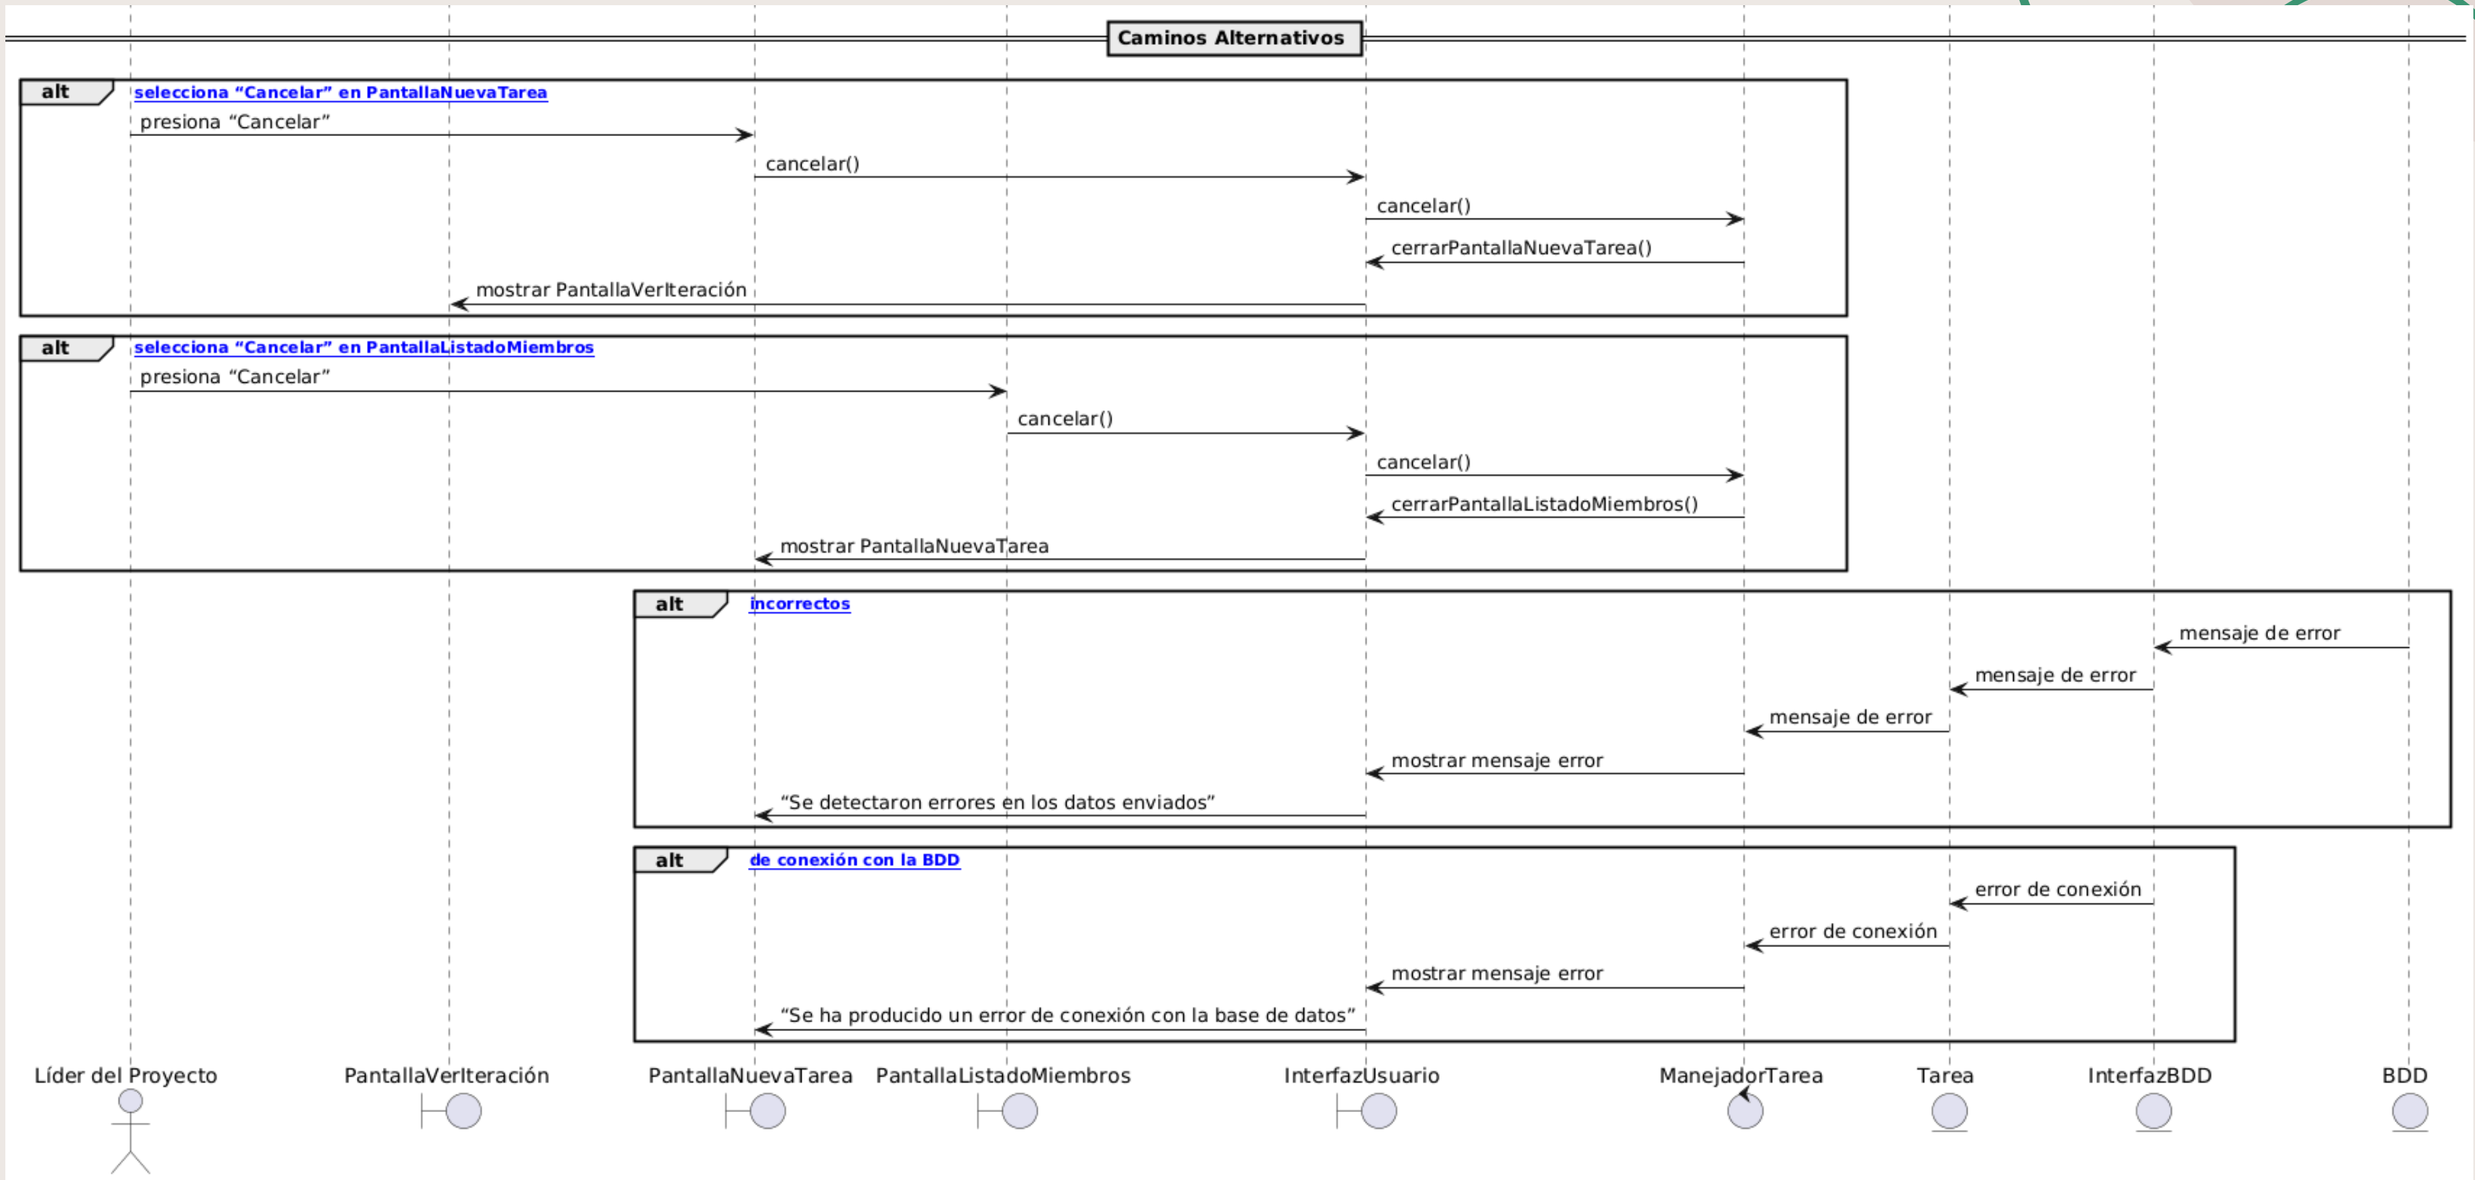


CU 12: ESTIMAR TAREA
FLUJO PRINCIPAL

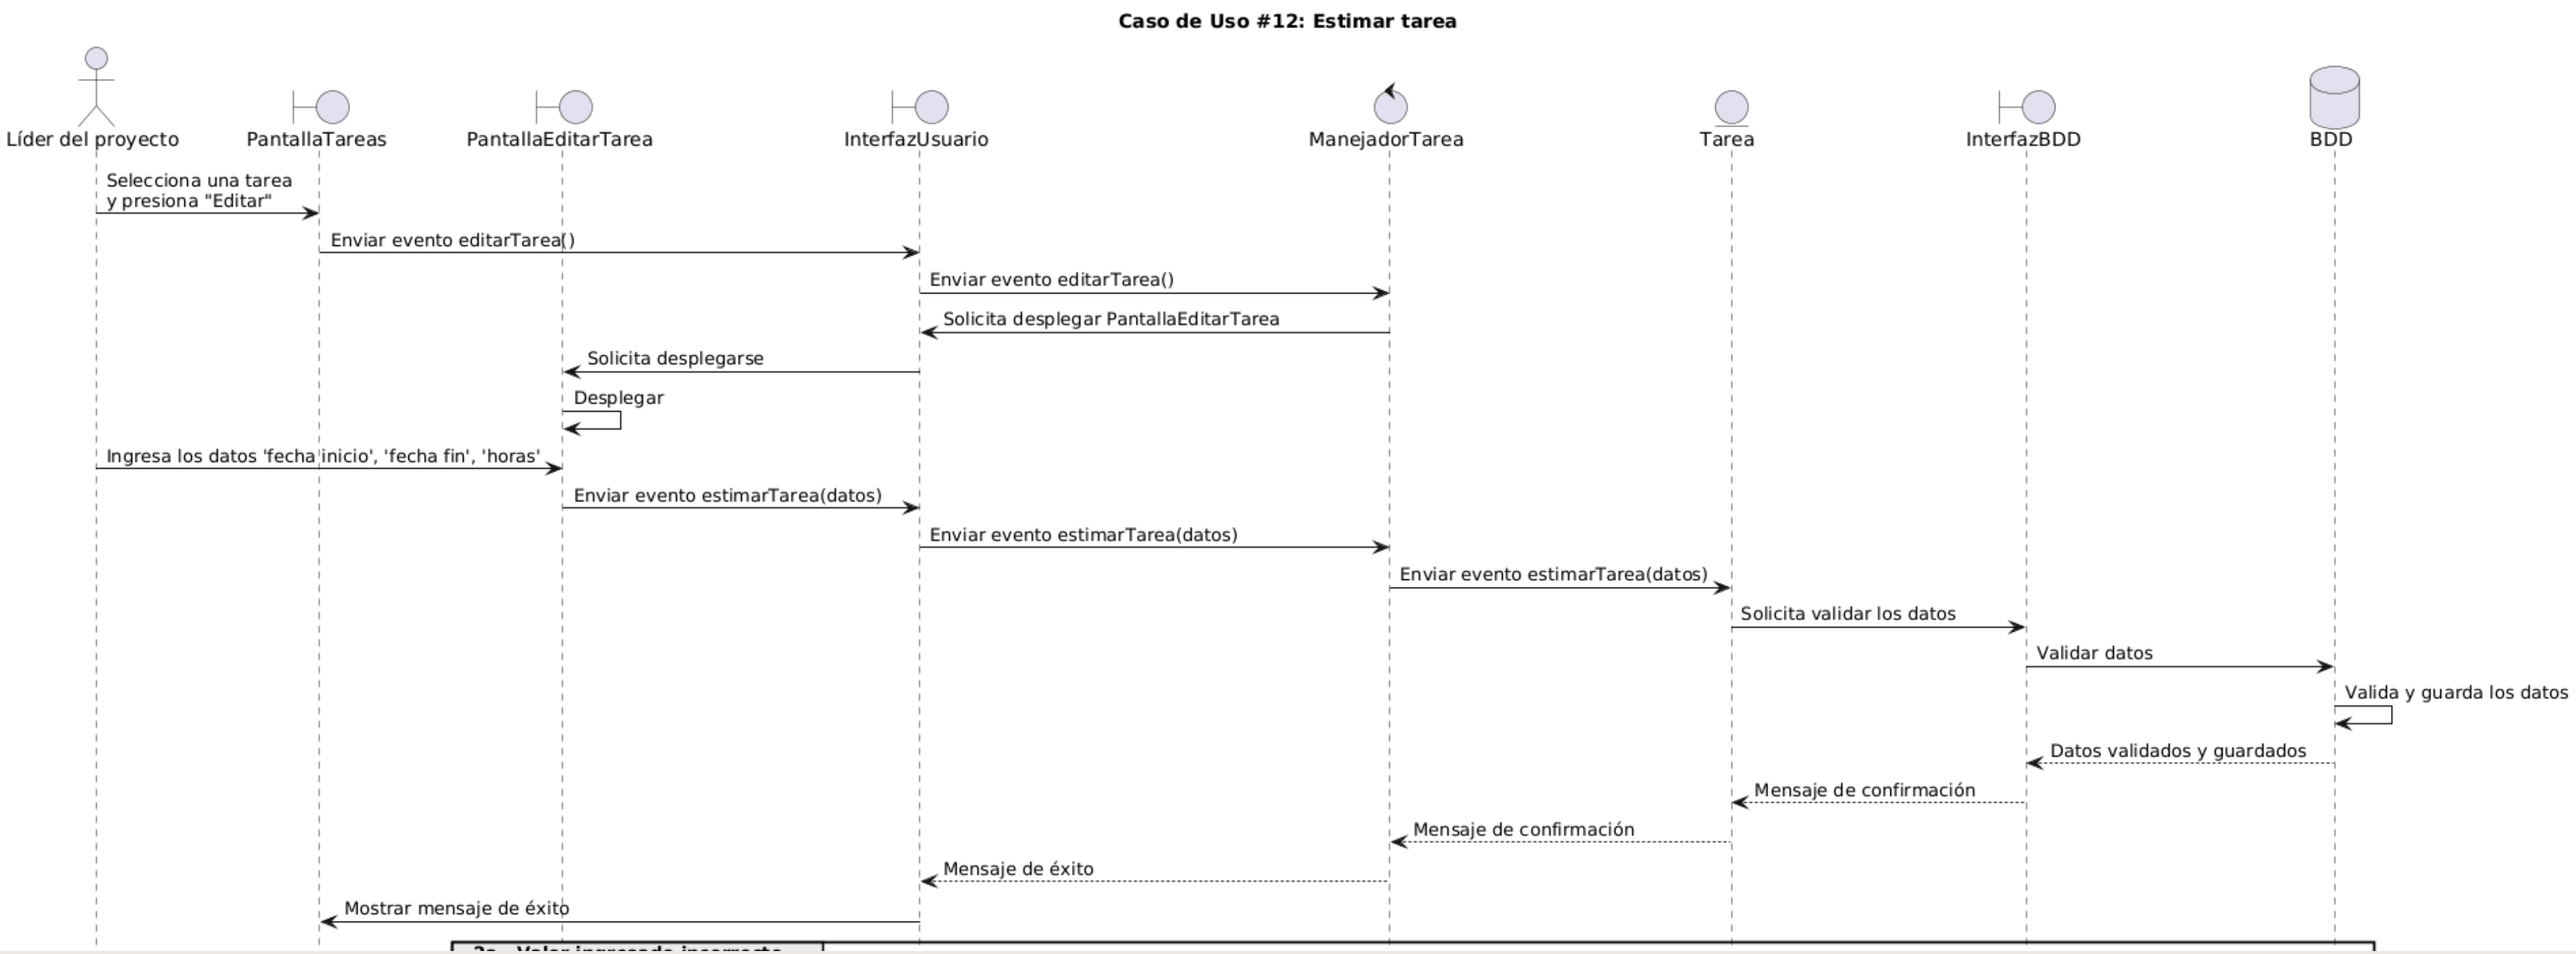


NEXTECH


CU 12: ESTIMAR TAREA
FLUJOS ALTERNATIVOS

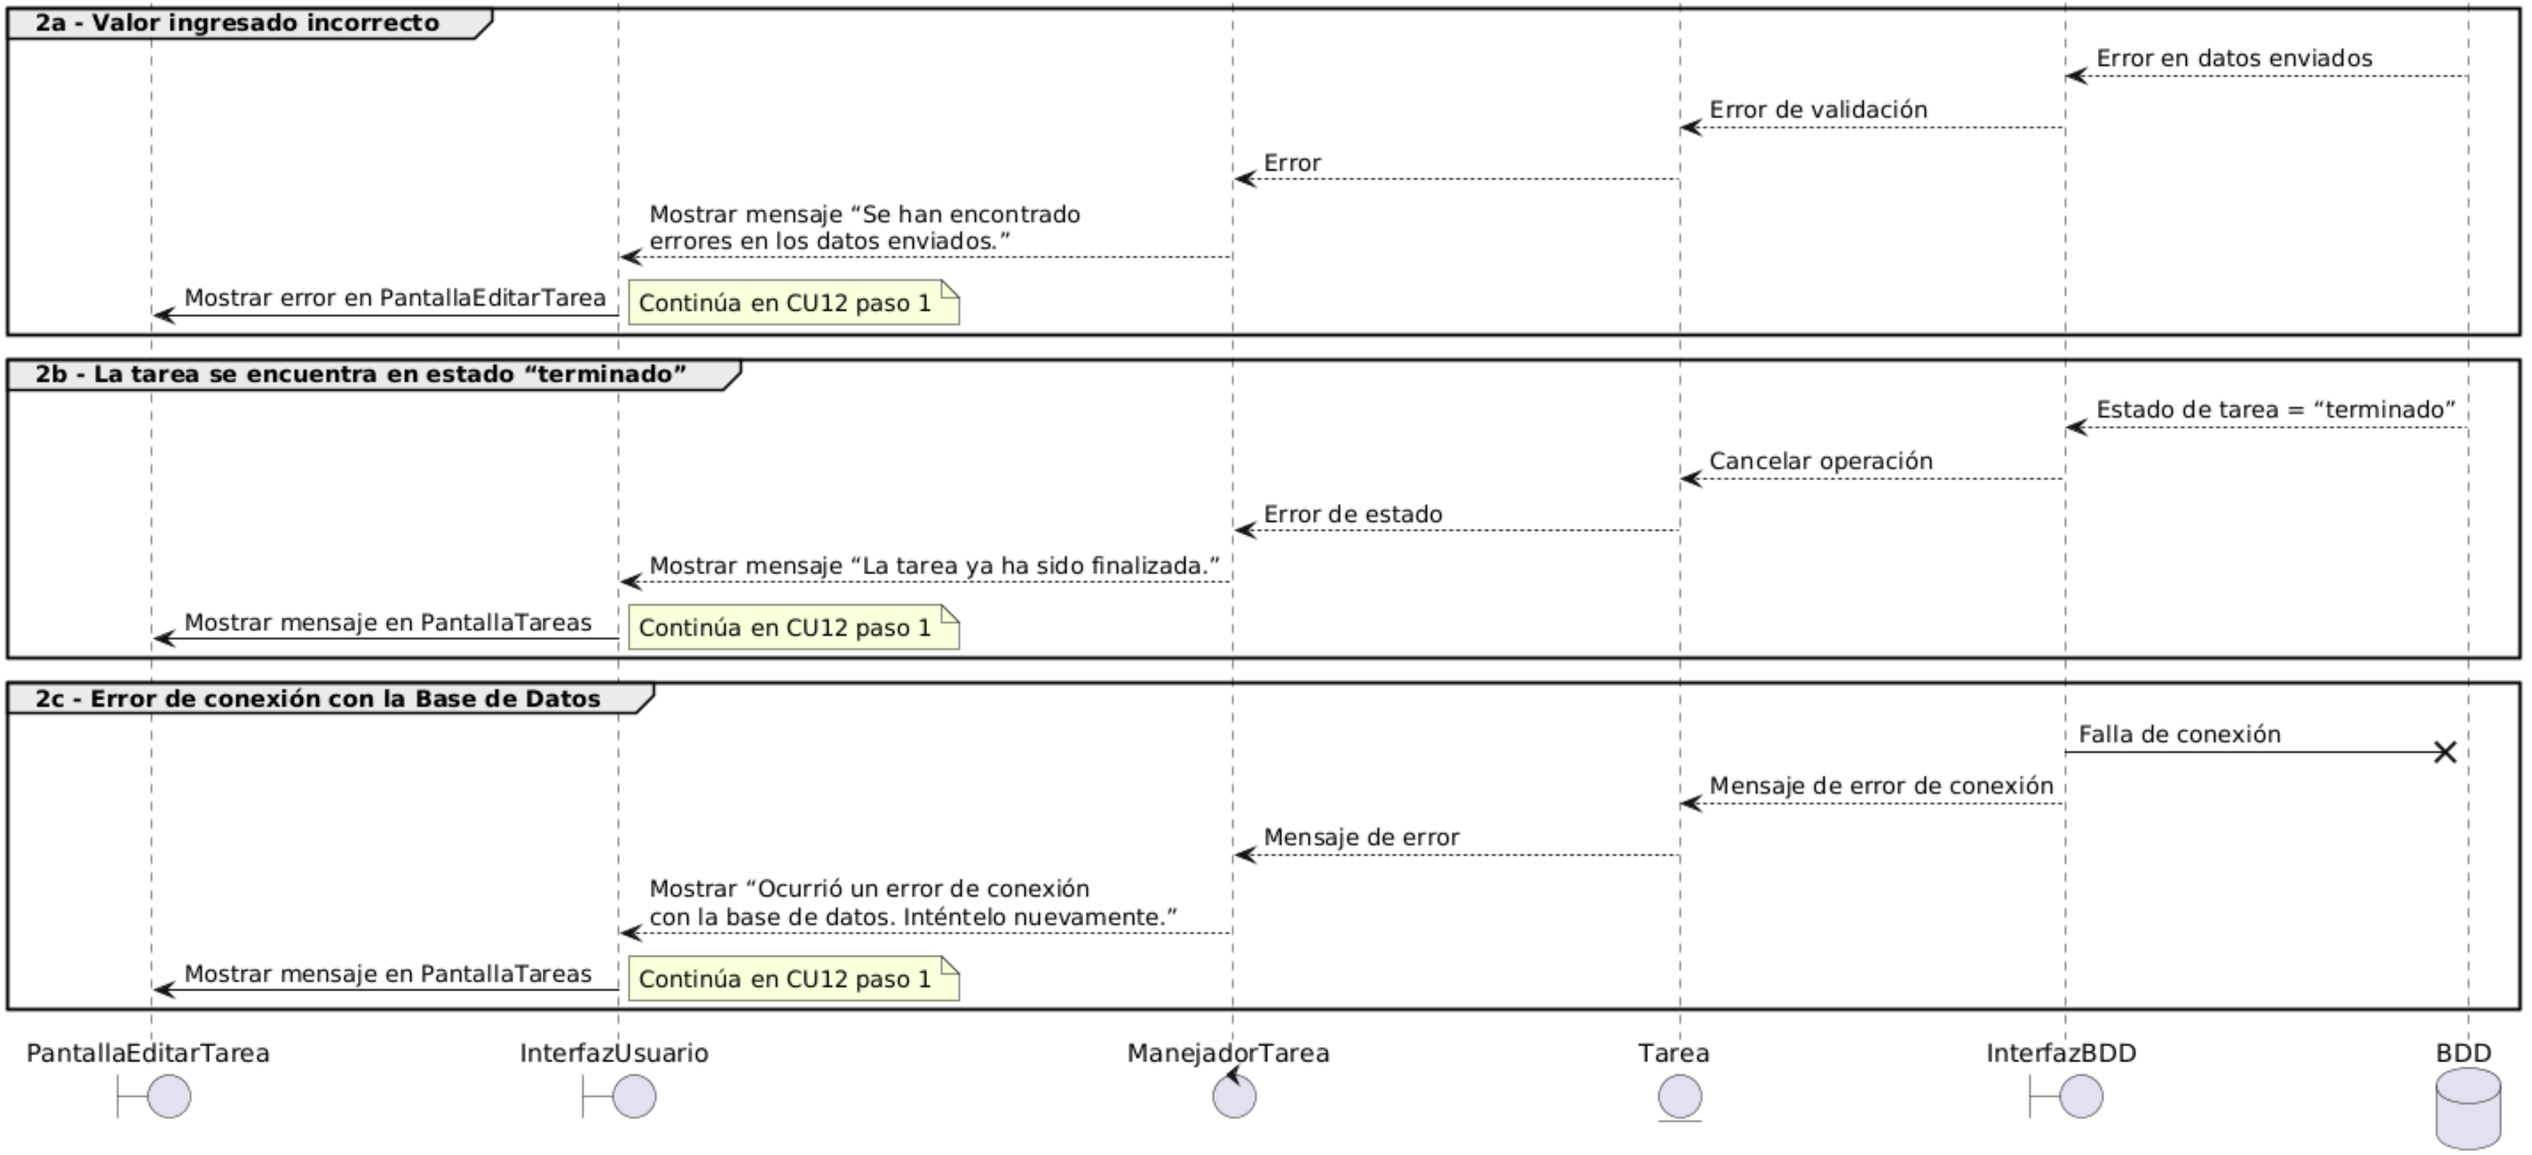

CU 20: REGISTRAR TIEMPO (CRONÓMETRO)
FLUJO PRINCIPAL / ALTERNATIVO

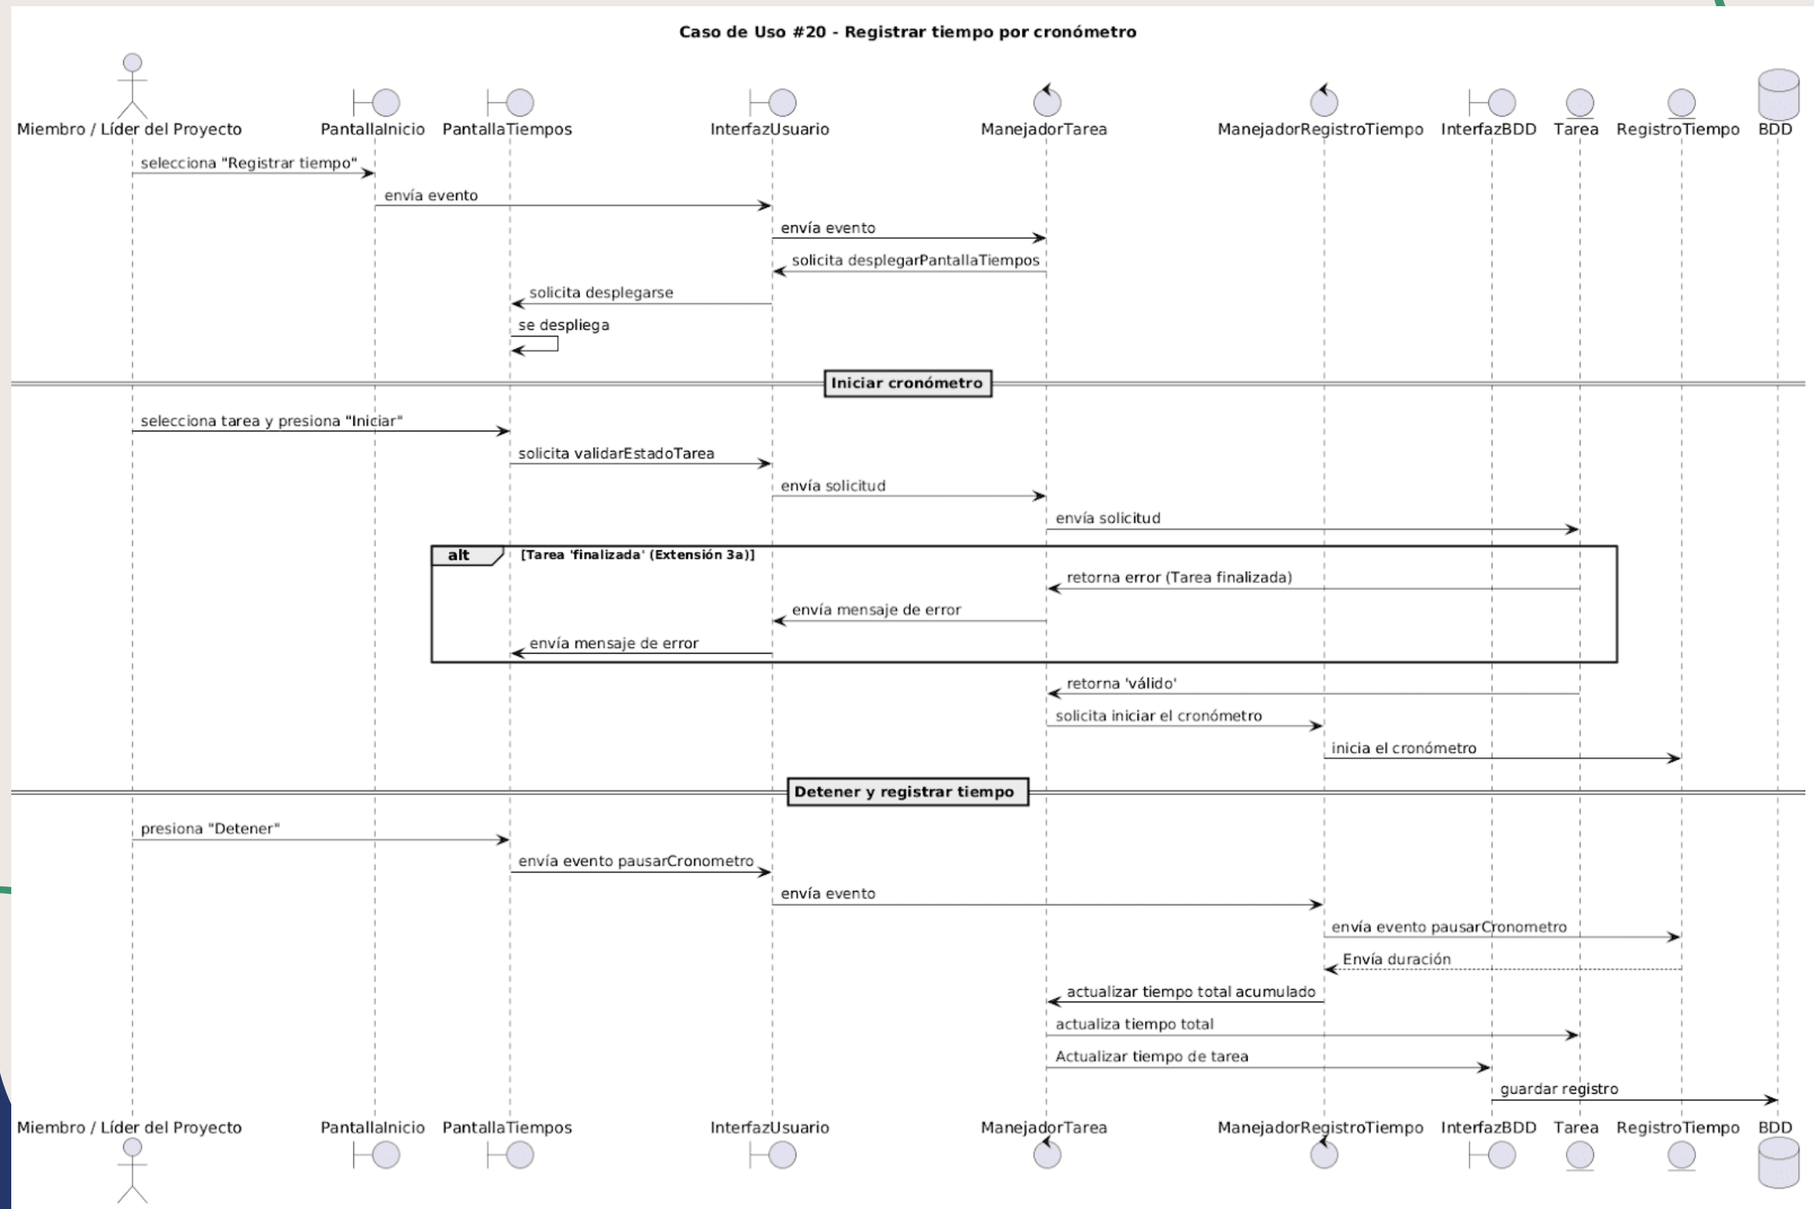


CU 20: REGISTRAR TIEMPO (CRONÓMETRO)
FLUJO PRINCIPAL

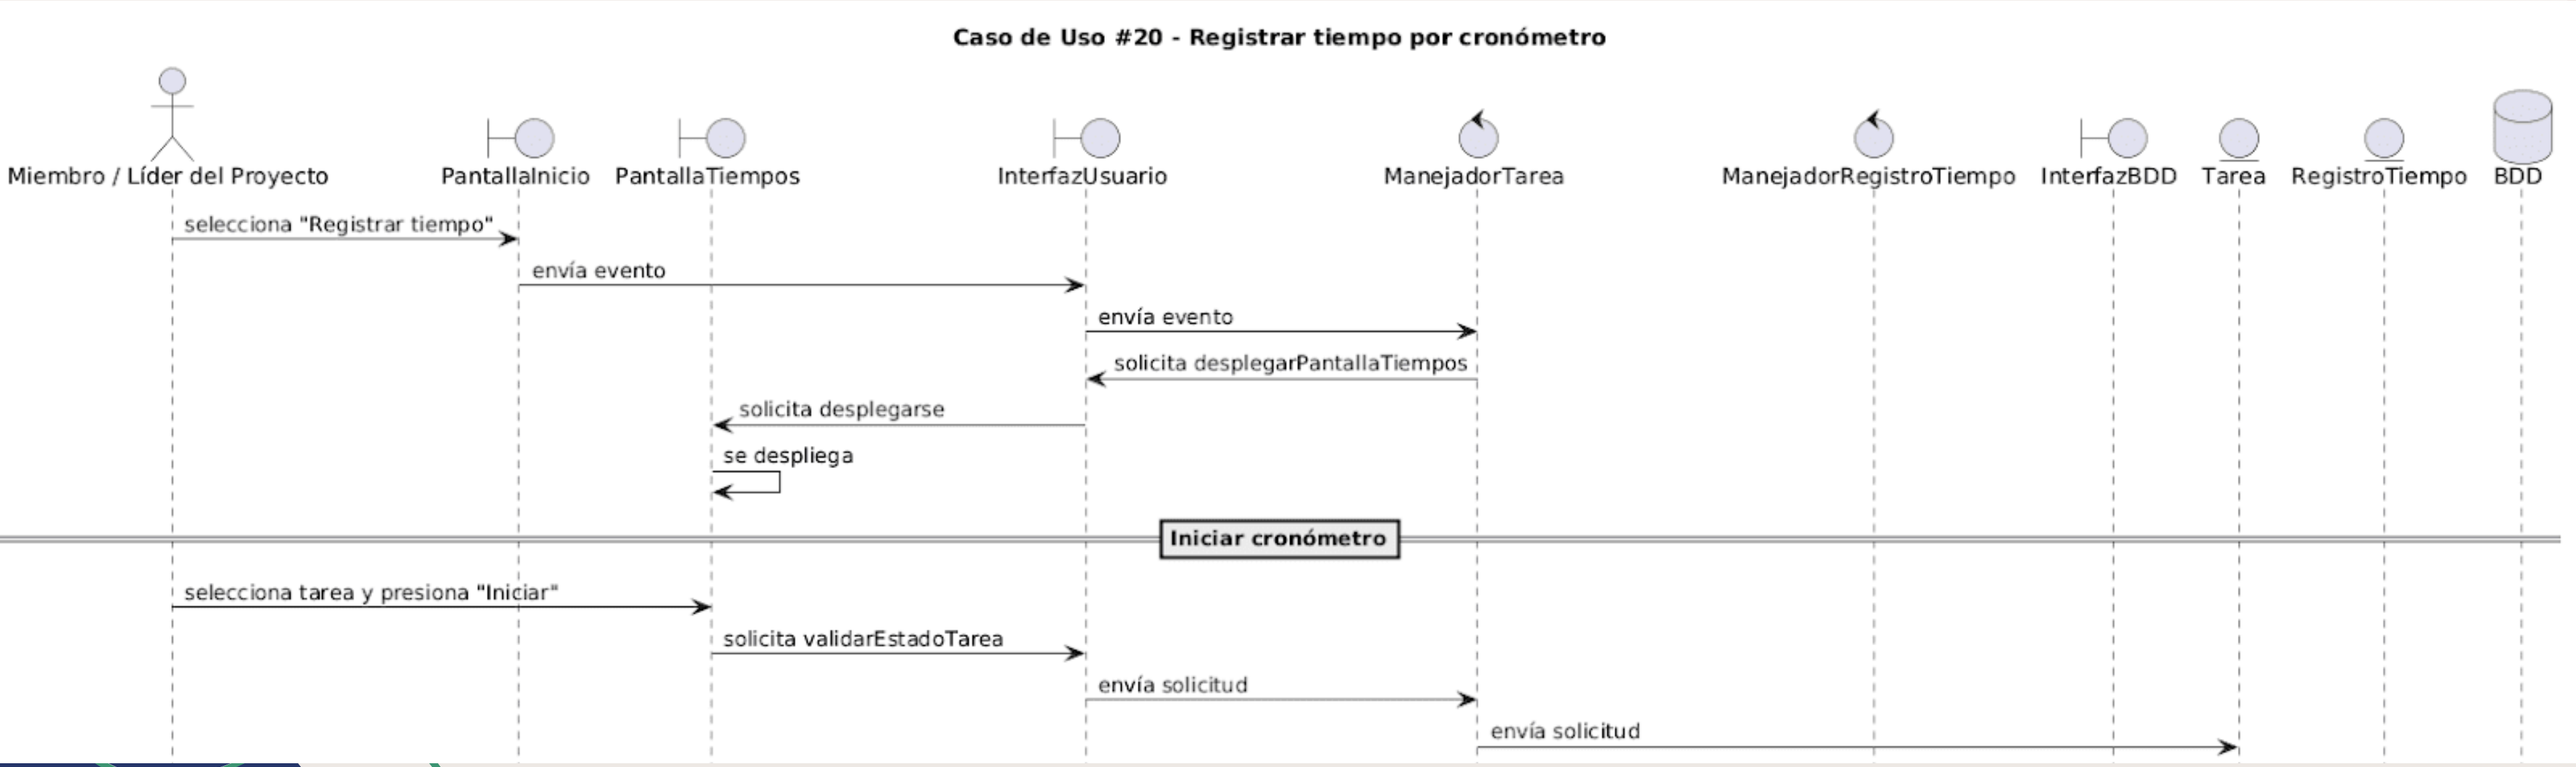

NEXTECH

CU 20: REGISTRAR TIEMPO (CRONÓMETRO)
FLUJO PRINCIPAL/ALTERNATIVO

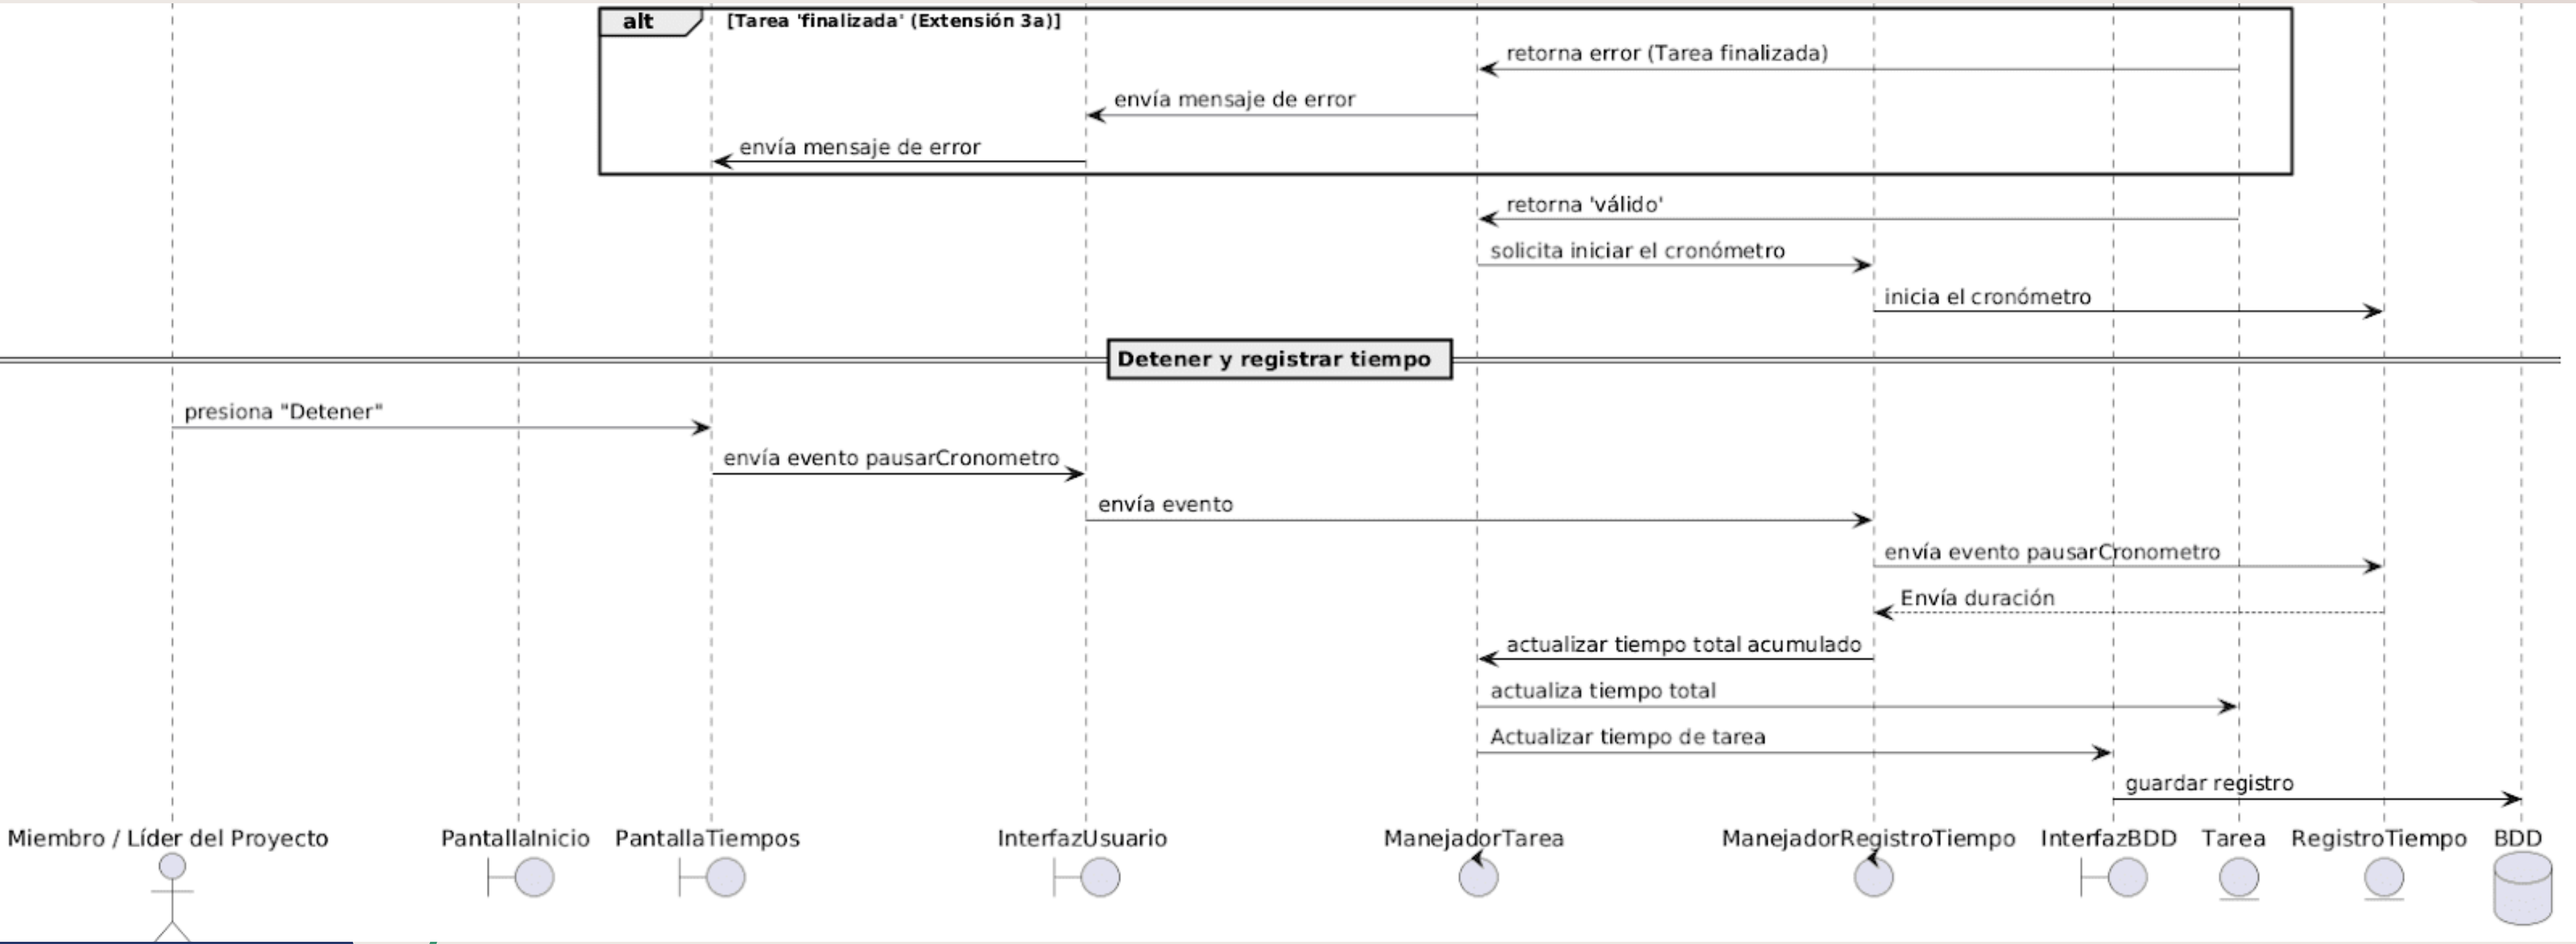

NEXTECH



IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DATOS

NEXTECH



```sql
-- Tabla Proyecto
CREATE TABLE Proyecto (
    idProyecto INT PRIMARY KEY,
    equipo VARCHAR(255),
    fechaCreacion DATE,
    estado VARCHAR(50),
    nombre VARCHAR(255)
);

-- Tabla Etapa
CREATE TABLE Etapa (
    idEtapa INT PRIMARY KEY,
    idProyecto INT,
    nombre VARCHAR(255),
    fechaInicio DATE,
    fechaFin DATE,
    CONSTRAINT fk_Etapa_Proyecto FOREIGN KEY (idProyecto)
        REFERENCES Proyecto(idProyecto)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE
);
```

```sql
-- Tabla Iteracion
CREATE TABLE Iteracion (
    idIteracion INT PRIMARY KEY,
    idEtapa INT,
    numero INT,
    descripcion TEXT,
    fechaInicio DATE,
    fechaFin DATE,
    CONSTRAINT fk_Iteracion_Etapa FOREIGN KEY (idEtapa)
        REFERENCES Etapa(idEtapa)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE
);

-- Tabla Usuario
CREATE TABLE Usuario (
    idUsuario INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(255),
    rolProyecto VARCHAR(100),
    correo VARCHAR(255)
);

-- Tabla Rol
CREATE TABLE Rol (
    idRol INT PRIMARY KEY,
    nombreRol VARCHAR(100)
);
```

NEXTECH



```sql
-- Tabla Usuario_Proyecto
CREATE TABLE Usuario_Proyecto (
    idUsuario INT,
    idProyecto INT,
    rolProyecto VARCHAR(100),
    PRIMARY KEY (idUsuario, idProyecto),
    CONSTRAINT fk_UsuarioProyecto_Usuario FOREIGN KEY (idUsuario)
        REFERENCES Usuario(idUsuario)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_UsuarioProyecto_Proyecto FOREIGN KEY (idProyecto)
        REFERENCES Proyecto(idProyecto)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE
);
```

```sql
-- Tabla Categoria
CREATE TABLE Categoria (
    idCategoria INT PRIMARY KEY,
    idProyecto INT,
    nombre VARCHAR(255),
    descripcion TEXT,
    CONSTRAINT fk_Categoria_Proyecto FOREIGN KEY (idProyecto)
        REFERENCES Proyecto(idProyecto)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE
);
```

NEXTECH



```sql
-- Tabla Usuario_Proyecto
CREATE TABLE Usuario_Proyecto (
    idUsuario INT,
    idProyecto INT,
    rolProyecto VARCHAR(100),
    PRIMARY KEY (idUsuario, idProyecto),
    CONSTRAINT fk_UsuarioProyecto_Usuario FOREIGN KEY (idUsuario)
        REFERENCES Usuario(idUsuario)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_UsuarioProyecto_Proyecto FOREIGN KEY (idProyecto)
        REFERENCES Proyecto(idProyecto)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE
);
```

```sql
-- Tabla Categoria
CREATE TABLE Categoria (
    idCategoria INT PRIMARY KEY,
    idProyecto INT,
    nombre VARCHAR(255),
    descripcion TEXT,
    CONSTRAINT fk_Categoria_Proyecto FOREIGN KEY (idProyecto)
        REFERENCES Proyecto(idProyecto)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE
);
```

NEXTECH



```sql
USE KAIROS;
-- ===== PROYECTO =====
INSERT INTO Proyecto (idProyecto, equipo, fechaCreacion, estado, nombre)
VALUES (1, 'Equipo Kairos', '2025-10-01', 'En desarrollo', 'Kairos');

-- ===== USUARIOS =====
INSERT INTO Usuario (idUsuario, nombre, rolProyecto, correo) VALUES
(1, 'Gonzalo', 'Desarrollador', 'gonzalo@kairos.com'),
(2, 'Guillermo', 'Líder de Proyecto', 'guillermo@kairos.com'),
(3, 'Valeria', 'Analista', 'valeria@kairos.com'),
(4, 'Agustina', 'Tester', 'agustina@kairos.com'),
(5, 'Florencia', 'Diseñadora UX', 'florencia@kairos.com');

-- ===== ASIGNACIÓN USUARIOS A PROYECTO =====
INSERT INTO Usuario_Proyecto (idUsuario, idProyecto, rolProyecto) VALUES
(1, 1, 'Desarrollador'),
(2, 1, 'Líder de Proyecto'),
(3, 1, 'Analista'),
(4, 1, 'Tester'),
(5, 1, 'Diseñadora UX');

-- ===== ETAPAS =====
INSERT INTO Etapa (idEtapa, idProyecto, nombre, fechaInicio, fechaFin) VALUES
(1, 1, 'Inicio', '2025-10-01', '2025-10-15'),
(2, 1, 'Elaboración', '2025-10-16', '2025-11-15');
```

NEXTECH




```sql
-- ===== ITERACIONES =====
INSERT INTO Iteracion (idIteracion, idEtapa, numero, descripcion, fechaInicio, fechaFin) VALUES
(1, 1, 1, 'Primera iteración del inicio del proyecto', '2025-10-01', '2025-10-15'),
(2, 2, 1, 'Primera iteración de elaboración: arquitectura y módulos base', '2025-10-16', '2025-10-31'),
(3, 2, 2, 'Segunda iteración de elaboración: integración y pruebas iniciales', '2025-11-01', '2025-11-15');

-- ===== TAREAS =====
INSERT INTO Tarea (idTarea, idIteracion, idUsuario, estado, descripcion, fechaCreacion, prioridad, fechaFin, nombre) VALUES
(1, 1, 3, 'Completada', 'Relevamiento de requerimientos', '2025-10-01', 'Alta', '2025-10-05', 'Relevamiento'),
(2, 1, 2, 'Completada', 'Definición del alcance y planificación', '2025-10-03', 'Alta', '2025-10-10', 'Planificación'),
(3, 2, 1, 'En progreso', 'Desarrollo de la base de datos inicial', '2025-10-17', 'Alta', NULL, 'Diseño BD'),
(4, 2, 5, 'Pendiente', 'Diseño de la interfaz de usuario', '2025-10-20', 'Media', NULL, 'Diseño UI'),
(5, 3, 4, 'Pendiente', 'Ejecución de pruebas de integración', '2025-11-02', 'Alta', NULL, 'Pruebas');
```

NEXTECH

```sql
USE KAIROS;
SELECT
    u.idUsuario,
    u.nombre AS Usuario,
    up.rolProyecto AS RolEnProyecto
FROM Usuario_Proyecto up
JOIN Usuario u ON up.idUsuario = u.idUsuario
JOIN Proyecto p ON up.idProyecto = p.idProyecto
WHERE p.nombre = 'Kairos';
```

idUsuario	Usuario	RolEnProyecto
1	Gonzalo	Desarrollador
2	Guillermo	Líder de Proyecto
3	Valeria	Analista
4	Agustina	Tester
5	Florencia	Diseñadora UX

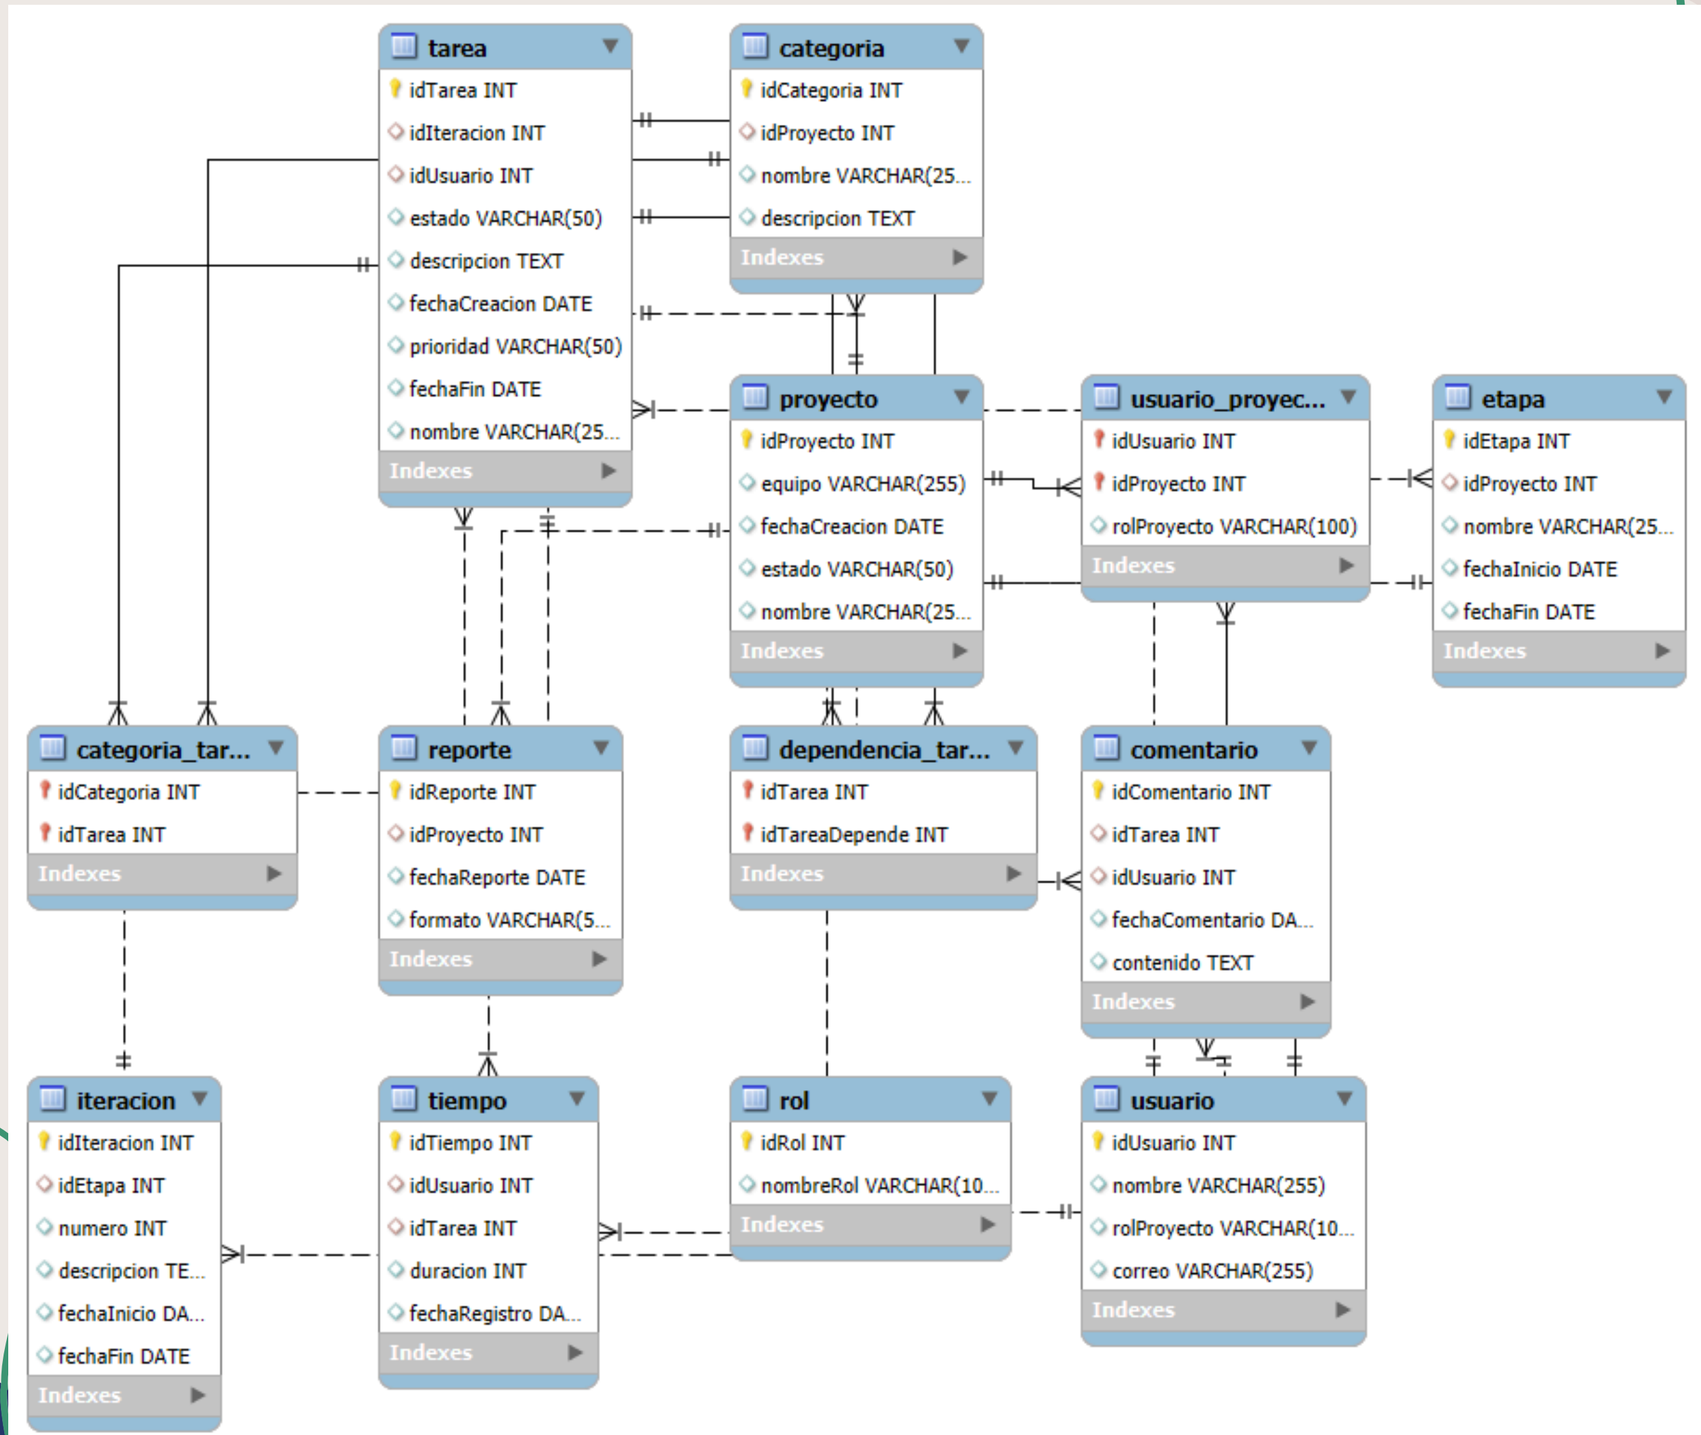
tarea
idTarea INT
idIteracion INT
idUsuario INT
estado VARCHAR(50)
descripcion TEXT
fechaCreacion DATE
prioridad VARCHAR(50)
fechaFin DATE
nombre VARCHAR(25...
Indexes
categoria
idCategoria INT
idProyecto INT
nombre VARCHAR(25...
descripcion TEXT
Indexes
proyecto
idProyecto INT
equipo VARCHAR(255)
fechaCreacion DATE
estado VARCHAR(50)
nombre VARCHAR(25...
Indexes
usuario_proyec...
idUsuario INT
idProyecto INT
rolProyecto VARCHAR(100)
Indexes
etapa
idEtapa INT
idProyecto INT
nombre VARCHAR(25...
fechaInicio DATE
fechaFin DATE
Indexes
categoria_tar...
idCategoria INT
idTarea INT
Indexes
reporte
idReporte INT
idProyecto INT
fechaReporte DATE
formato VARCHAR(5...
Indexes
dependencia_tar...
idTarea INT
idTareaDepende INT
Indexes
comentario
idComentario INT
idTarea INT
idUsuario INT
fechaComentario DA...
contenido TEXT
Indexes
iteracion
idIteracion INT
idEtapa INT
numero INT
descripcion TE...
fechaInicio DA...
fechaFin DATE
Indexes
tiempo
idTiempo INT
idUsuario INT
idTarea INT
duracion INT
fechaRegistro DA...
Indexes
rol
idRol INT
nombreRol VARCHAR(10...
Indexes
usuario
idUsuario INT
nombre VARCHAR(255)
rolProyecto VARCHAR(10...
correo VARCHAR(255)
Indexes

NEXTECH

NEXTECH

MUCHAS GRACIAS

Equipo NexTech
