KAIROS



HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN, REGISTRO DE TIEMPOS Y VISUALIZACIÓN DEL TRABAJO

CENTURIÓN VALERIA , **ESCALANTE** GUILLERMO,
MALDONADO AGUSTINA, **MENDEZ** FLORENCIA, **ULLOA** GONZALO

NEXTECH

ÍNDICE



1 REGISTRO DE TIEMPOS / COMMITS

2 ESTIMACIÓN

3 SEGUIMIENTO DE RIESGOS

4 RESUMEN DE CASOS DE USO

5 RESUMEN DE CASOS DE PRUEBA

6 MÉTRICAS

7 RESUMEN

8 ESPECIFICACIÓN CU A IMPLEMENTAR

NEXTECH

RESUMEN

-Priorización, diseño y especificación, implementación y ejecución de casos de prueba para 1ra tanda de CU:

- CU09: Crear tarea
- CU12: Estimar tarea
- CU20: Registrar tiempo por cronómetro



-Cierre de Fase Construcción Iteración 1
-Plan de Fase Construcción Iteración 2

NEXTECH

RESUMEN



-Priorización 2da tanda de CU:

- CU07: Crear etapa.
- CU08: Crear iteración.
- CU13: Asignar dependencia.
- CU14: Modificar estado de tarea.
- CU15: Visualizar tarea.
- CU16: Comentar tarea.
- CU21: Registrar tiempo manual.


NEXTECH

TIEMPOS

NEXTECH

ESFUERZO SEMANAL POR CATEGORÍA

TOTAL GENERAL: 424.18 HORAS

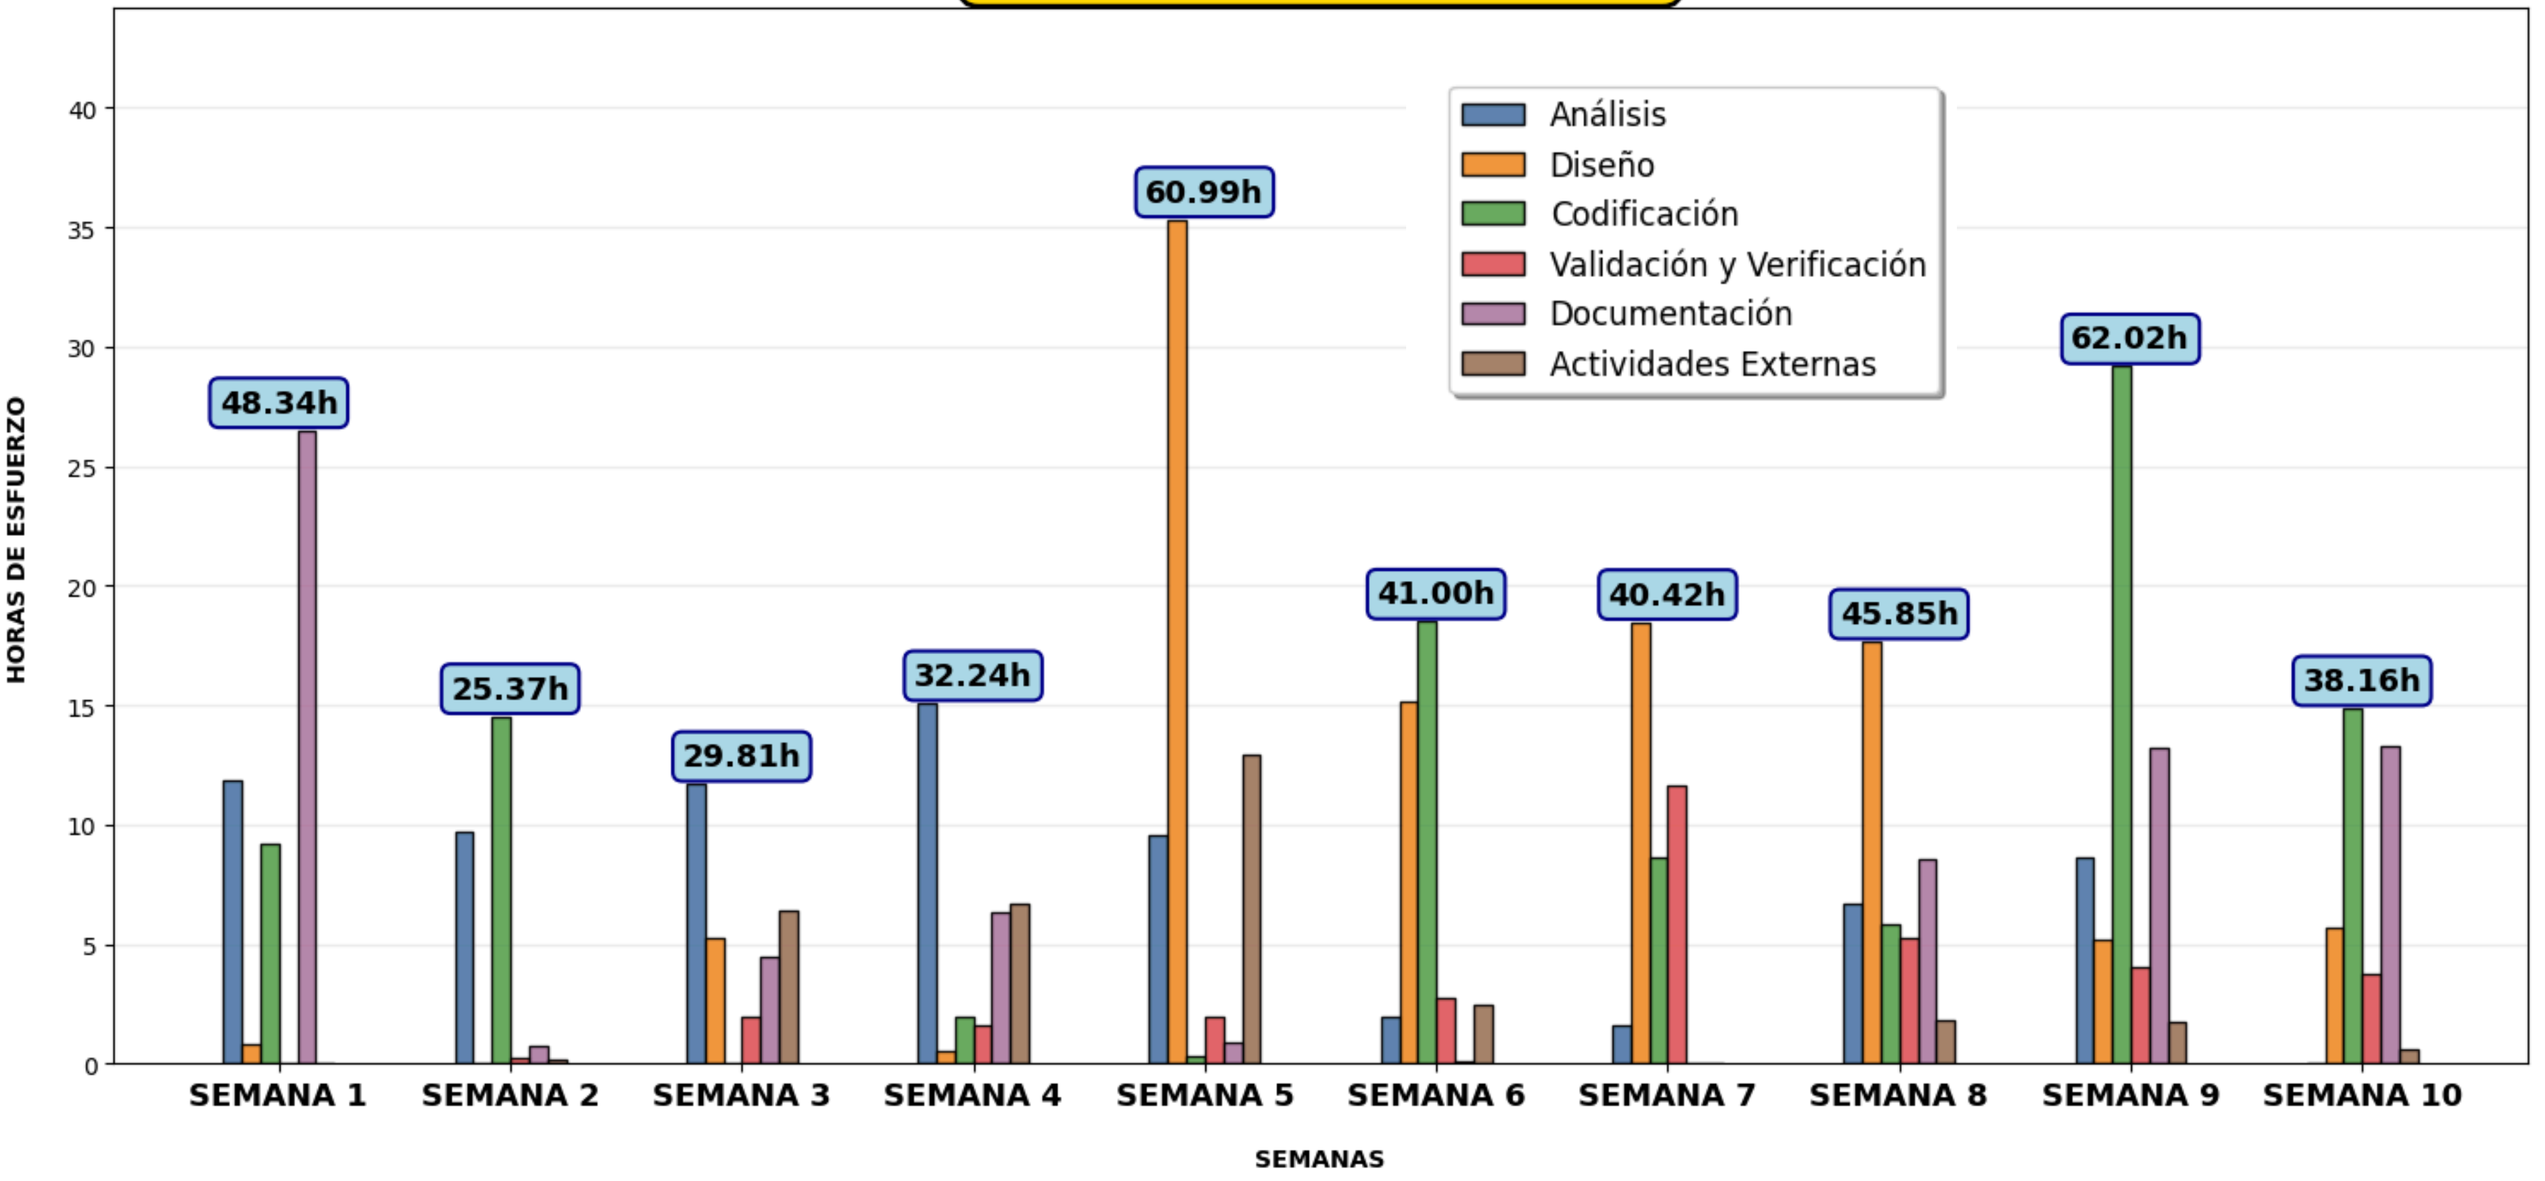




COMMITS

NEXTECH


Cantidad de Commits

Total: 134

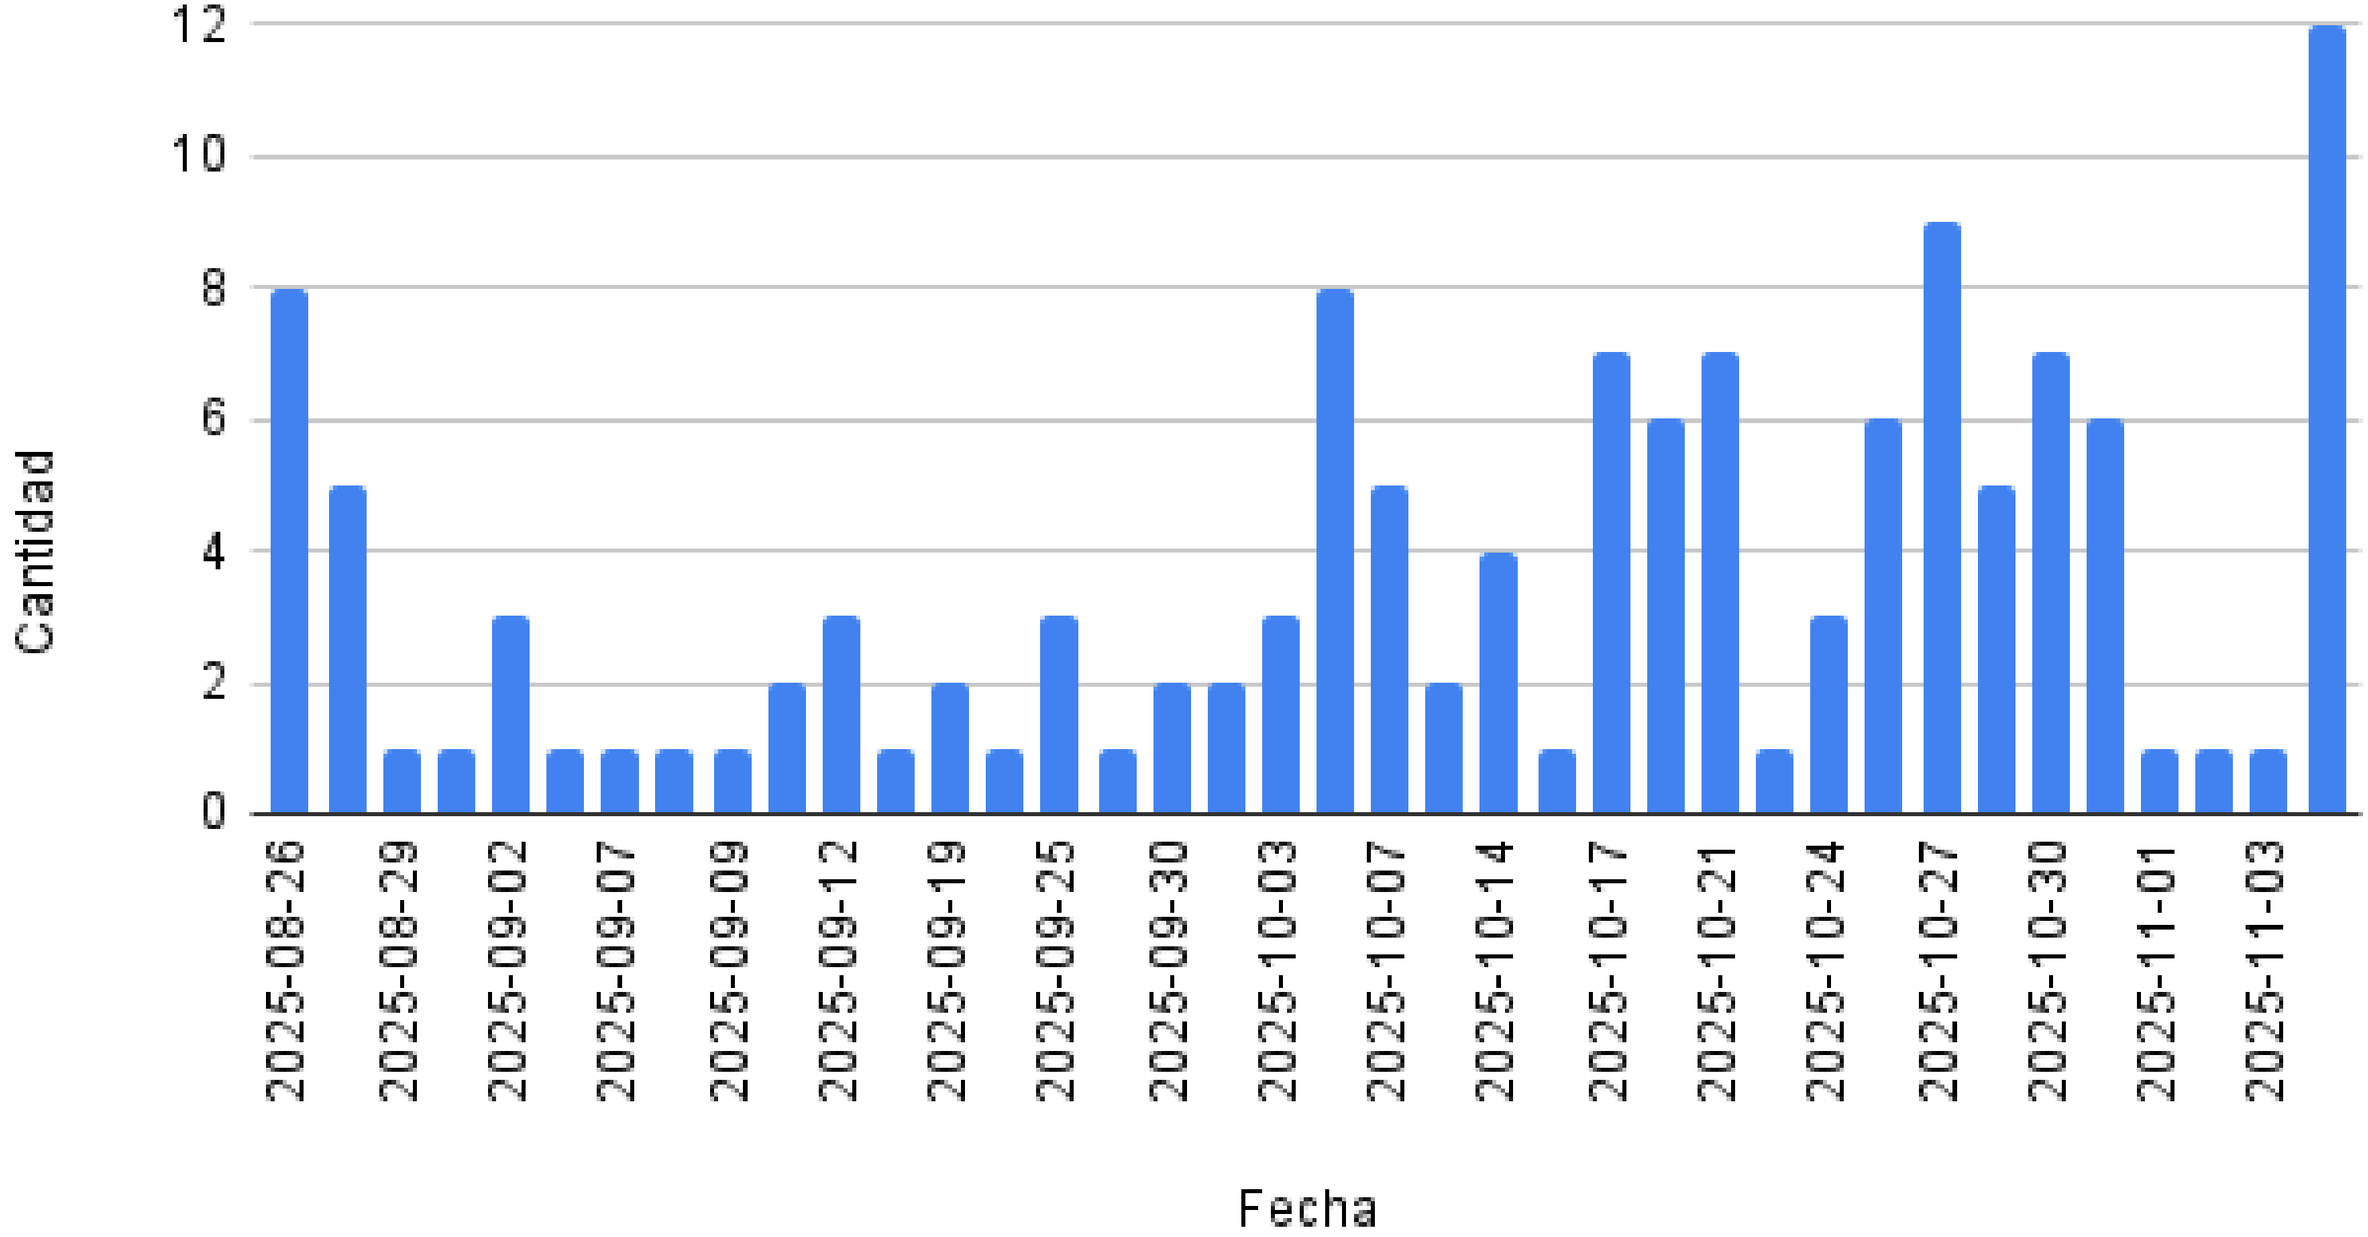

ESTIMACIÓN

NEXTECH

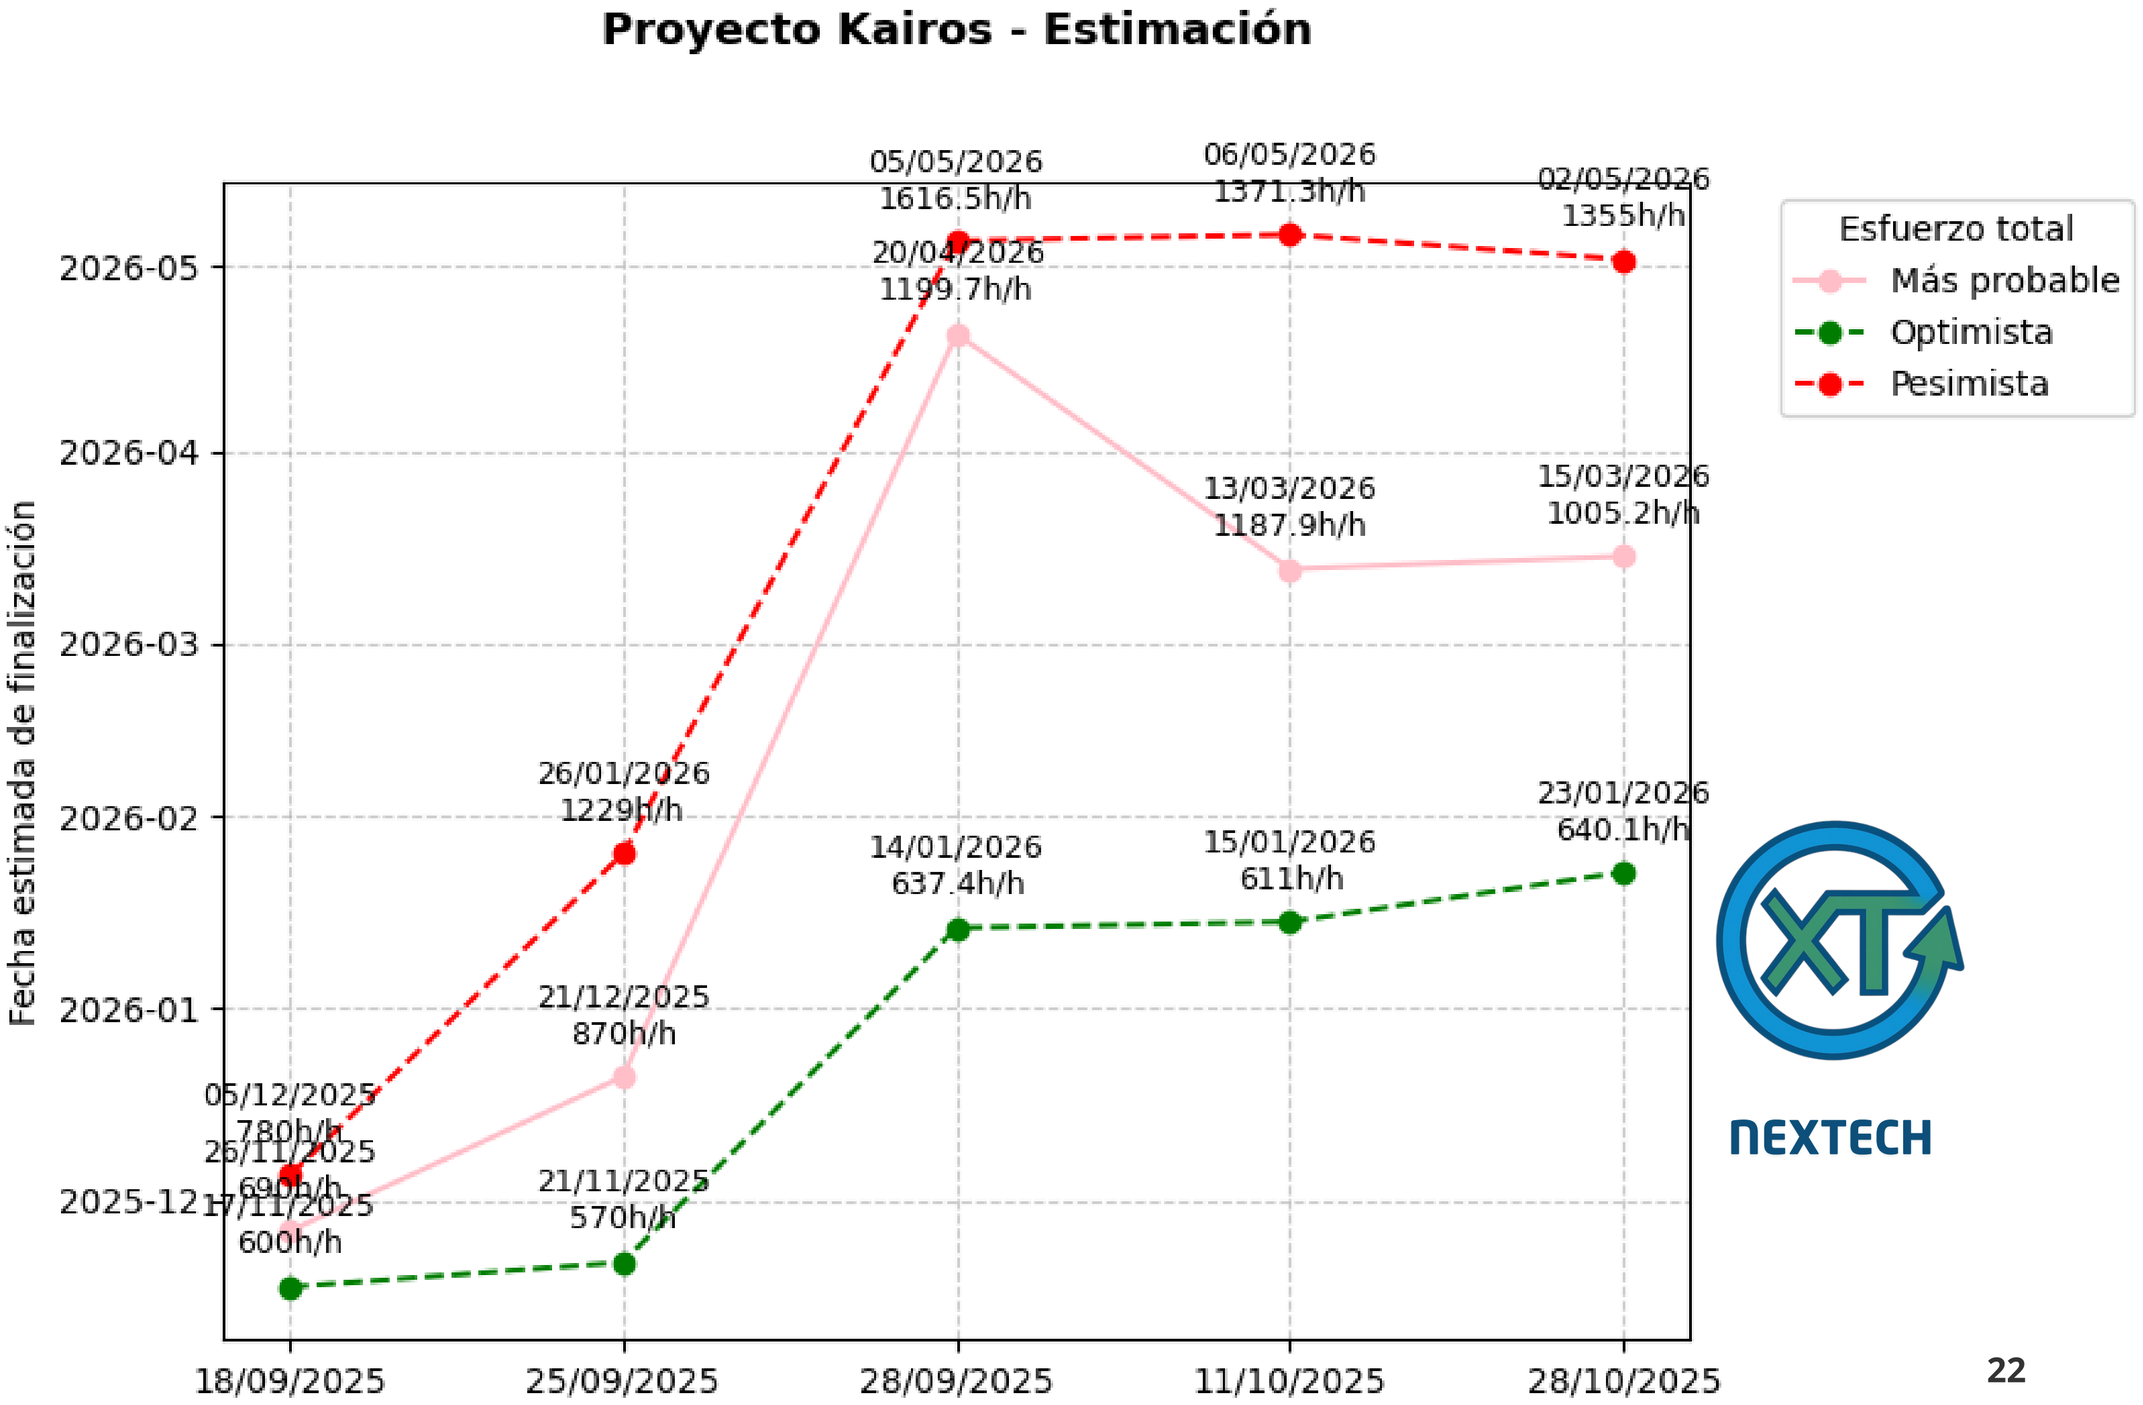
Proyecto Kairos - Estimación
Fecha estimada de finalización
2026-05
2026-04
2026-03
2026-02
2026-01
2025-12
18/09/2025
25/09/2025
28/09/2025
11/10/2025
28/10/2025
Esfuerzo total
Más probable
Optimista
Pesimista
05/05/2026
1616.5h/h
06/05/2026
1371.3h/h
02/05/2026
1355h/h
20/04/2026
1199.7h/h
13/03/2026
1187.9h/h
15/03/2026
1005.2h/h
26/01/2026
1229h/h
23/01/2026
640.1h/h
14/01/2026
637.4h/h
15/01/2026
611h/h
21/12/2025
870h/h
05/12/2025
780h/h
26/11/2025
690h/h
17/11/2025
600h/h
21/11/2025
570h/h

NEXTECH

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

NEXTECH



ESTADO ACTUAL- RIESGOS

Estado	Cantidad de riesgos
♥ No requieren acción	8
🔵 Reevaluar próxima iteración	7
🟢 Planificados / controlados	2
Total	**17**

NEXTECH

RIESGOS

RK14 - Dado que puede no existir un conjunto de datos de prueba adecuado, podría ocurrir que el sistema se valide con información poco representativa, lo que conduciría a errores no detectados hasta etapas tardías.

Plan de Mitigación				
	Tarea	Inicio	Fin	Responsables
✓	Definición de casos de prueba para el CU: Gestionar Tareas	30/10/2025	30/10/2025	Agustina Maldonado, Florencia Mendez, Guillermo Escalante
✓	Definición de casos de prueba para los CU: Crear Etapa y Crear Iteración	03/11/2025	03/11/2025	Agustina Maldonado, Florencia Mendez, Valeria Centurion
✓	Definición de casos de prueba para el CU: Registrar tiempo manual	03/11/2025	03/11/2025	Agustina Maldonado, Florencia Mendez, Gonzalo Ulloa

RIESGOS

RK20 - Dadas las múltiples ramas de desarrollo utilizadas para implementar distintas funcionalidades en paralelo, podría ocurrir la generación de conflictos o incompatibilidades al momento de integrar los cambios, lo que conduciría a errores en el código, pérdida de coherencia entre módulos e incompatibilidades funcionales.


PLAN DE MITIGACIÓN			
Tarea	**Inicio**	**Fin**	**Responsable**
✓ Integraciones frecuentes	28/10	01/11	Gonzalo Ulloa
✓ Pull Request	29/10	02/11	Gonzalo Ulloa
✓ Rama estable	28/10	30/10	Gonzalo Ulloa

NEXTECH

RESUMEN DE CASOS DE USO

NEXTECH

ESTADO ACTUAL DE LOS CASOS DE USO

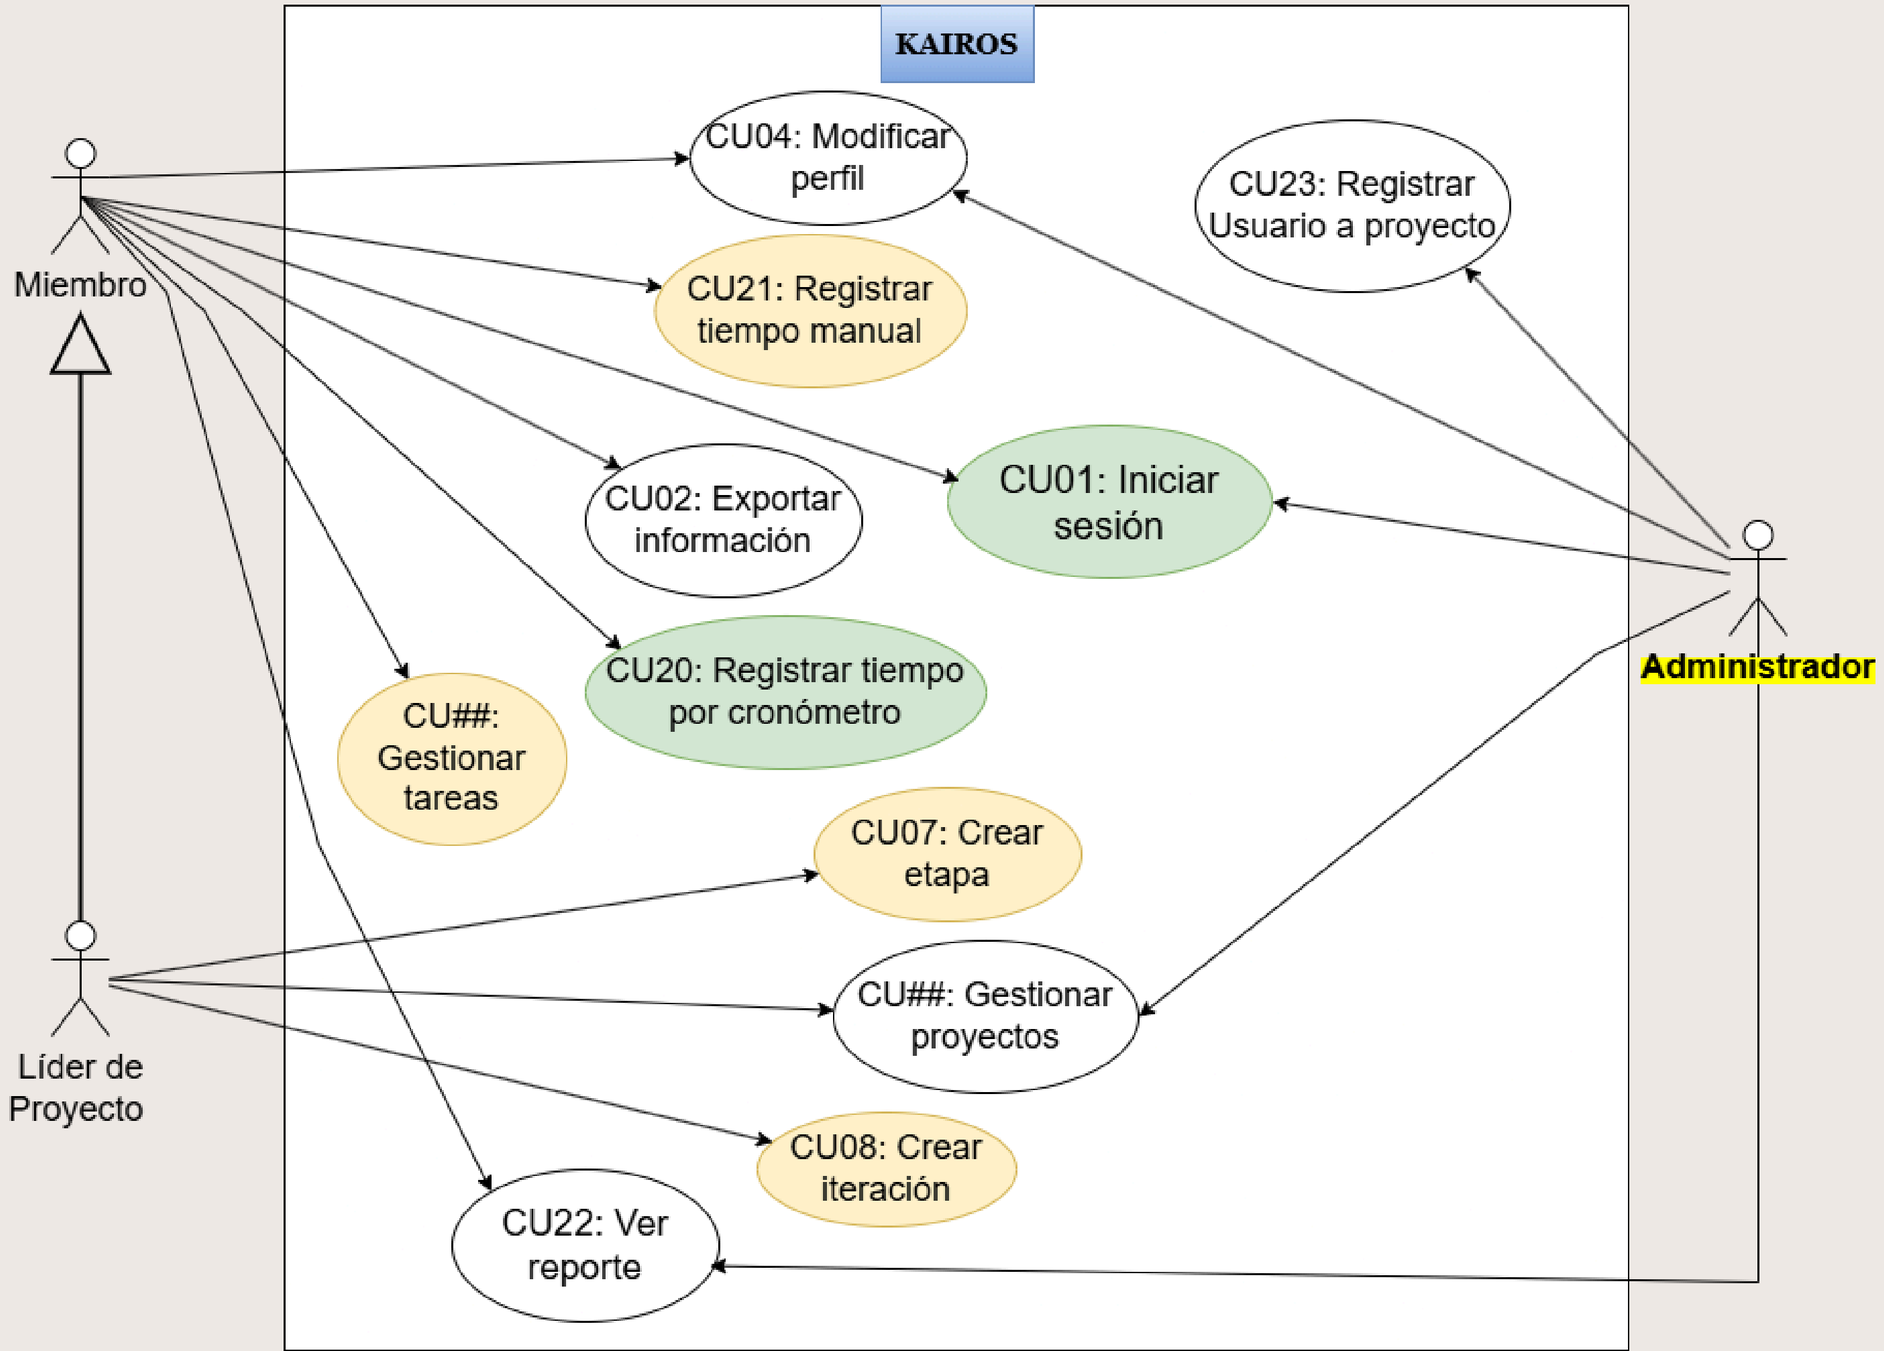

ESTADO ACTUAL DE LOS CASOS DE USO

Caso de Uso	Estado
CU01: Iniciar Sesión	Completado
CU02: Exportar informacion	No implementado
CU03: Asignar Rol	No implementado
CU04: Modificar Perfil	No implementado
CU05: Crear Proyecto	No implementado
CU06: Modificar Proyecto	No implementado
CU07: Crear Etapa	En curso
CU08: Crear iteración	En curso

Caso de Uso	Estado
CU09: Crear Tarea	Completado
CU10: Proponer Tarea	No implementado
CU11: Aprobar Tarea	No implementado
CU12: Estimar Tarea	Completado
CU13: Asignar dependencia	En curso
CU14: Modificar estado de tarea	En curso
CU15: Visualizar Tarea	En curso

CU16: Comentar Tarea	**En curso**
CU17: Categorizar tiempo	**No implementado**
CU18: Añadir Categoría	**No implementado**
CU19: Modificar Categoría	**No implementado**
CU20: Registrar tiempo por cronómetro	**Implementado**
CU21: Registrar tiempo manual	**En curso**
CU22: Ver reporte	**No implementado**
CU23: Registrar usuario al proyecto	**No implementado**

CU implementados: 4

CU no implementados: 12

CU en curso: 7

Total CU: 23



RESUMEN DE CASOS DE PRUEBA


NEXTECH

ESTADO ACTUAL DE LOS CASOS DE PRUEBA

Caso de Uso	Tipo de Prueba	Total de Casos	Ejecutados	Errores Encontrados	Correcciones Aplicadas
CU01 – Iniciar Sesión	Valores Límite	4	4	0	0
CU09 / CU12: Crear y Estimar Tarea	Funcionalidad / Valores Límite	12	12	3	3
CU20: Registrar Tiempo por Cronómetro	Funcionalidad / Valores Límite / Seguridad - Integración	14	14	8	8
Totales Generales	—	30	30	11	11

ESTADO ACTUAL DE LOS CASOS DE PRUEBA


TEST UNITARIOS	
EXITOSOS	97
FALLADOS	8
EJECUTADOS	105

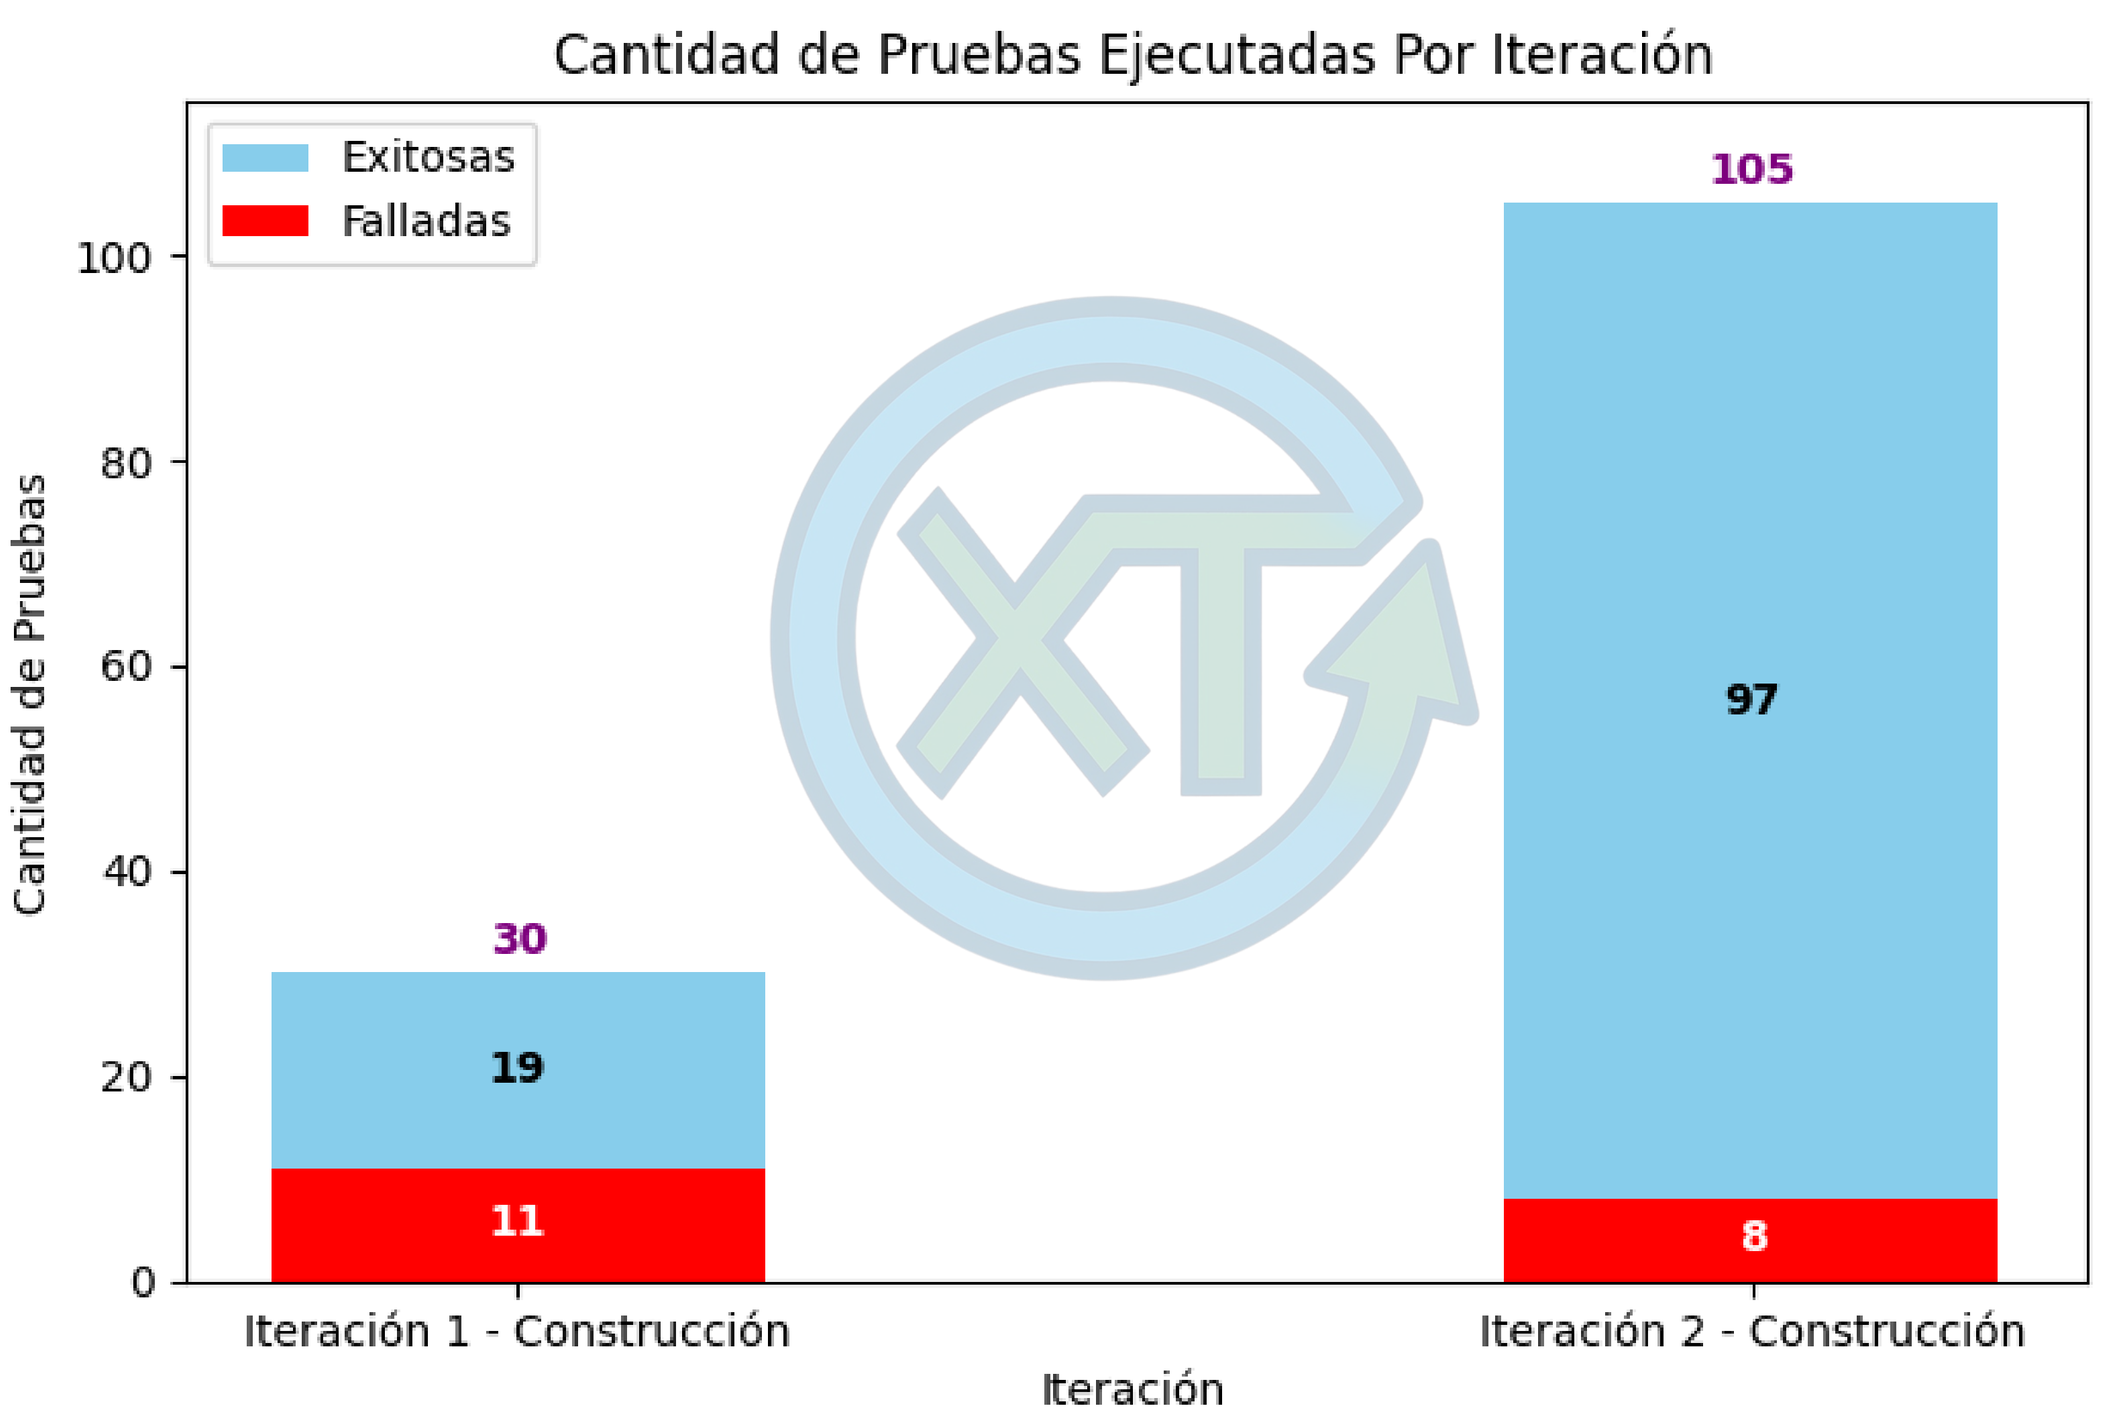
Cantidad de Pruebas Ejecutadas Por Iteración
Exitosas
Falladas
Cantidad de Pruebas
0
20
40
60
80
100
30
19
11
105
97
8
Iteración 1 - Construcción
Iteración 2 - Construcción
Iteración


MÉTRICAS

NEXTECH


DOCUMENTOS SIN NECESIDAD DE AJUSTE

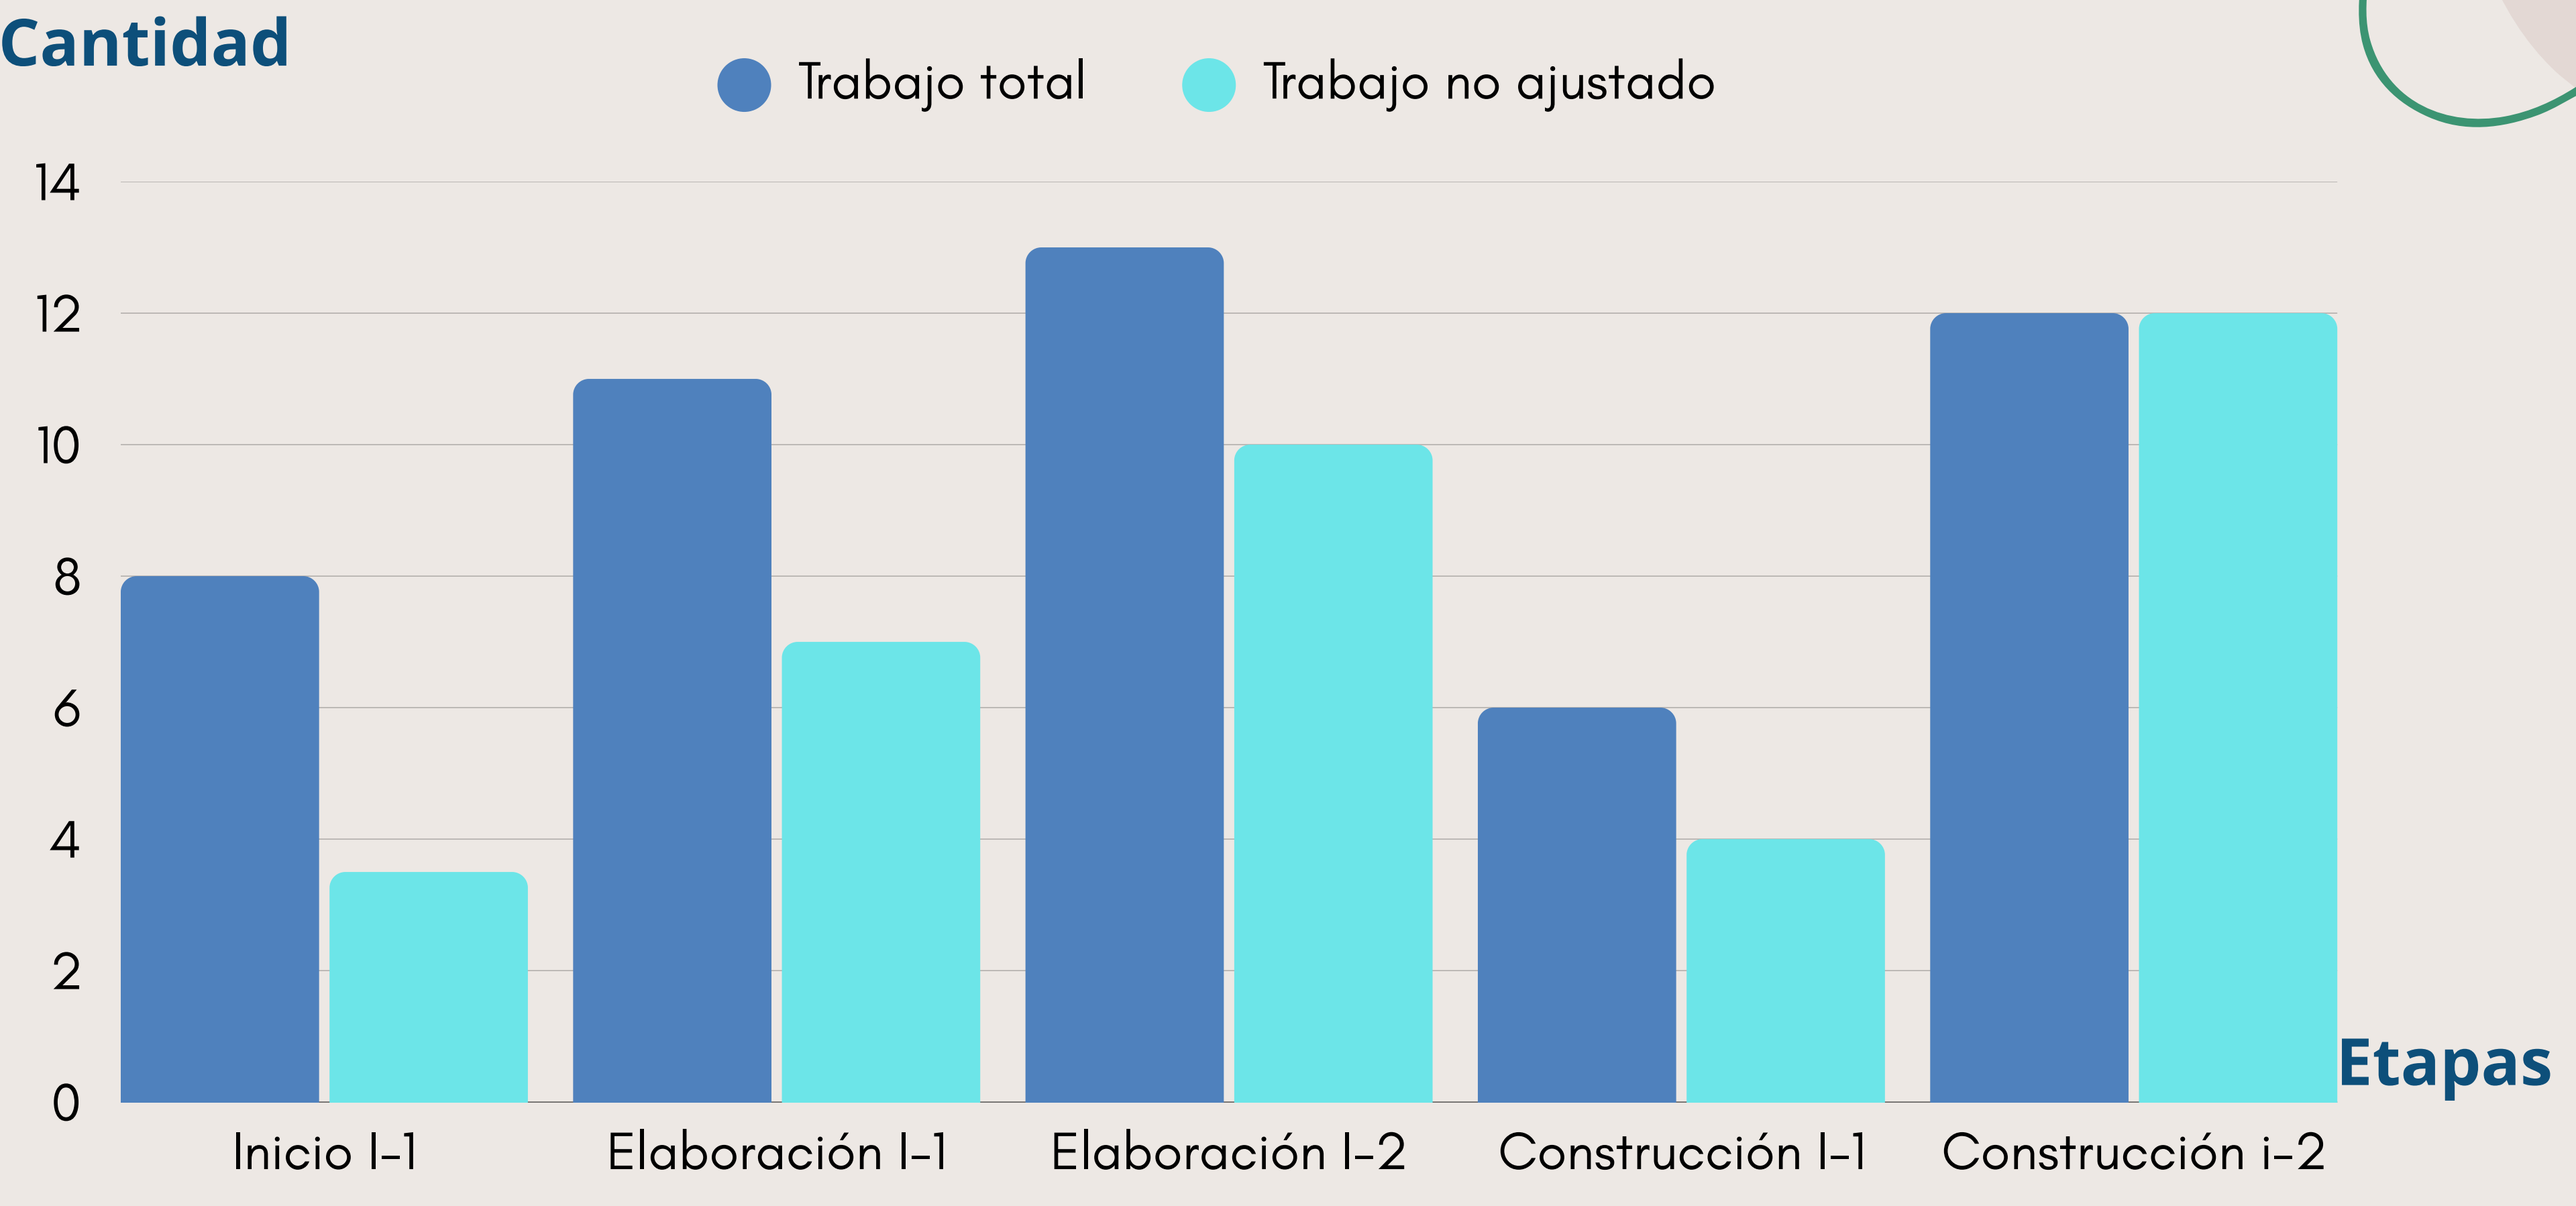


REVISIÓN DE DOCUMENTOS

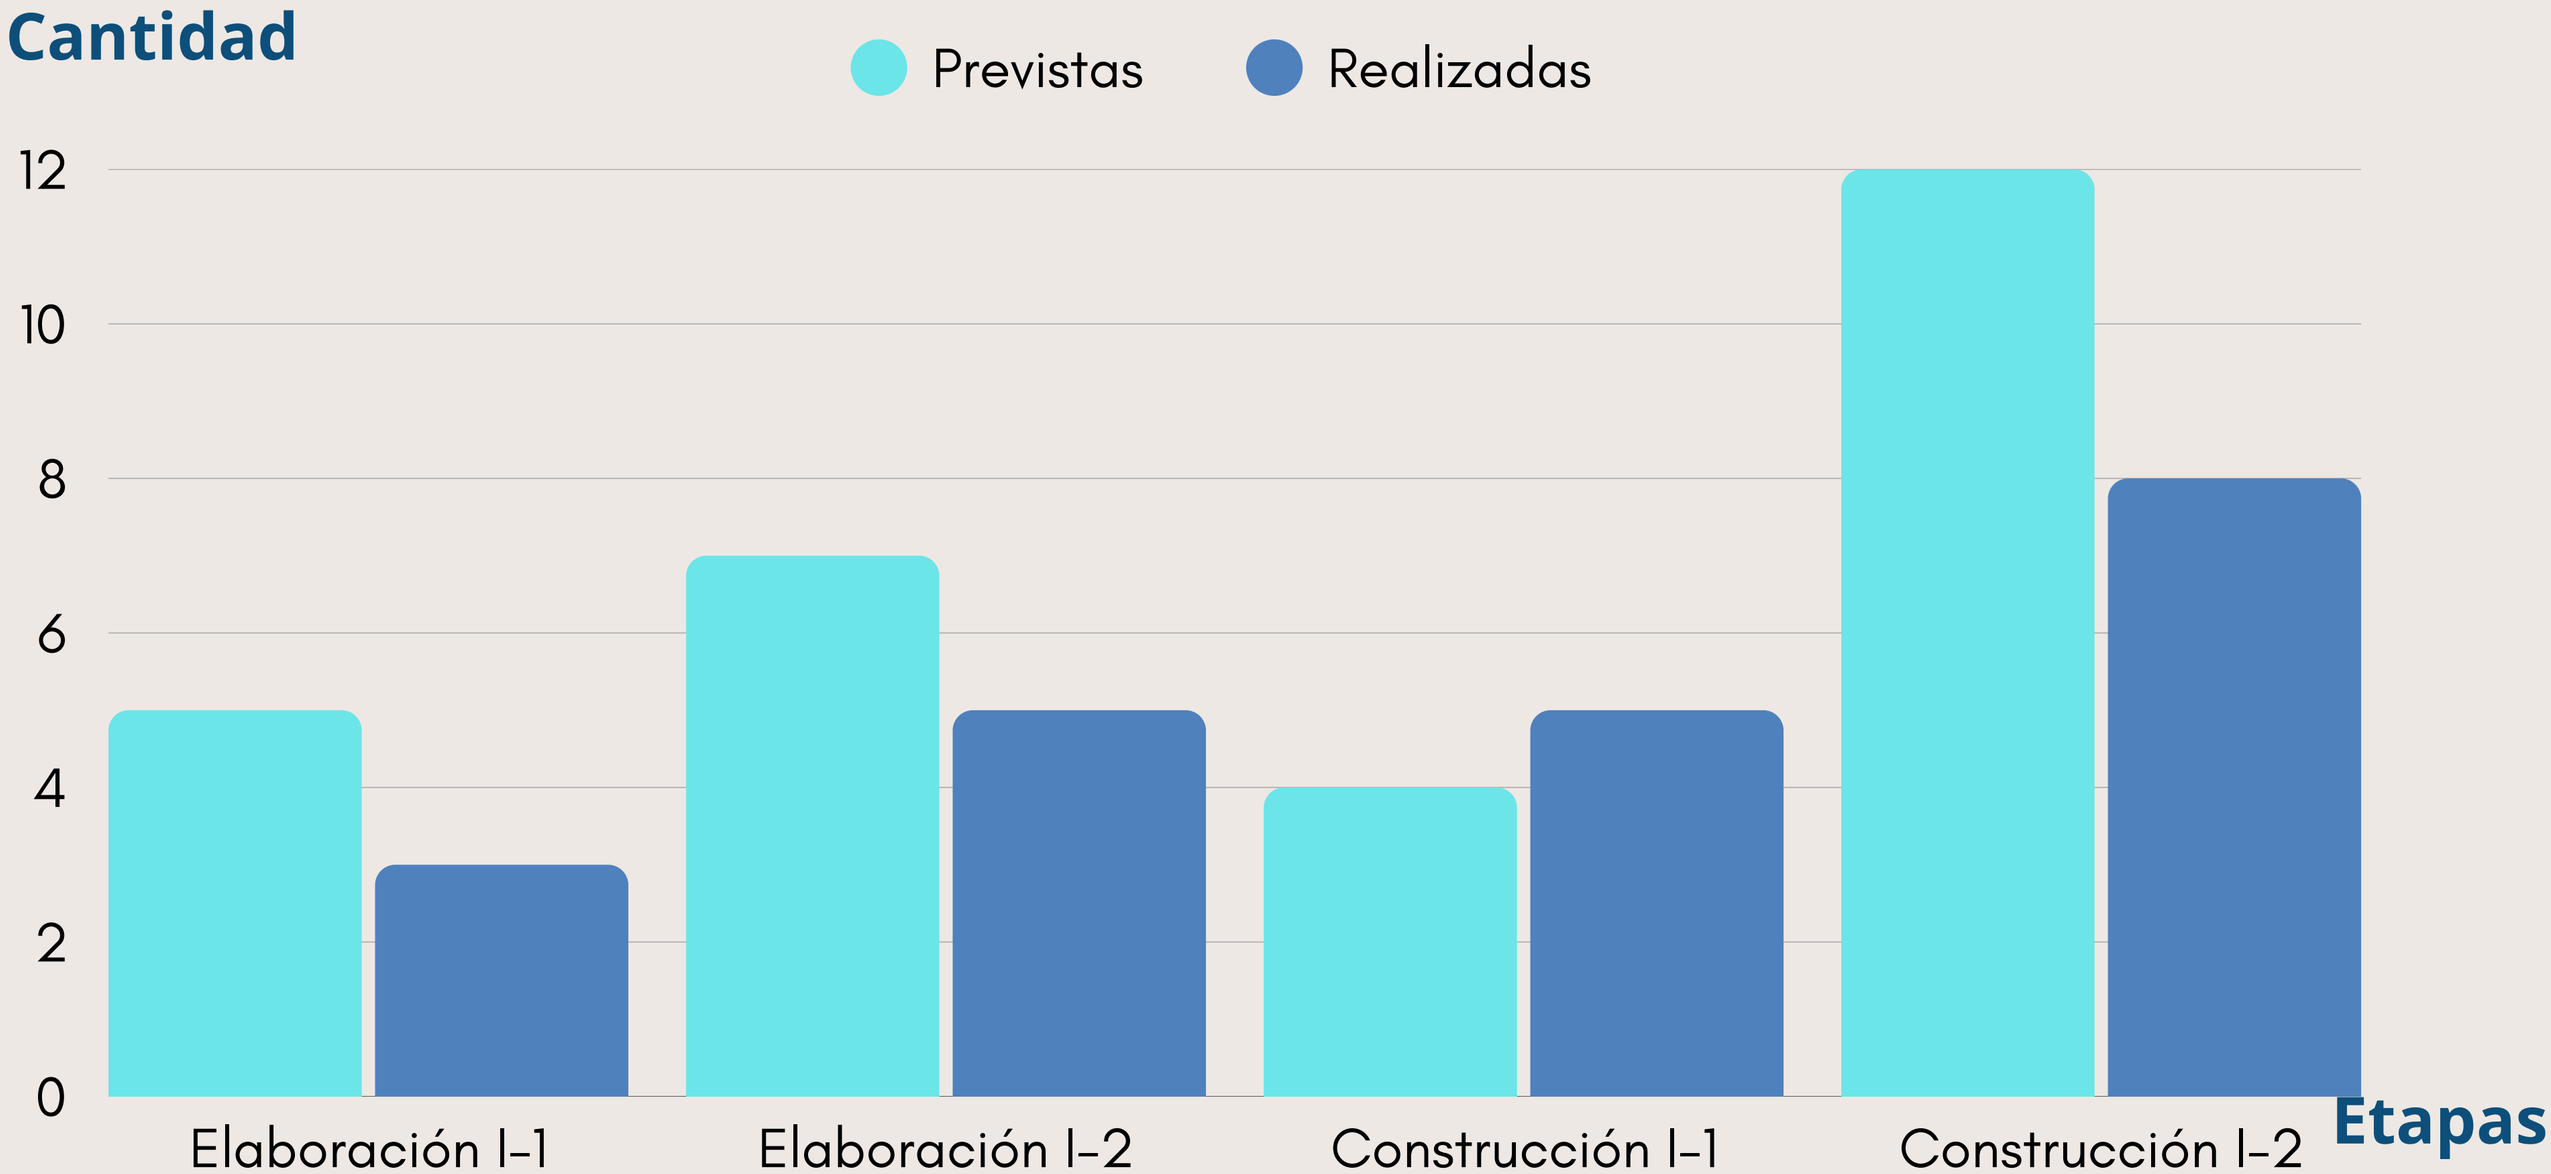


RTF POR ITERACIÓN

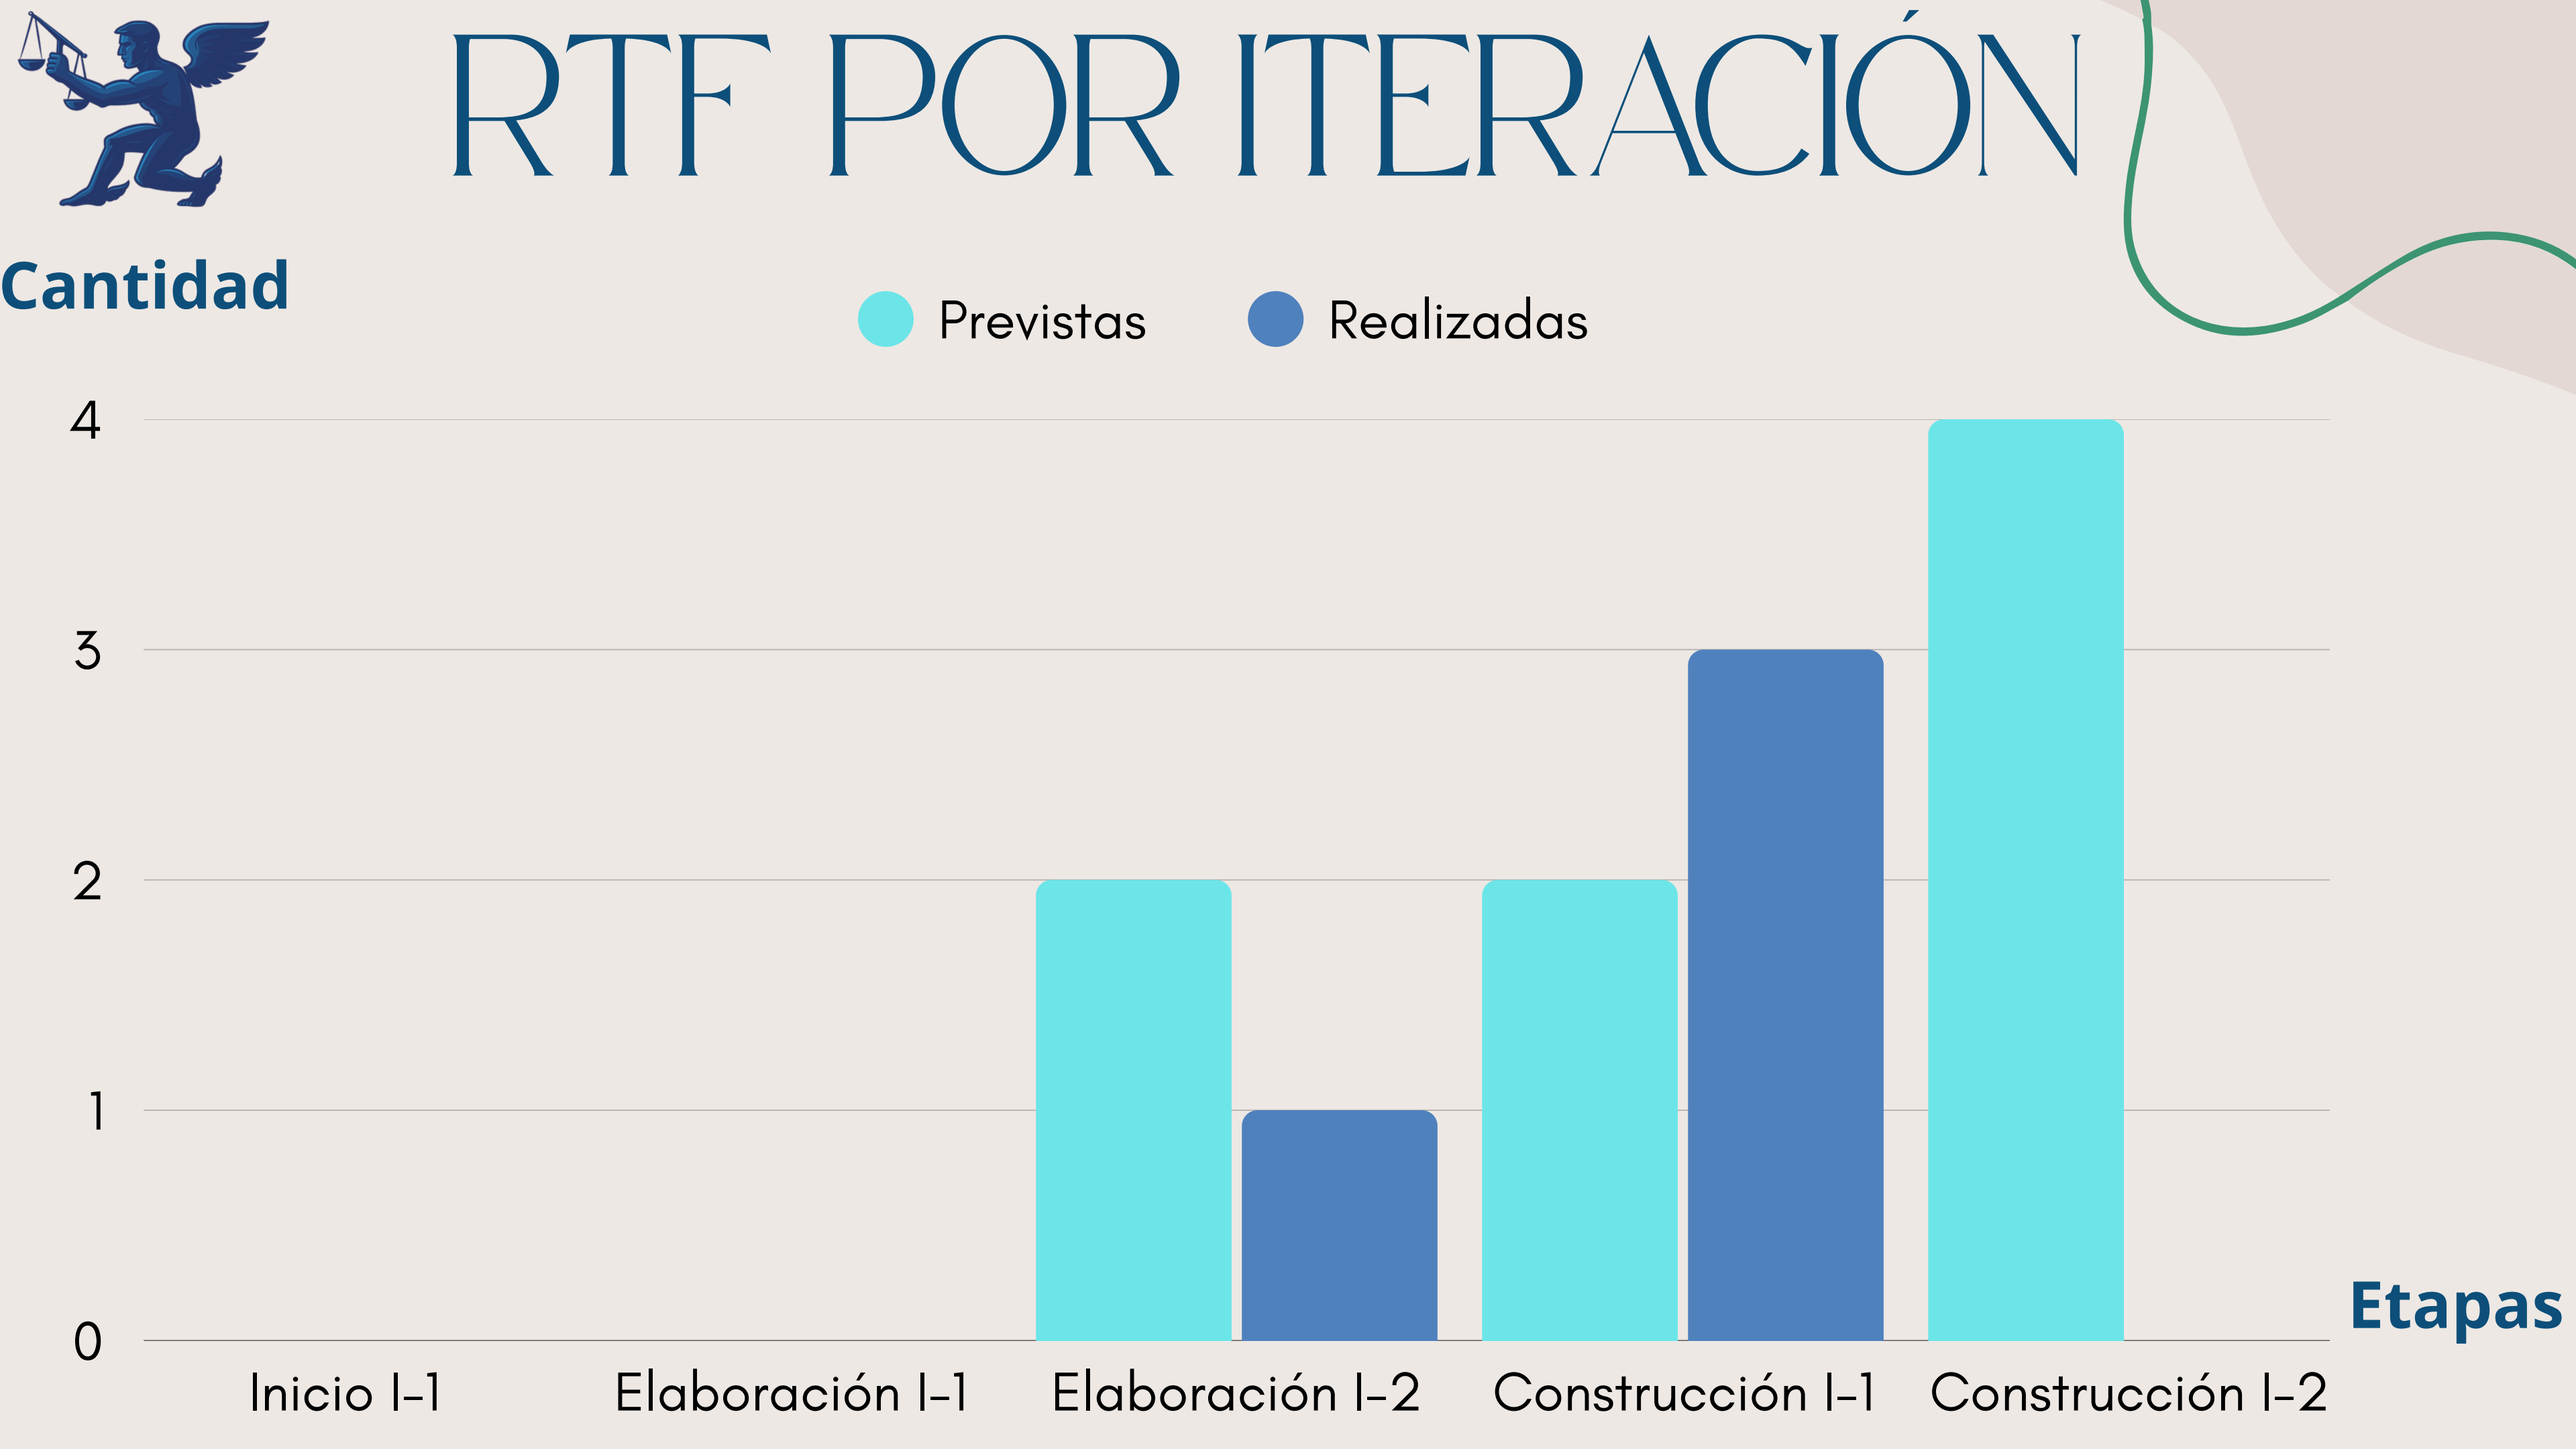

REUNIONES

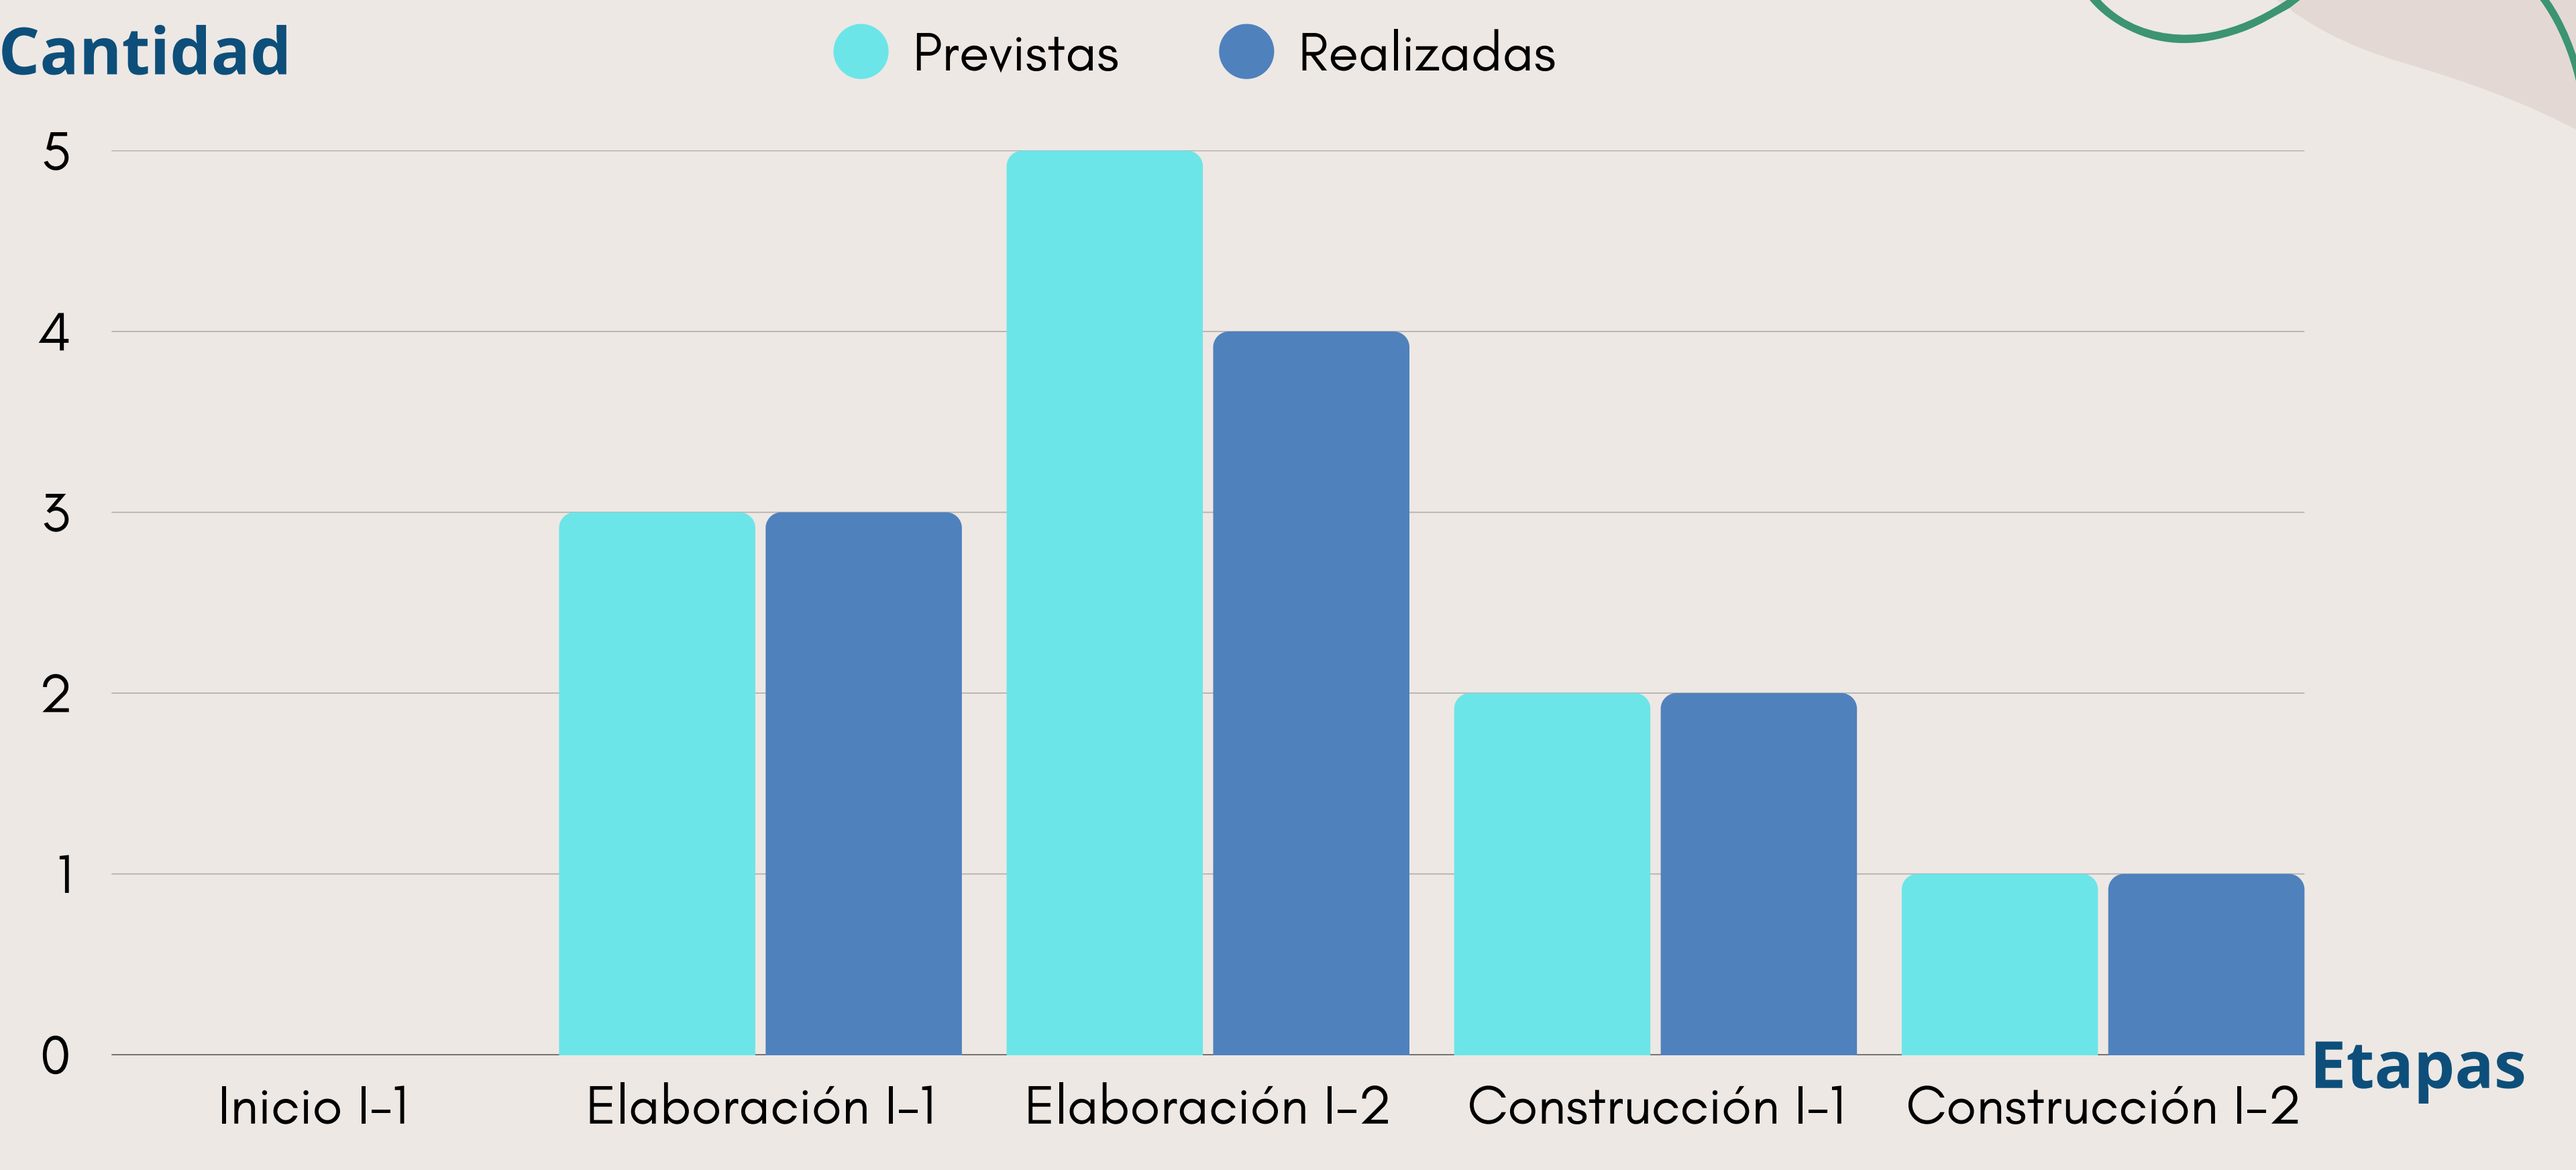
Cantidad
Previstas
Realizadas
5
4
3
2
1
0
Inicio I-1
Elaboración I-1
Elaboración I-2
Construcción I-1
Construcción I-2
Etapas

MÉTRICAS DE CALIDAD
PLANIFICADO (100%) VS EJECUTADO

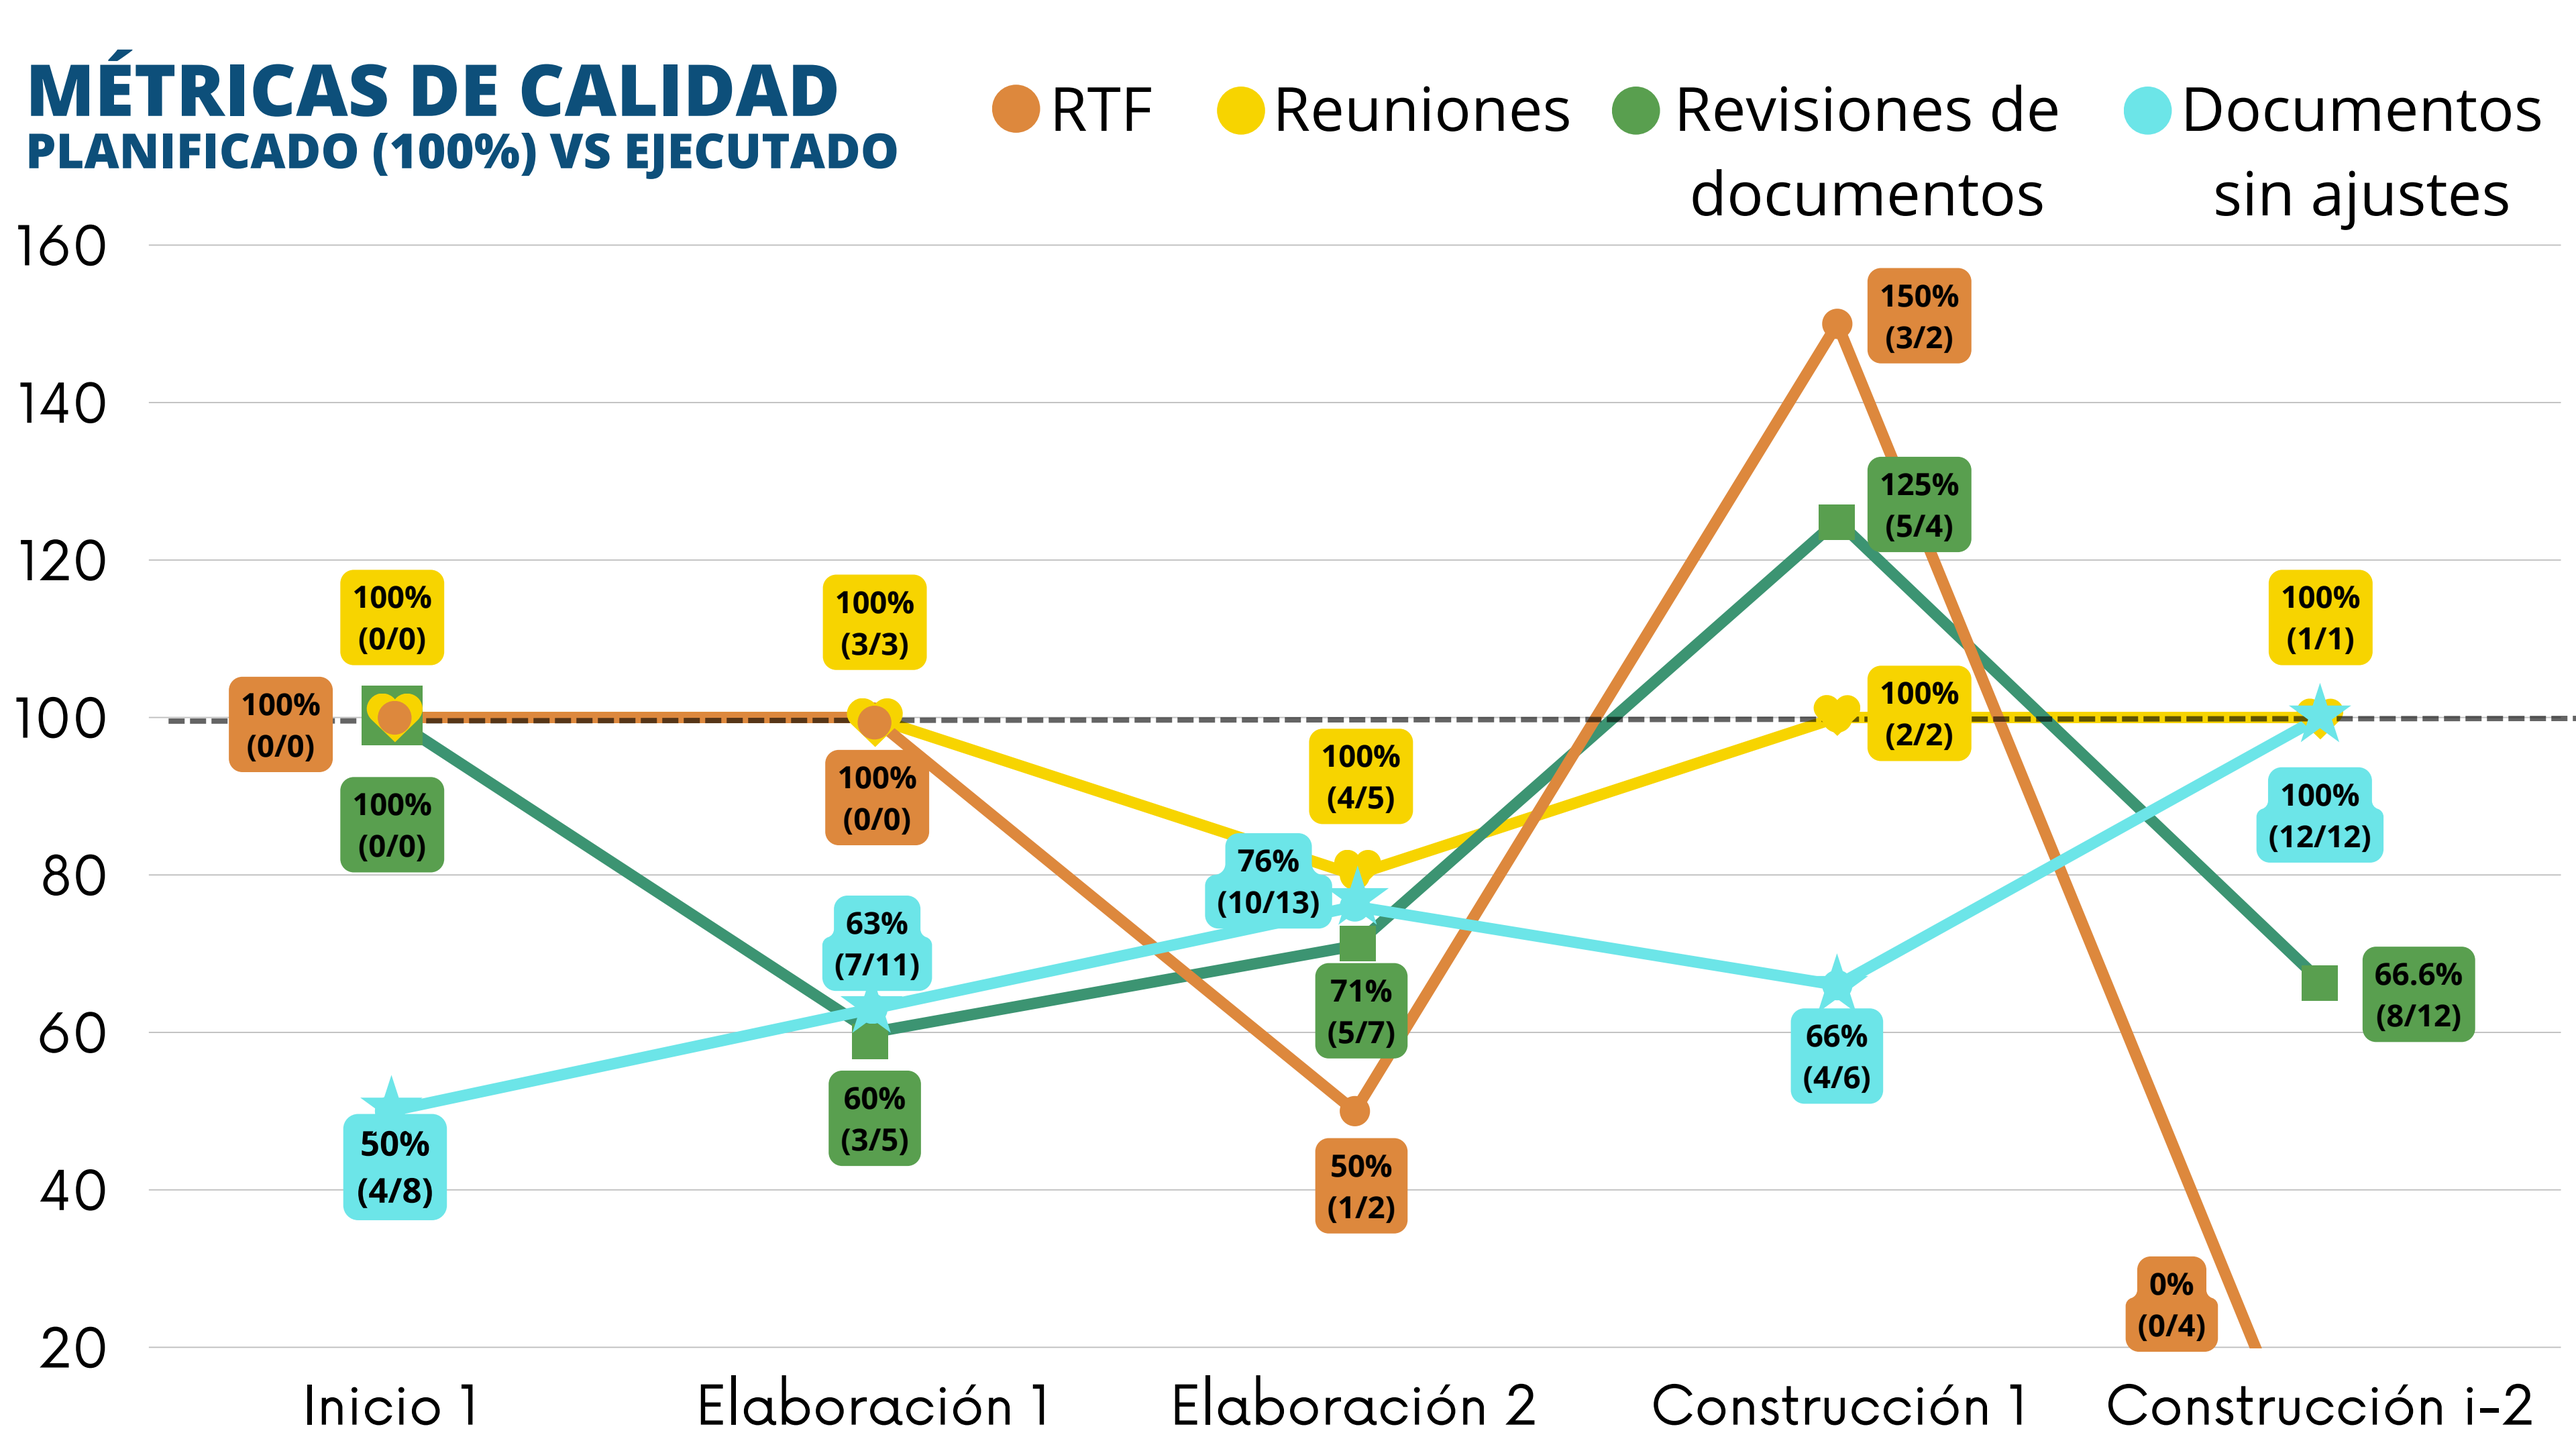




ESPECIFICACIÓN CU A IMPLEMENTAR


NEXTECH

ESPECIFICACIÓN CU07: CREAR ETAPA

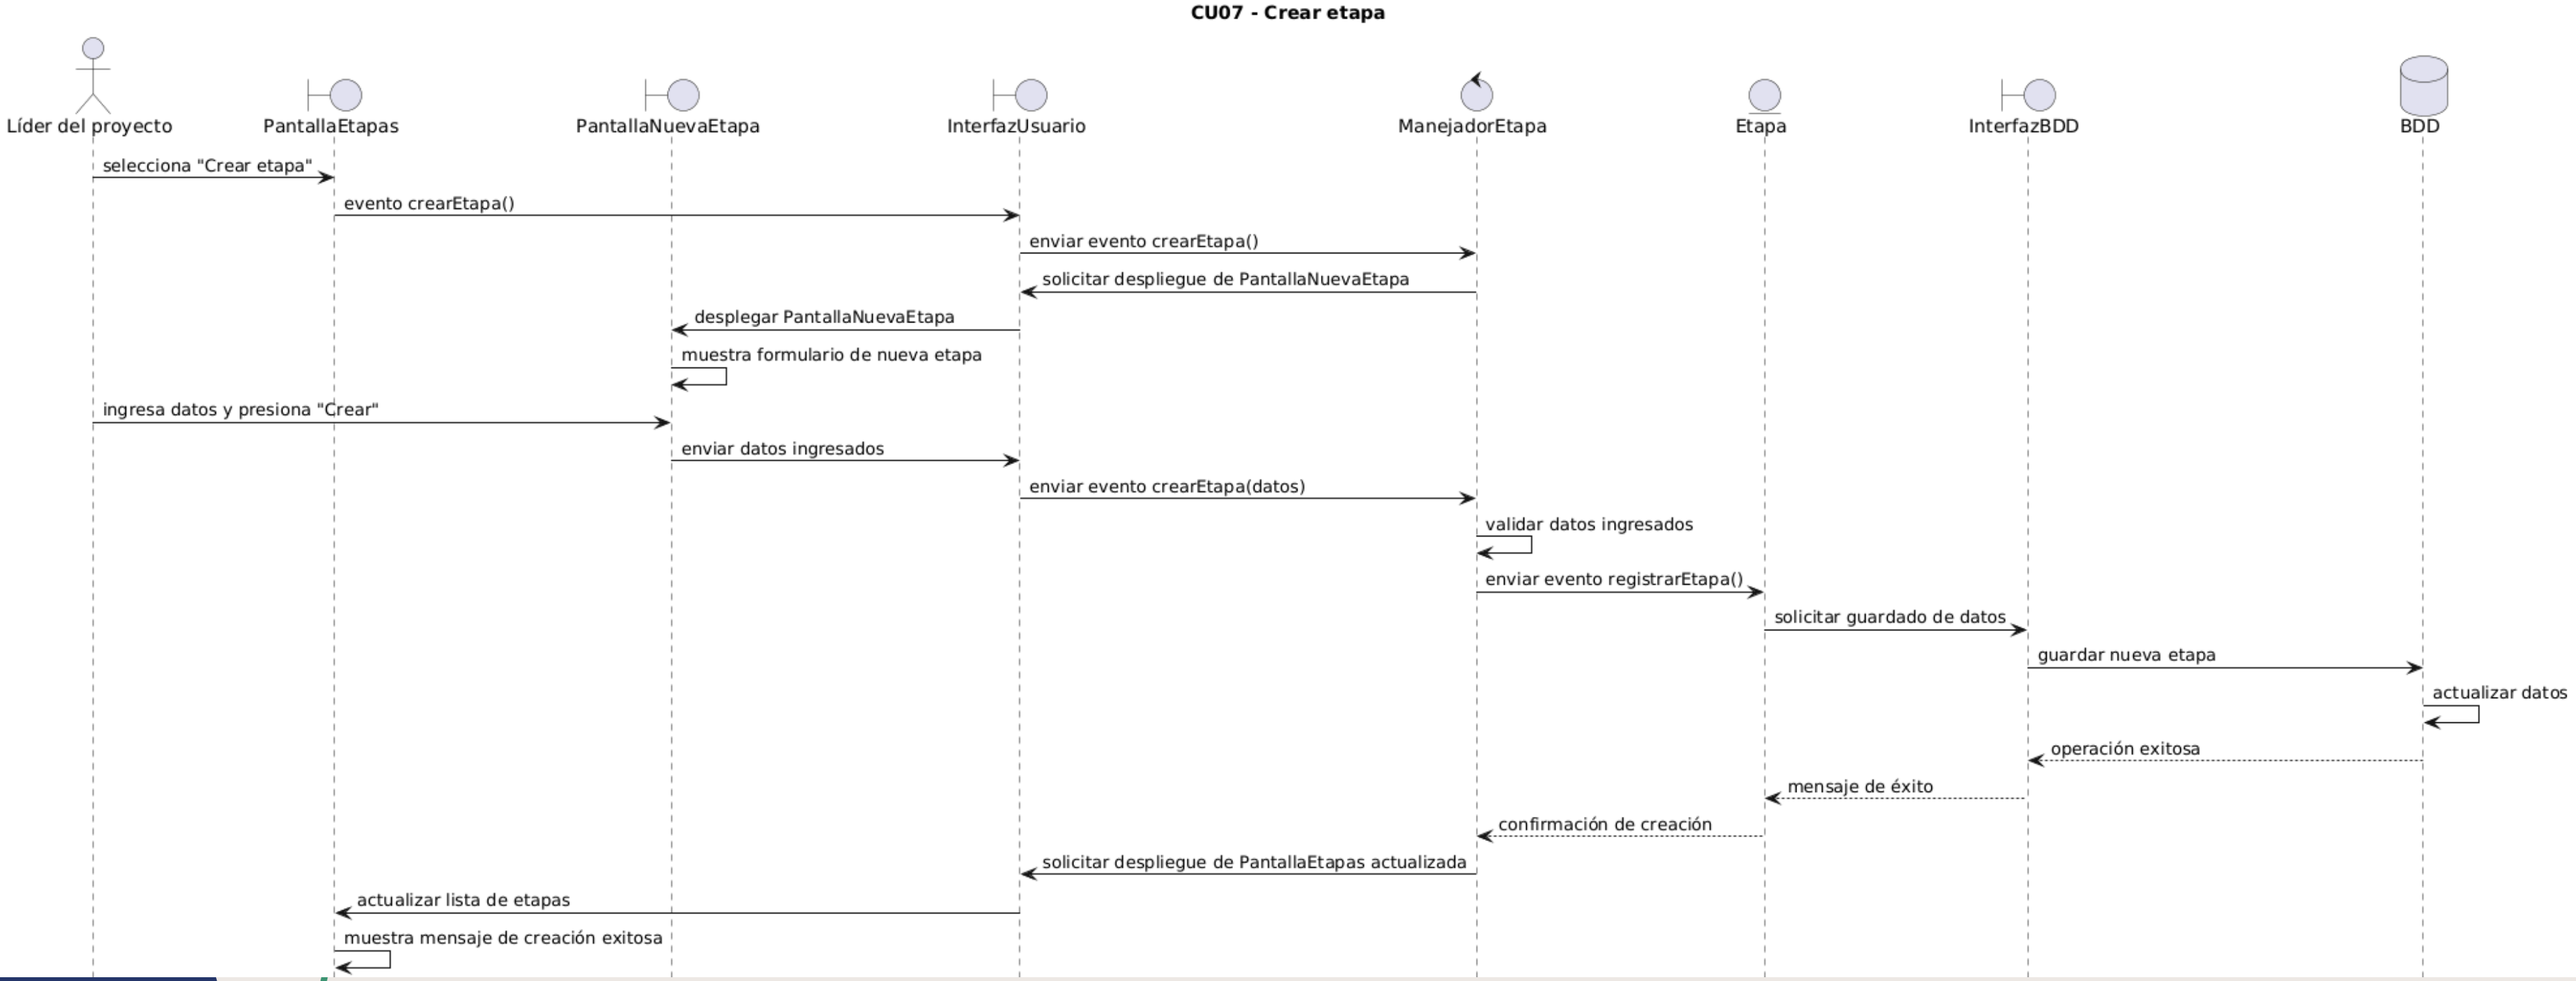


NEXTECH

ESPECIFICACIÓN CU07: CREAR ETAPA

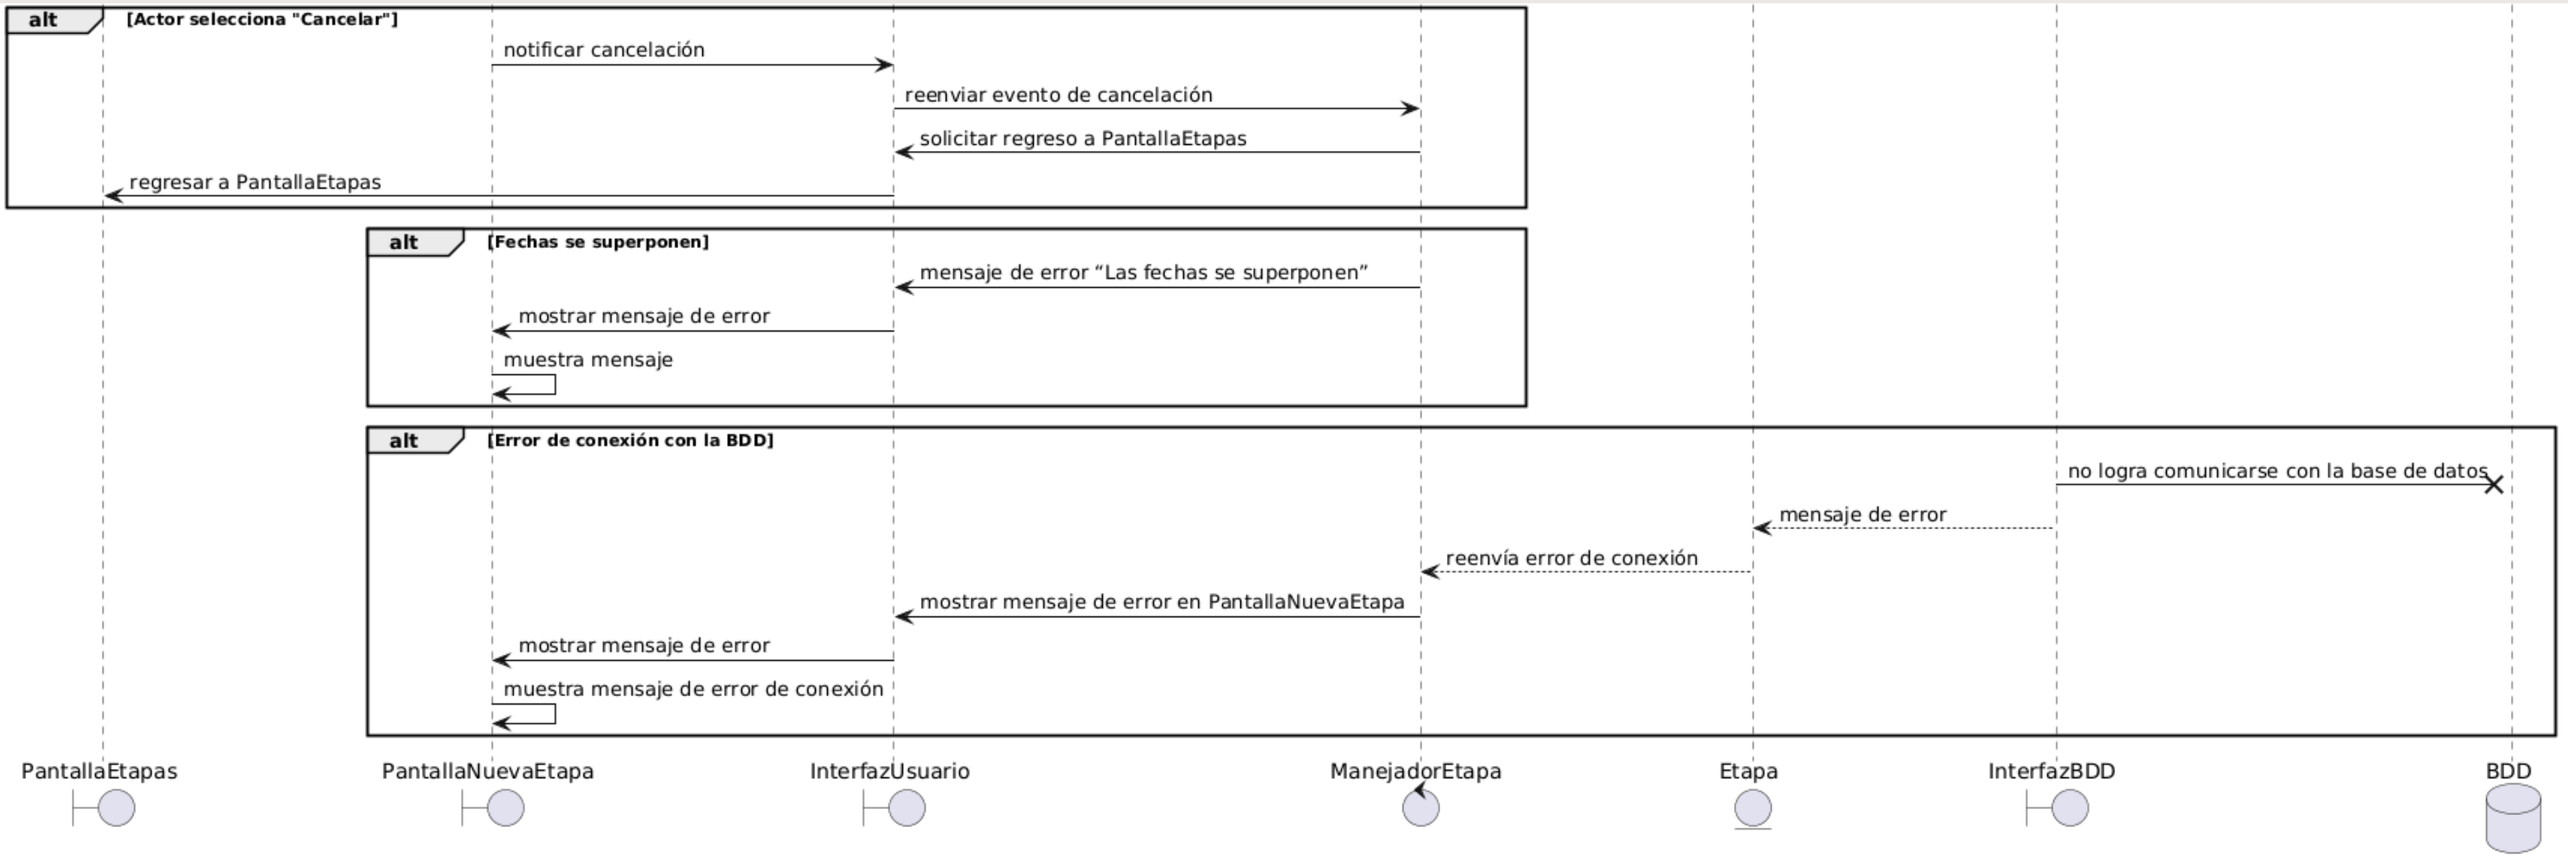


NEXTECH

ESPECIFICACIÓN CU08: CREAR ITERACIÓN

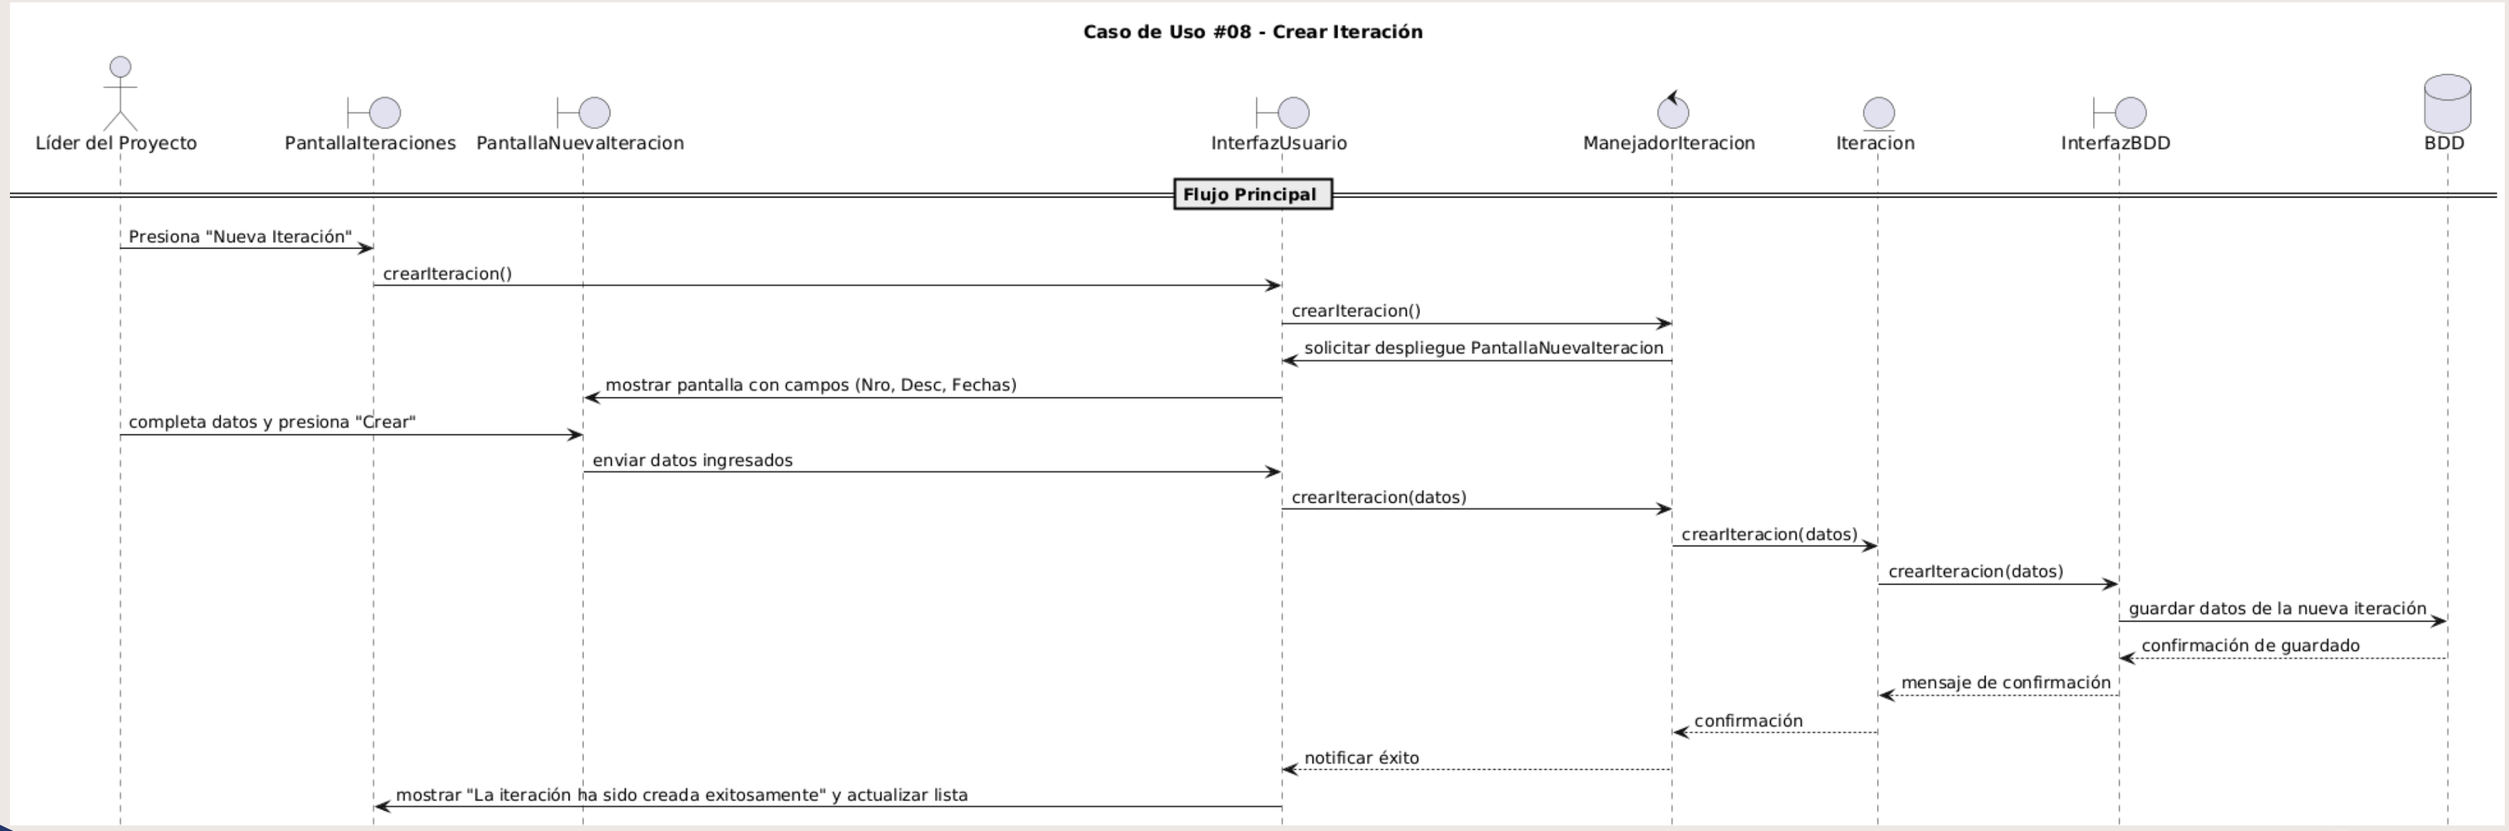


NEXTECH


ESPECIFICACIÓN CU08: CREAR ITERACIÓN

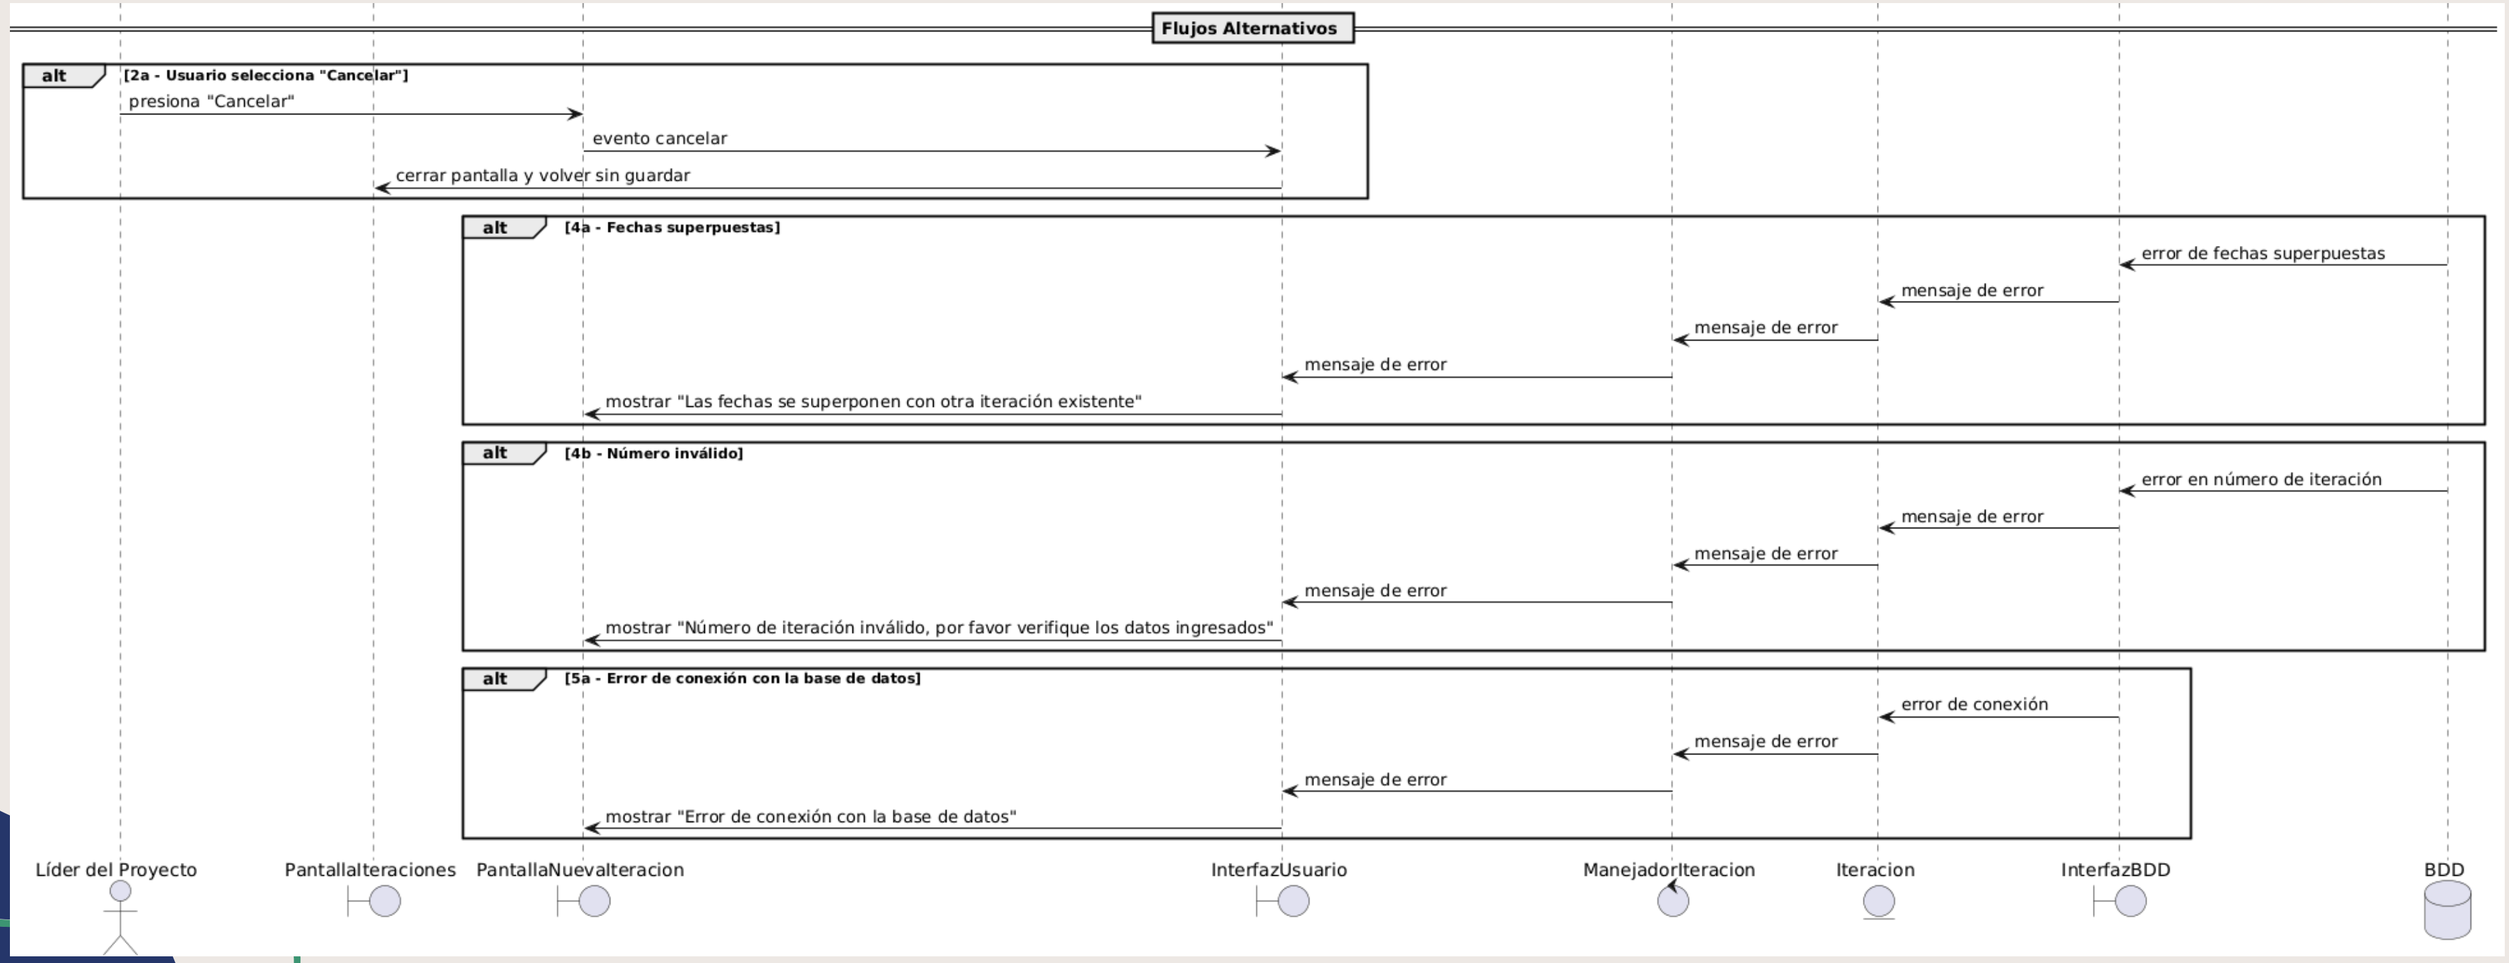

ESPECIFICACIÓN CU13: ASIGNAR DEPENDENCIA

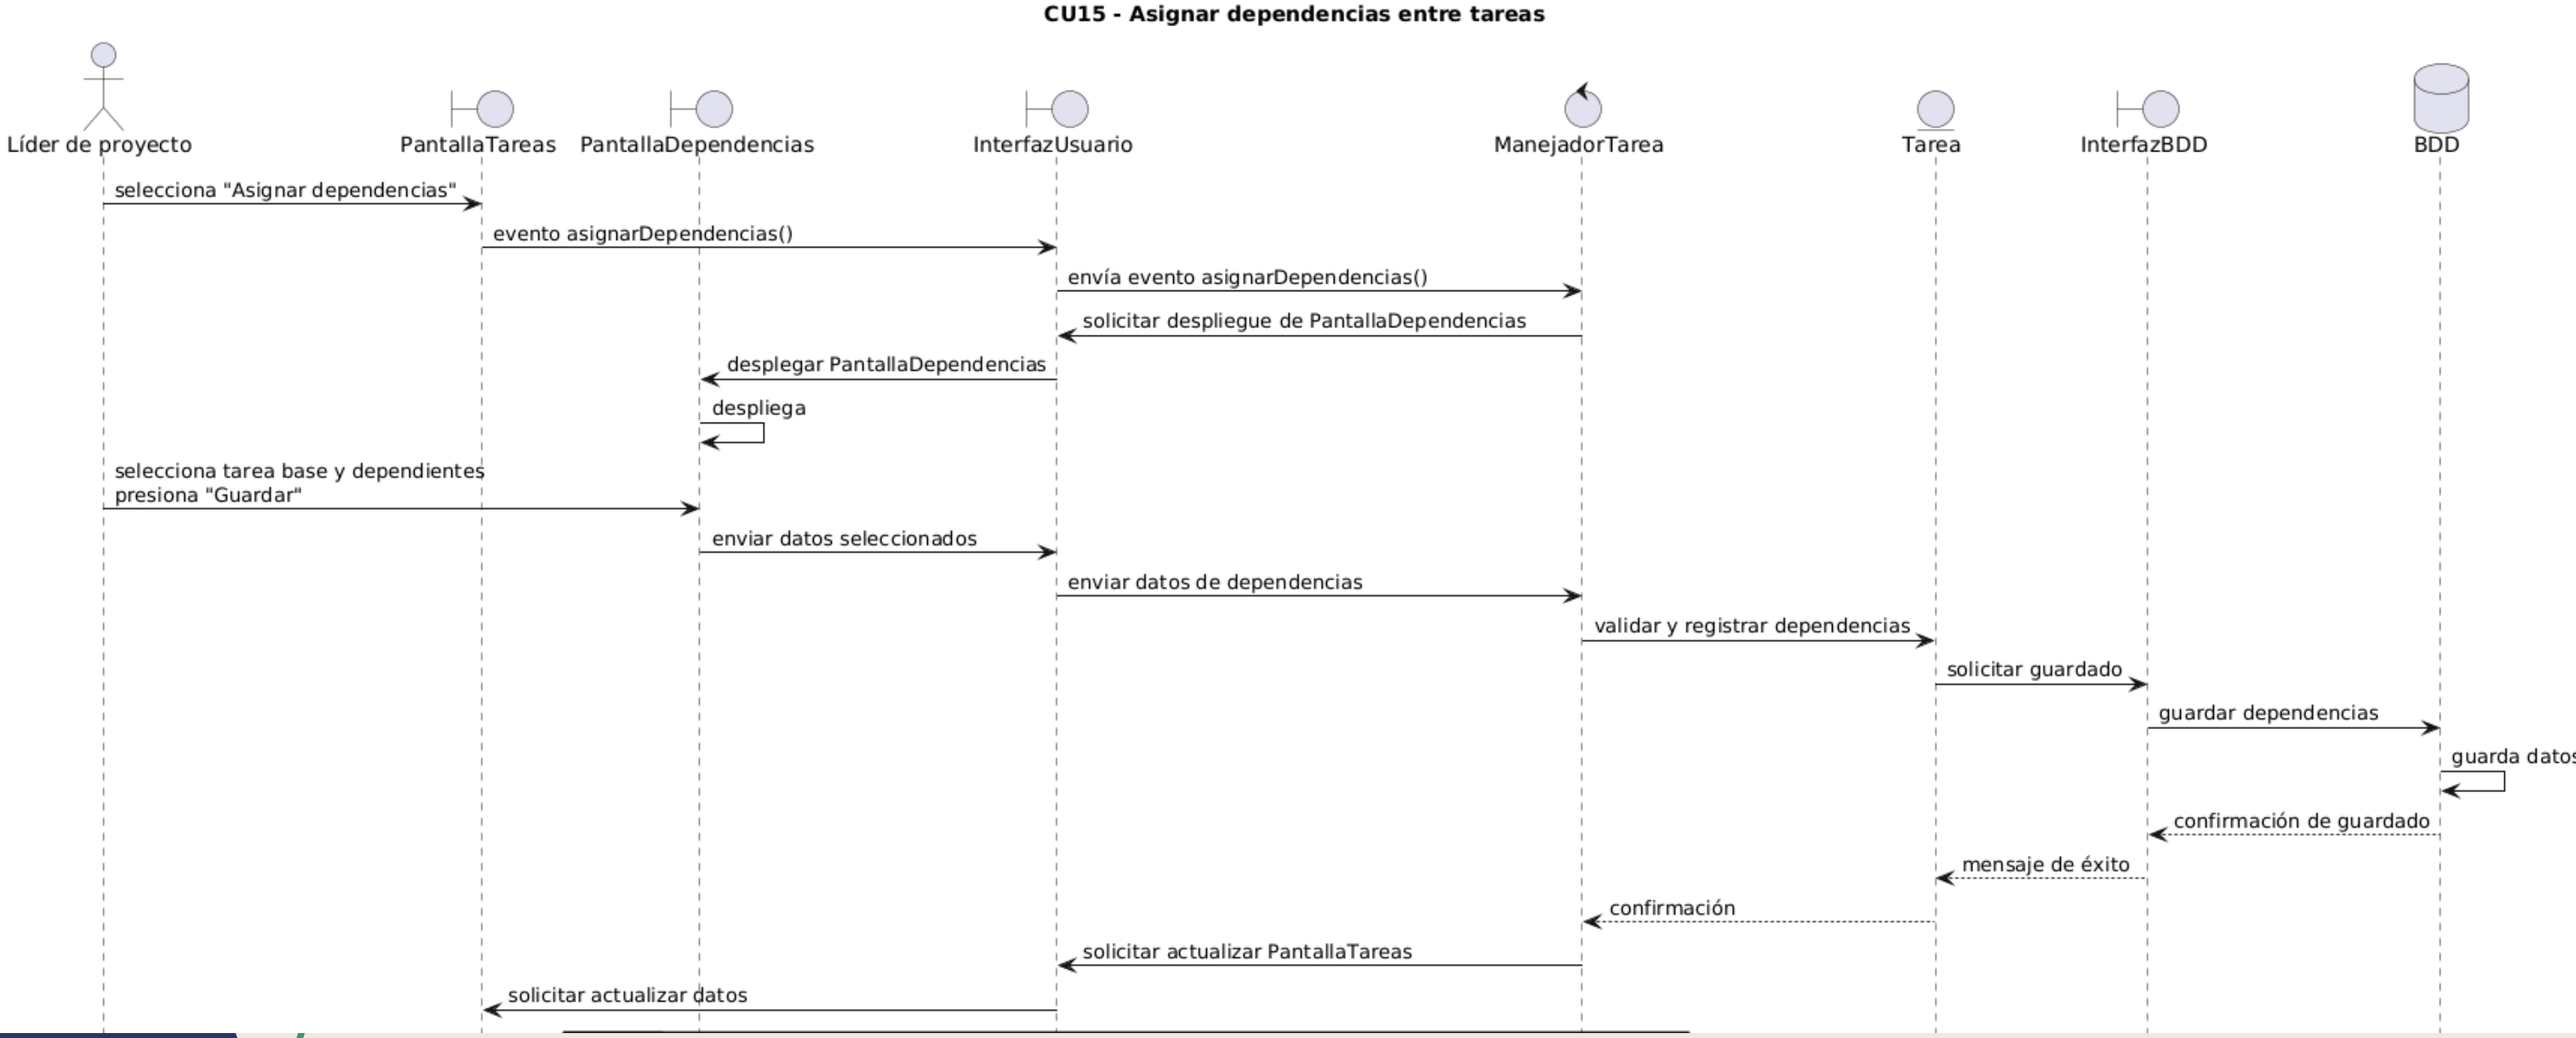


ESPECIFICACIÓN CU13: ASIGNAR DEPENDENCIA

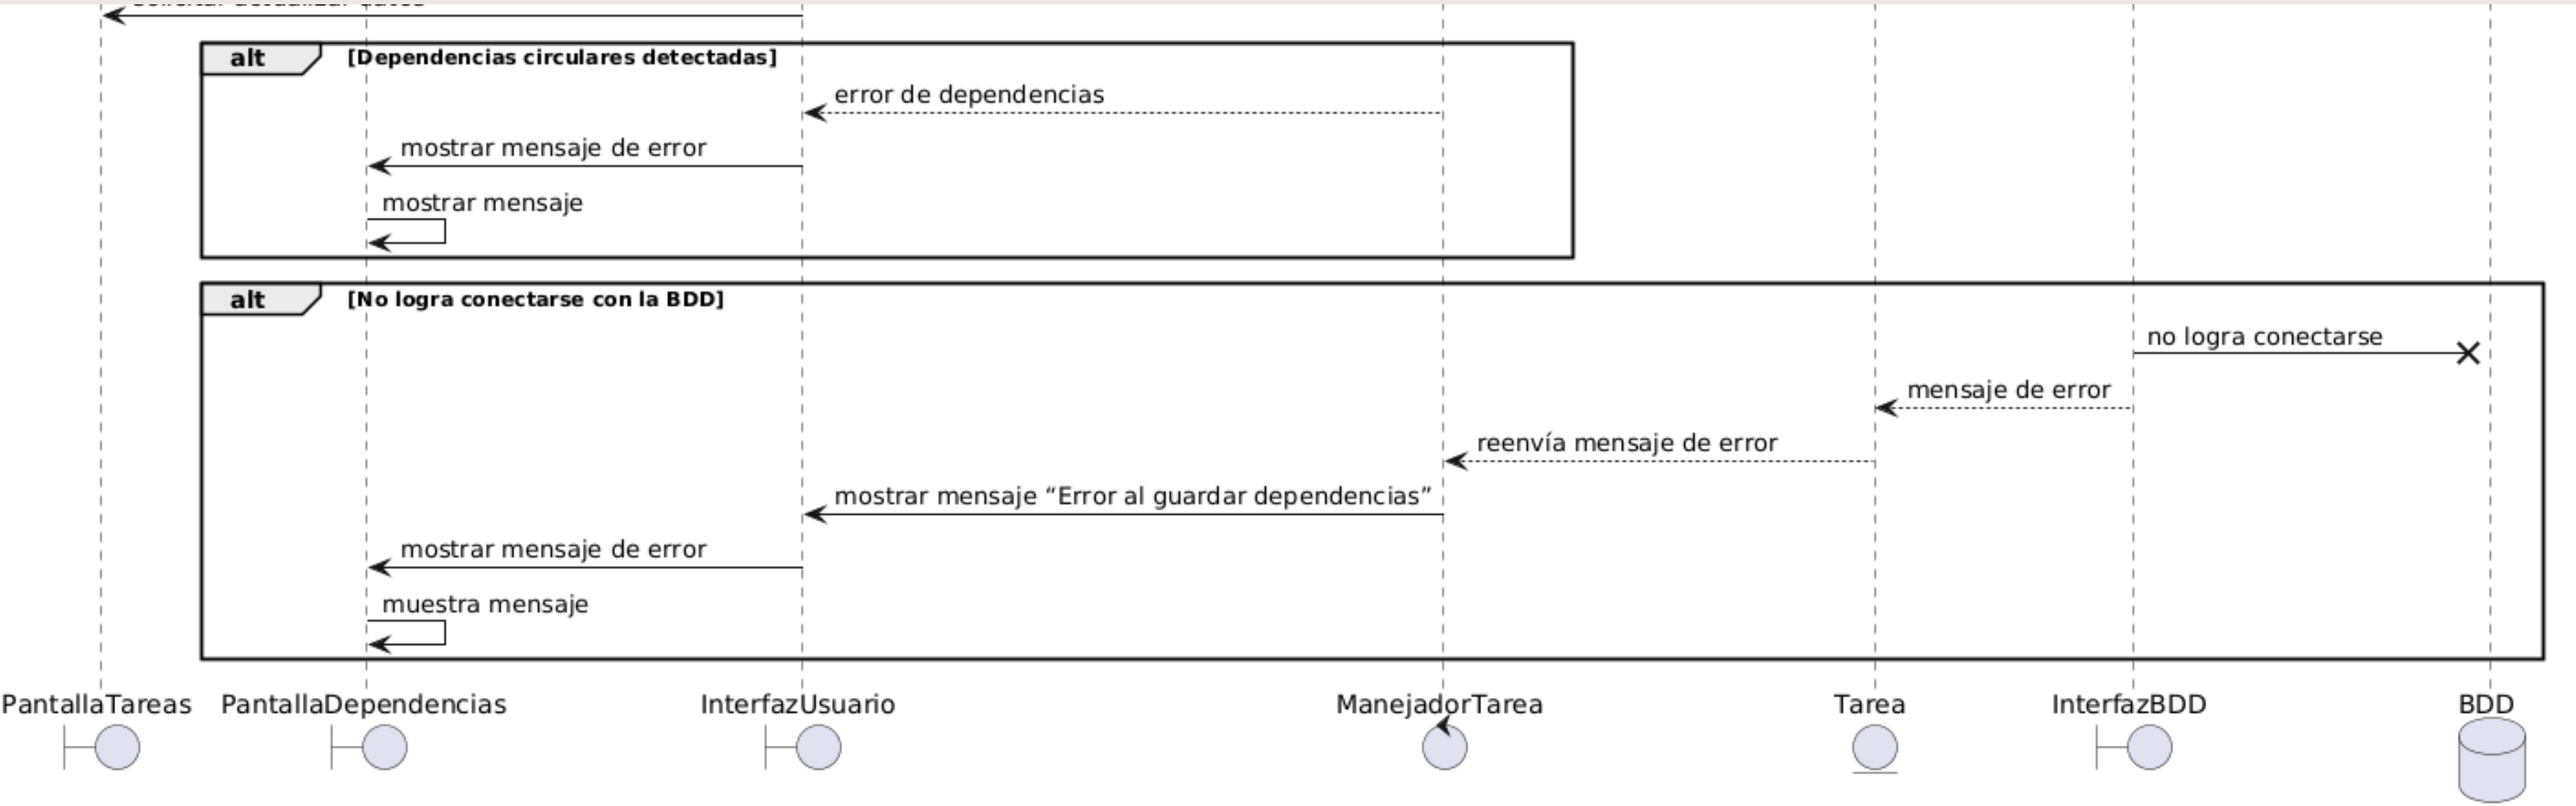


NEXTECH

ESPECIFICACIÓN CU14: MODIFICAR ESTADO DE TAREA

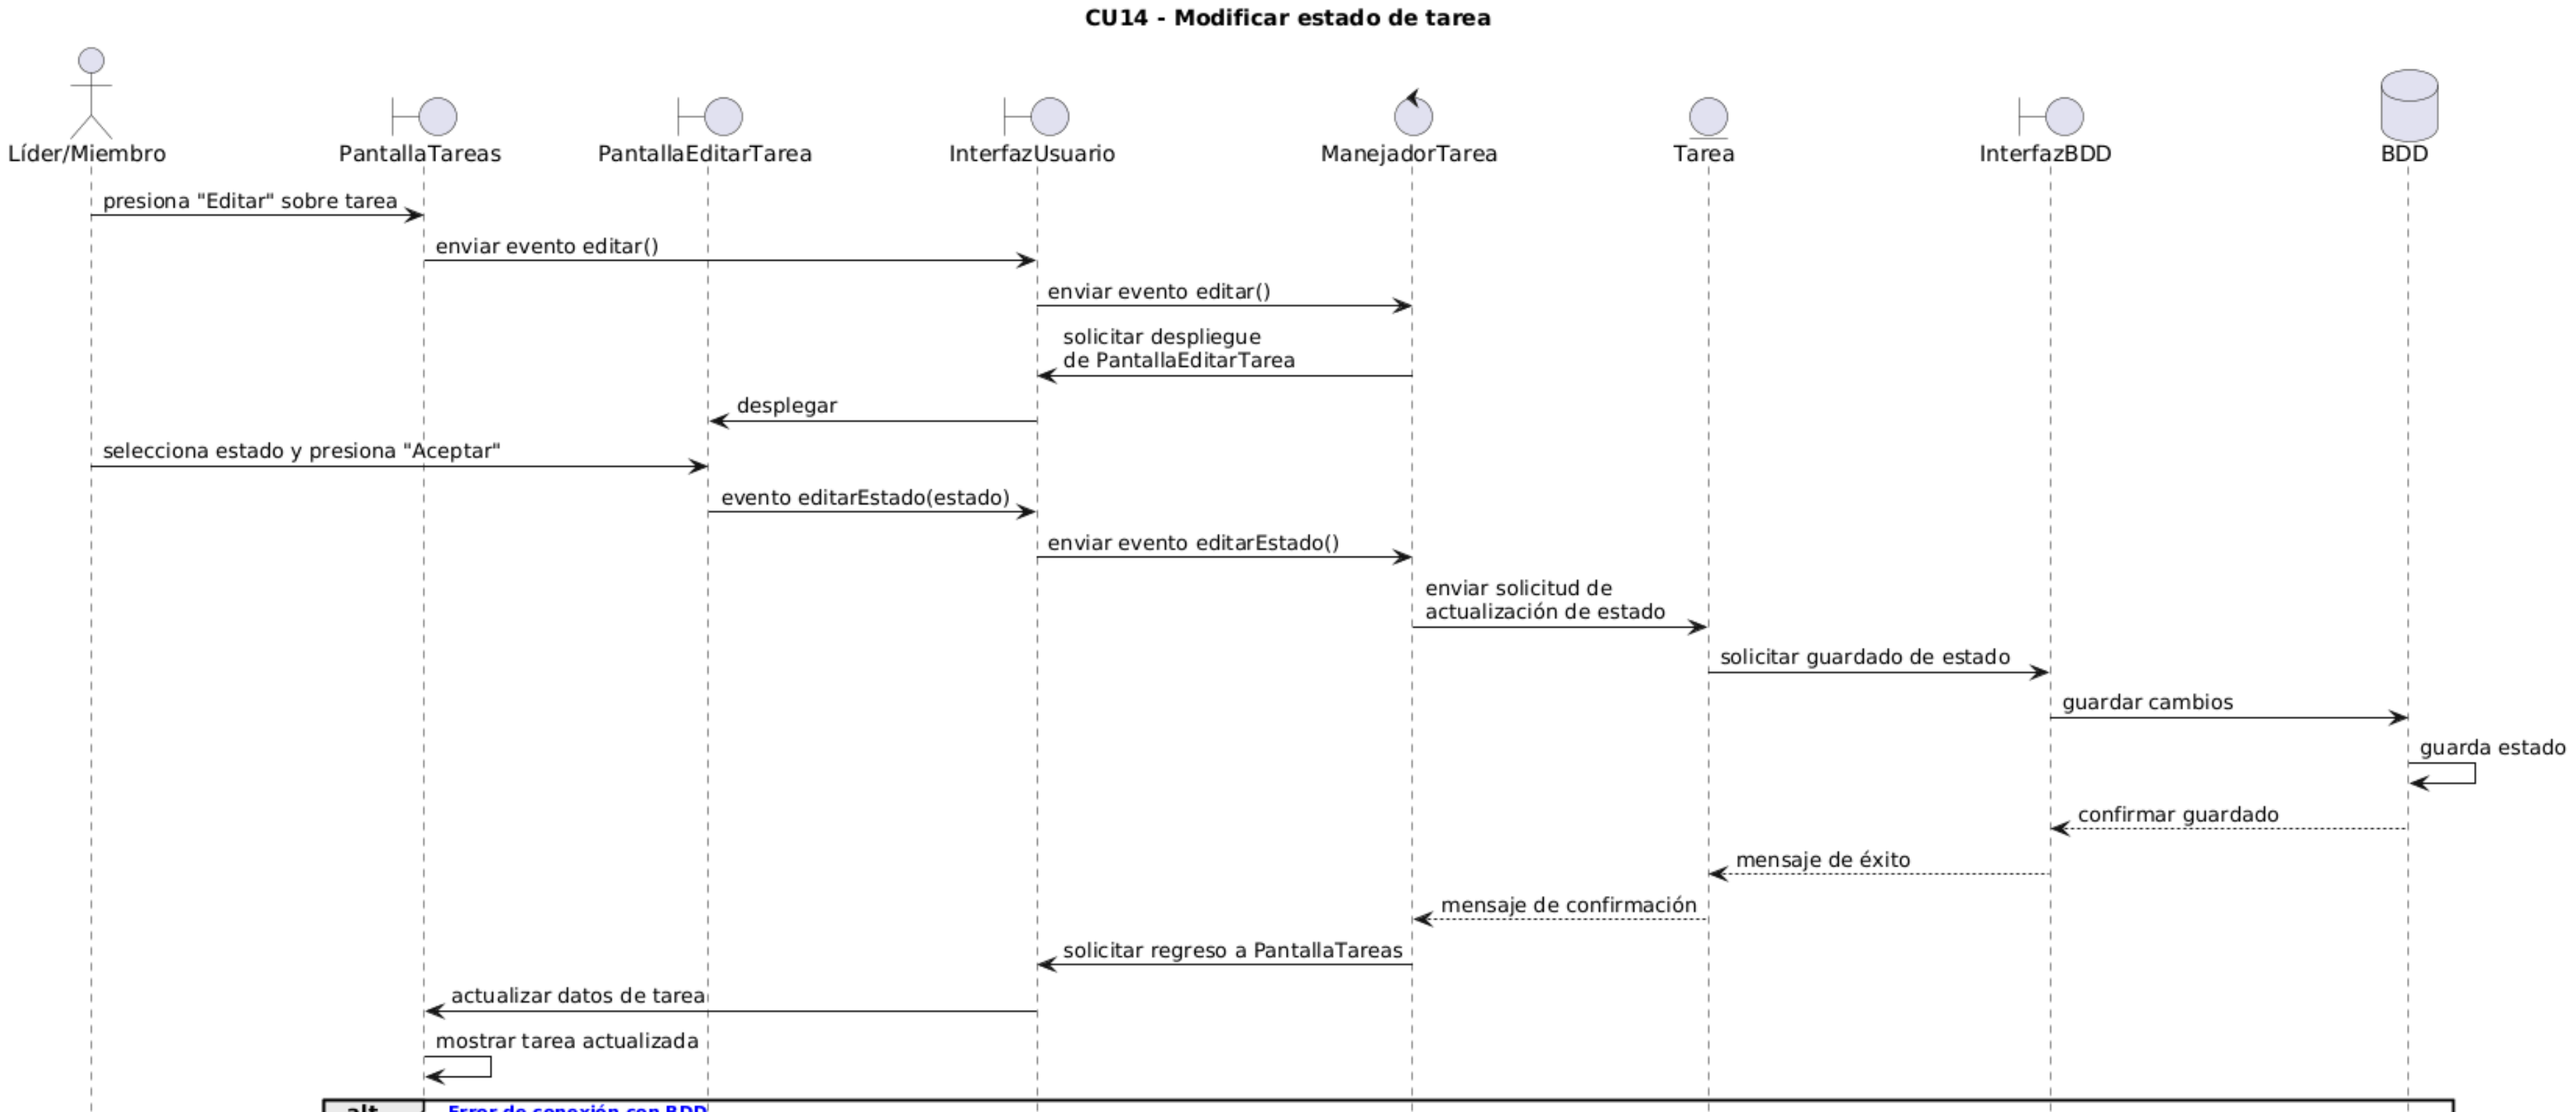


ESPECIFICACIÓN CU14: MODIFICAR ESTADO DE TAREA

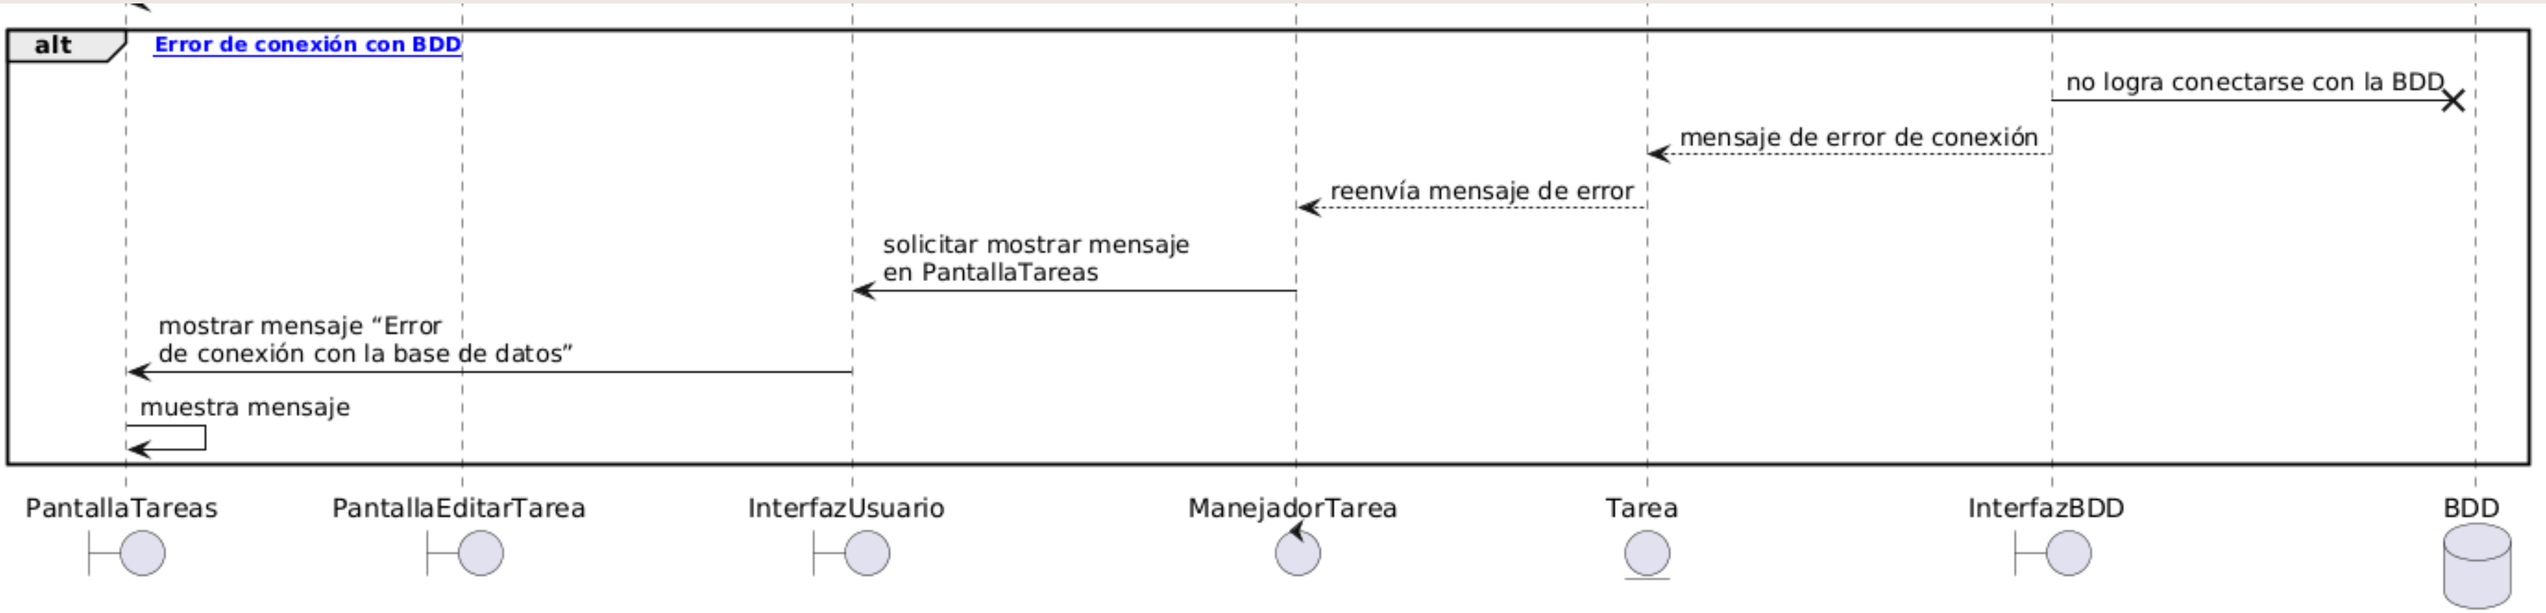


NEXTECH

ESPECIFICACIÓN CU15: VISUALIZAR TAREA

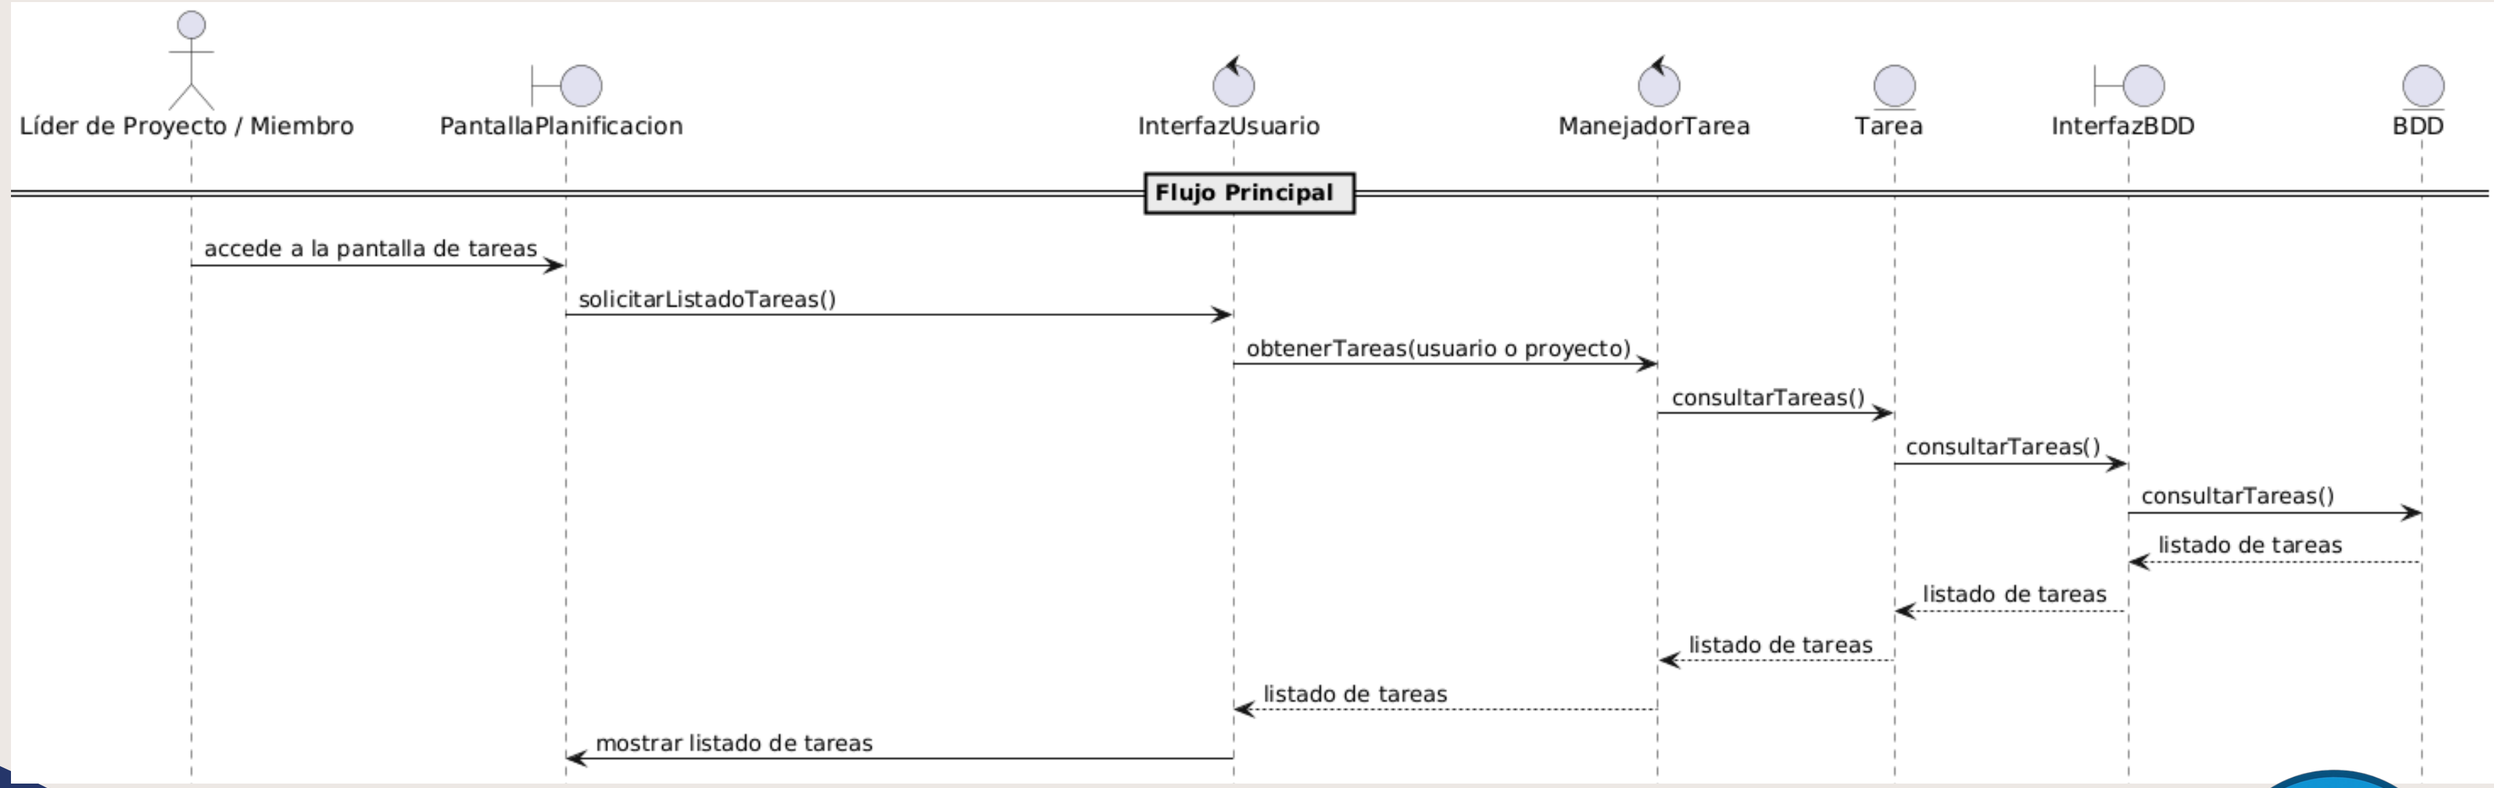


NEXTECH

ESPECIFICACIÓN CU15: VISUALIZAR TAREA

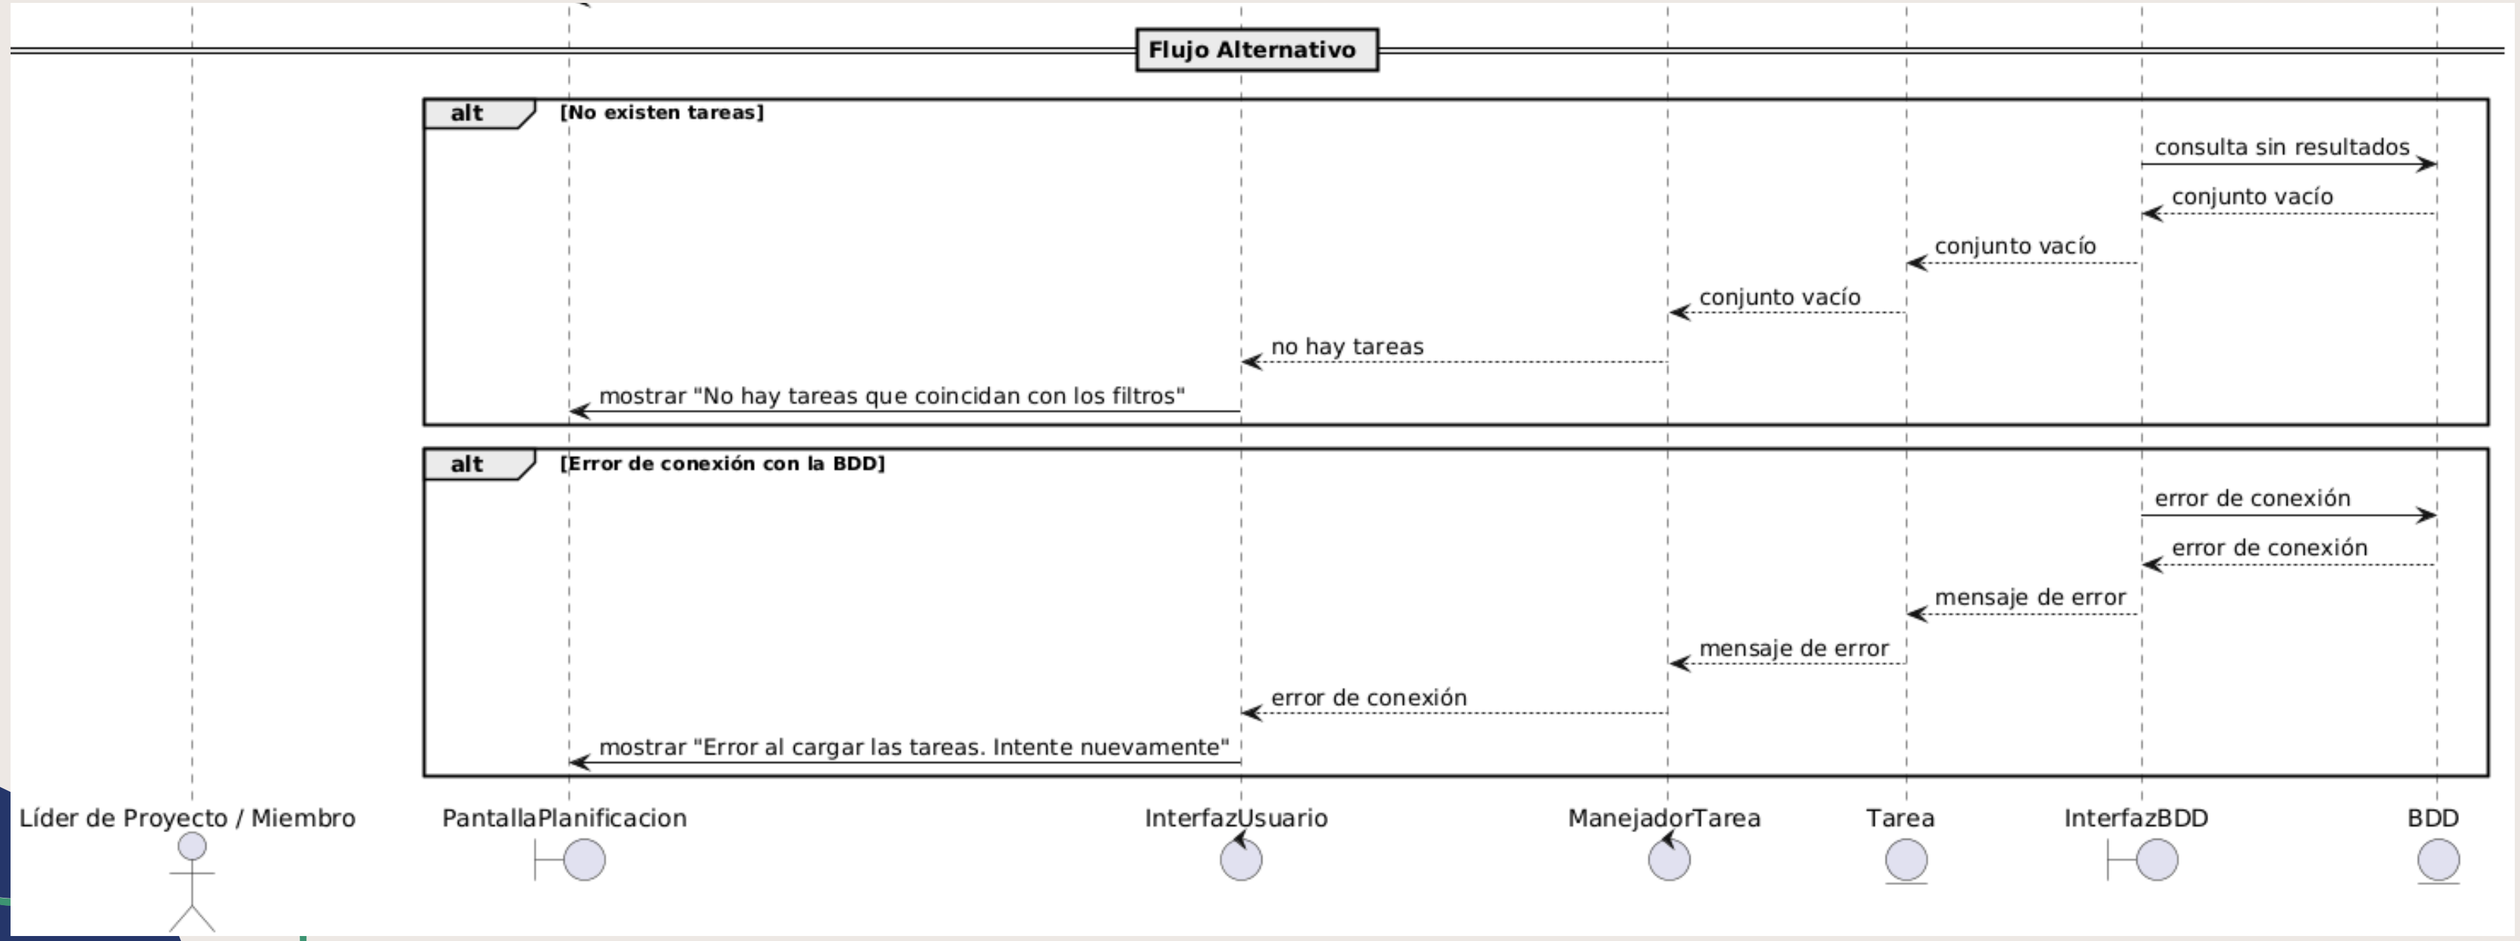


ESPECIFICACIÓN CU16: COMENTAR TAREA

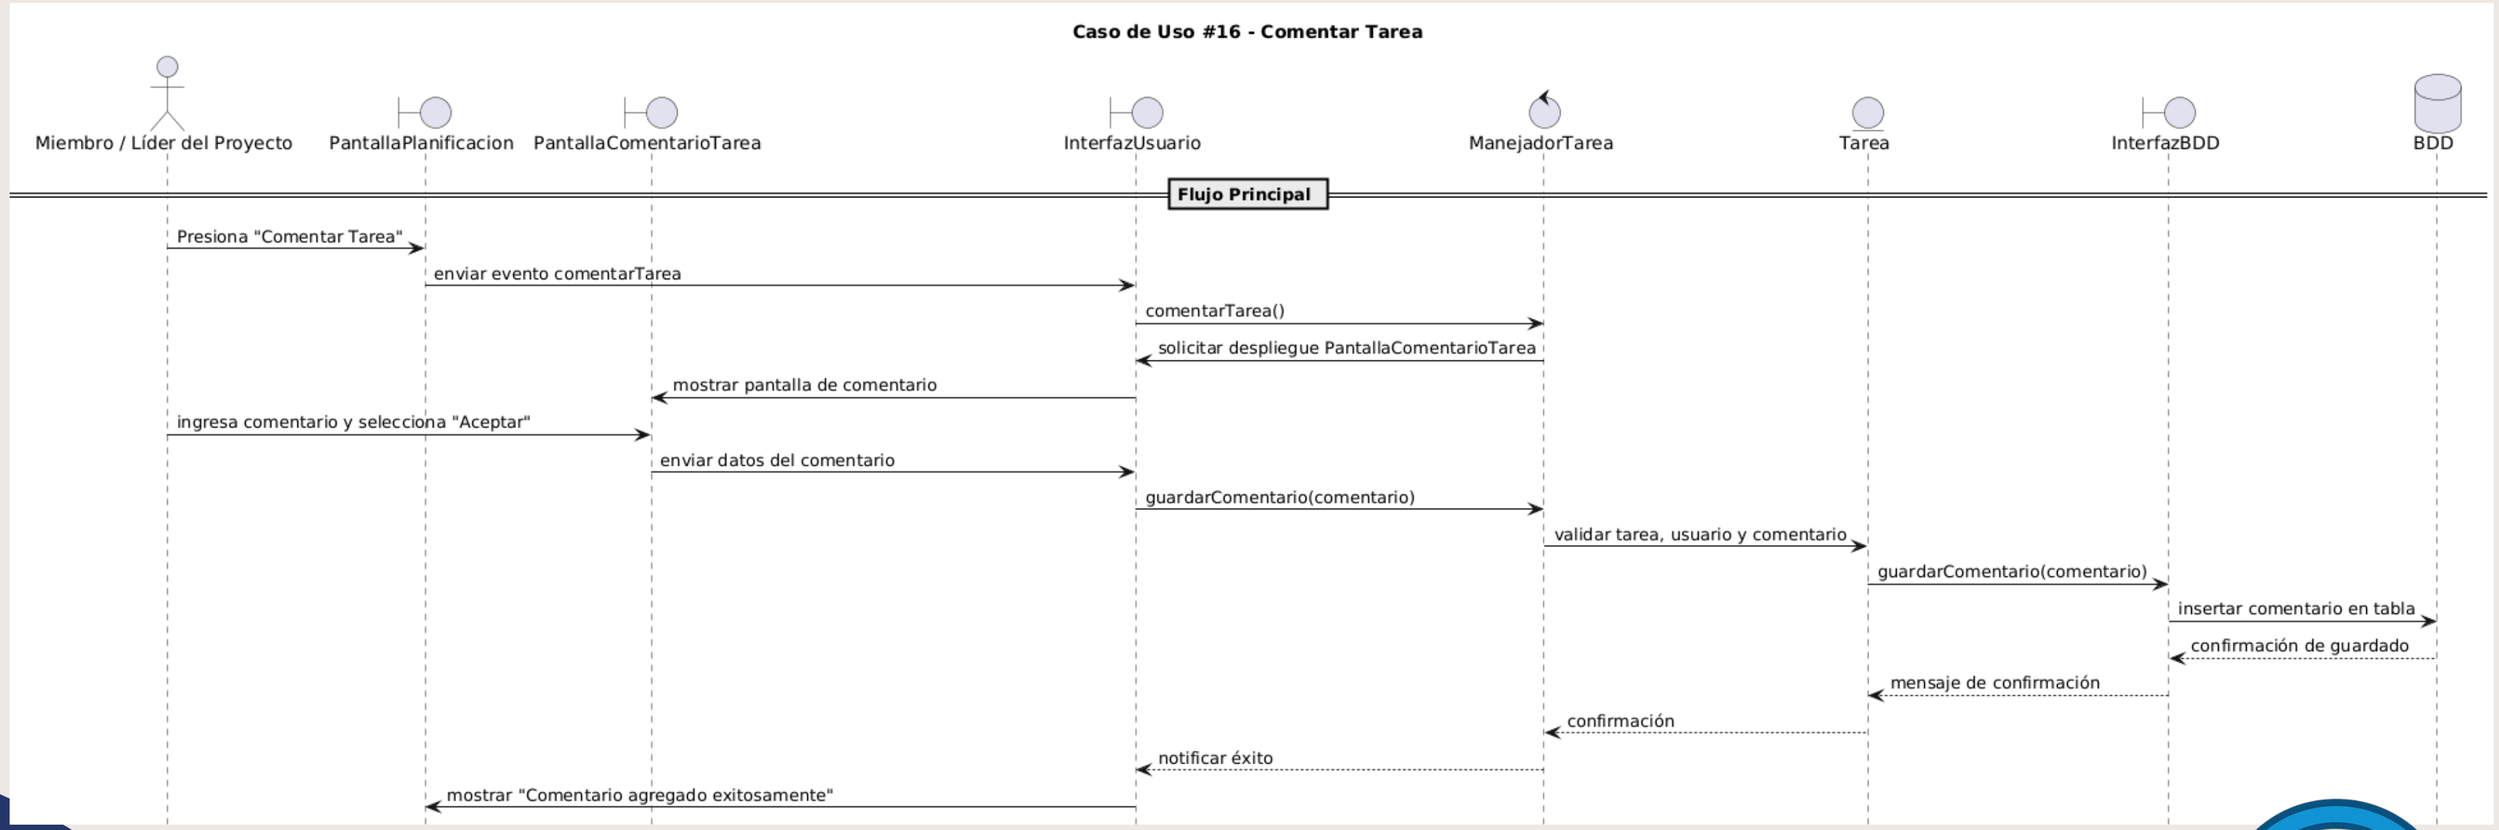


NEXTECH

ESPECIFICACIÓN CU16: COMENTAR TAREA

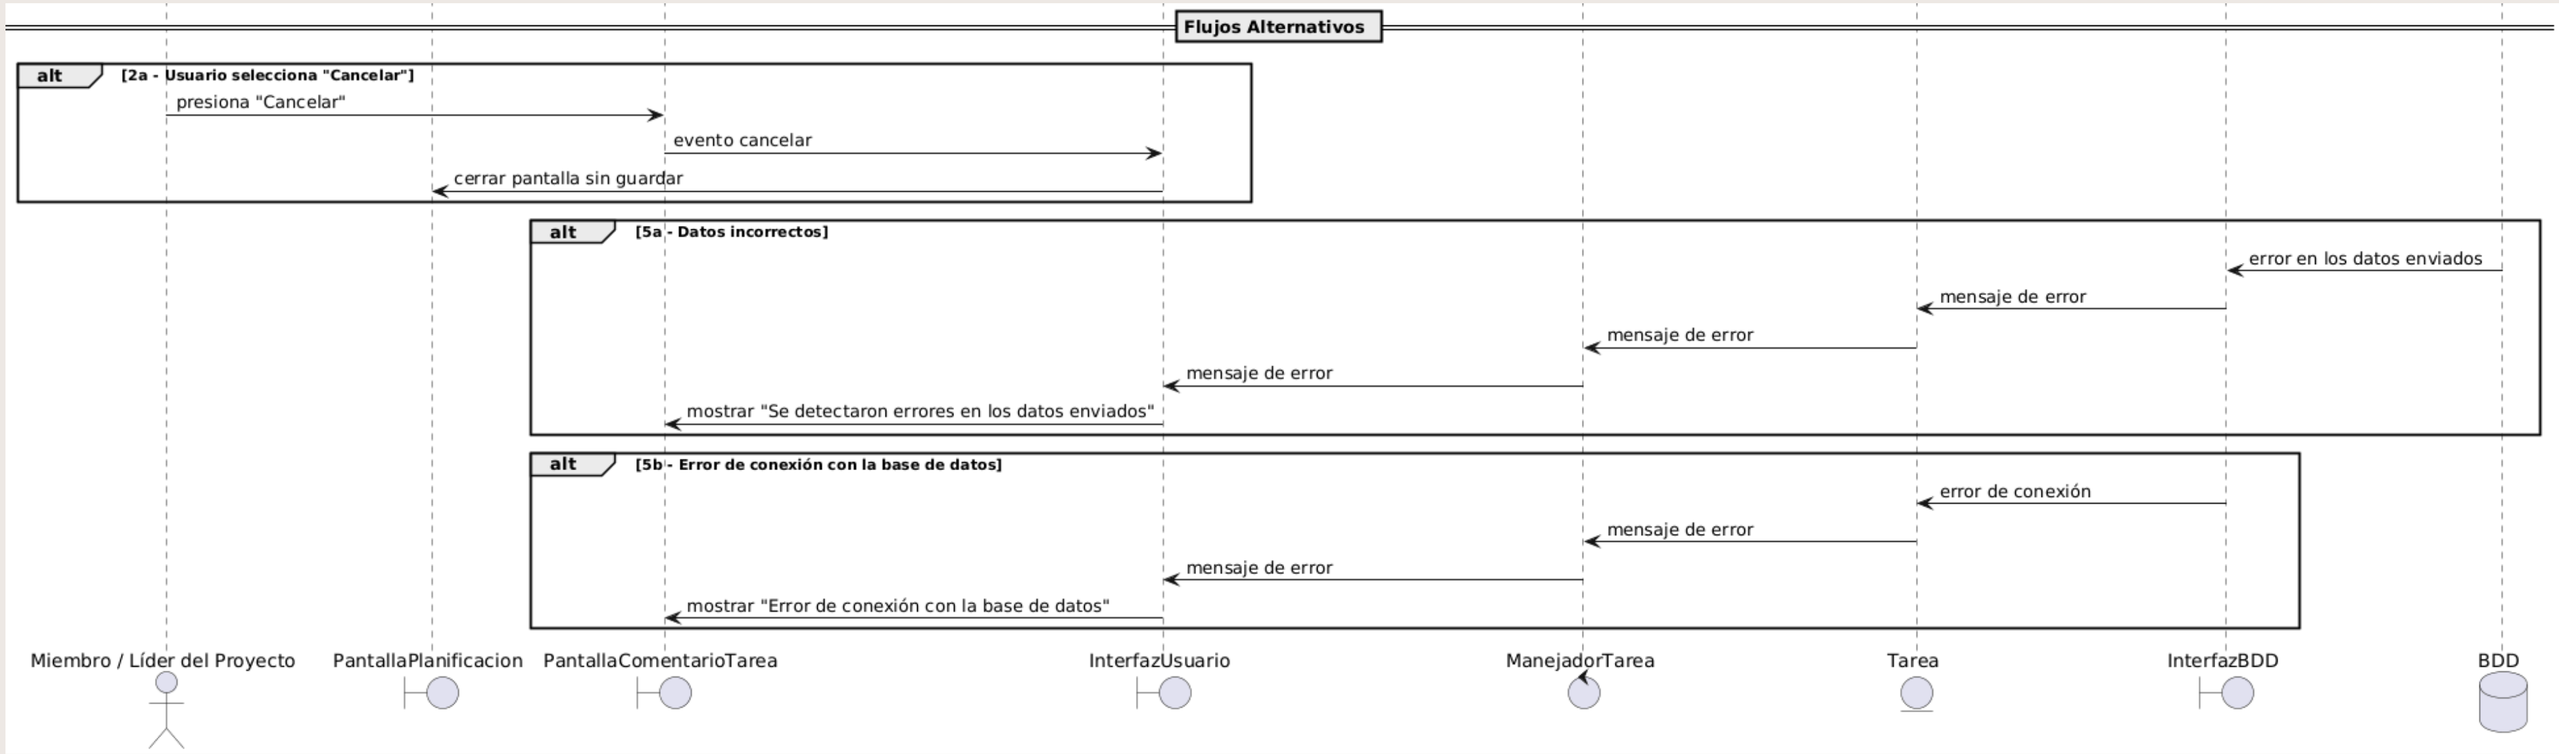


NEXTECH

ESPECIFICACIÓN CU21: REGISTRAR TIEMPO MANUAL

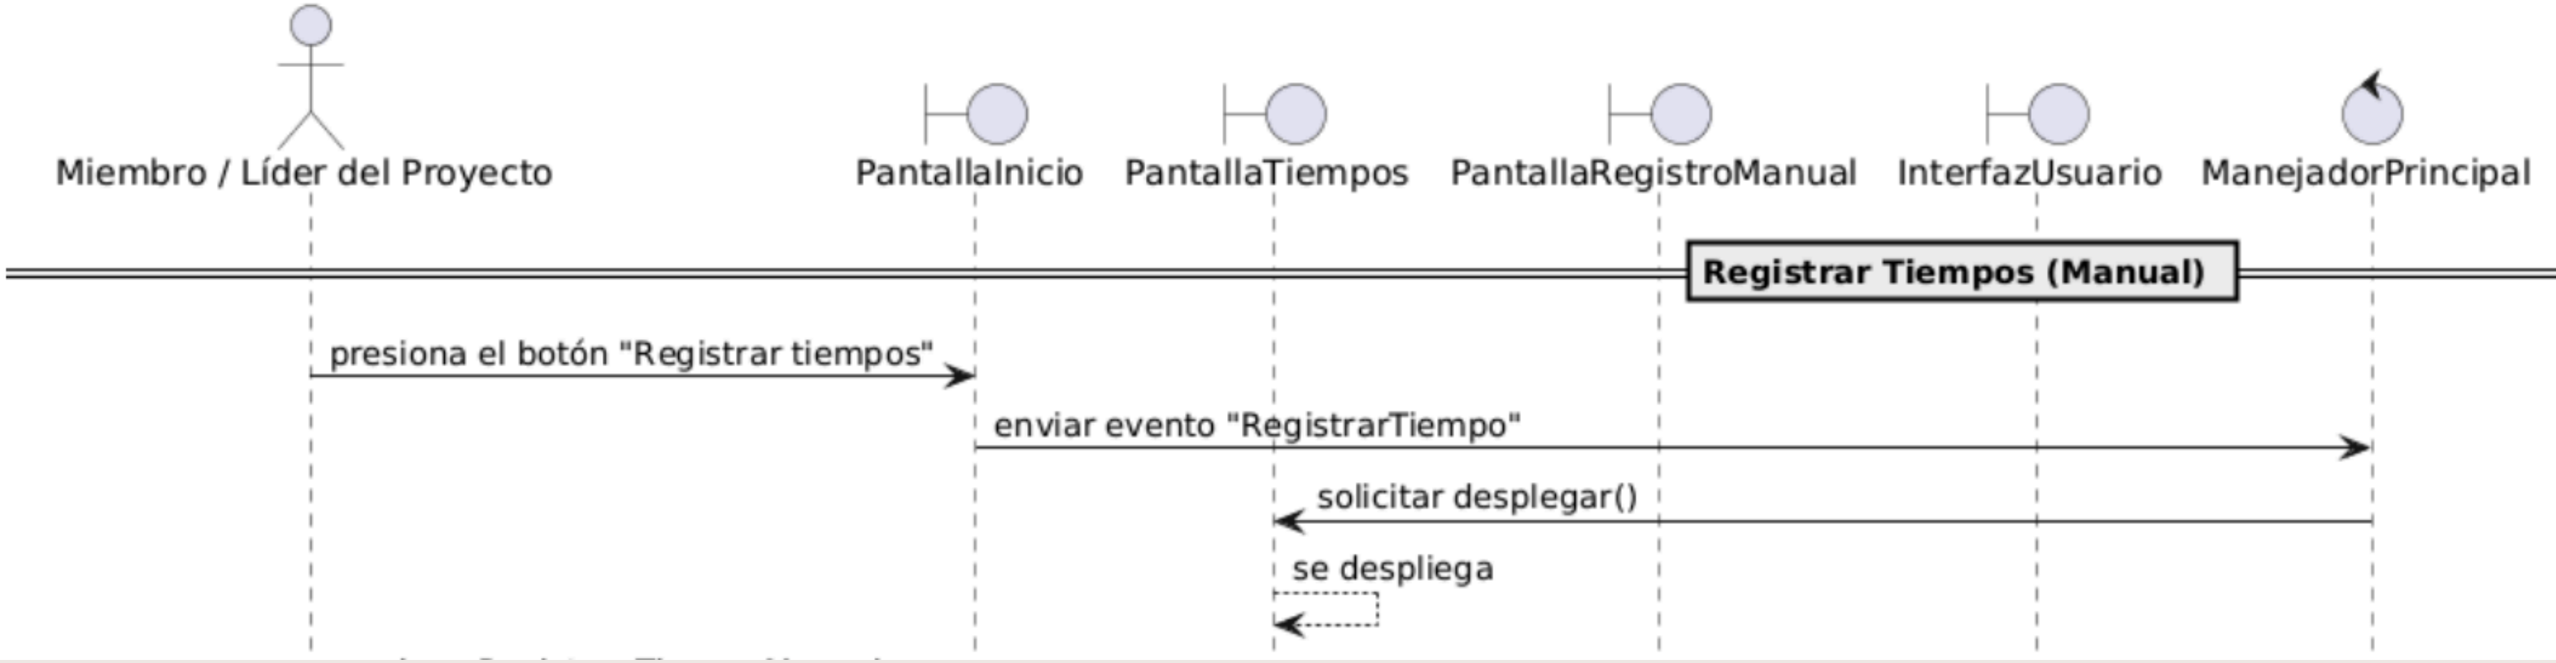


NEXTECH

ESPECIFICACIÓN CU21: REGISTRAR TIEMPO MANUAL

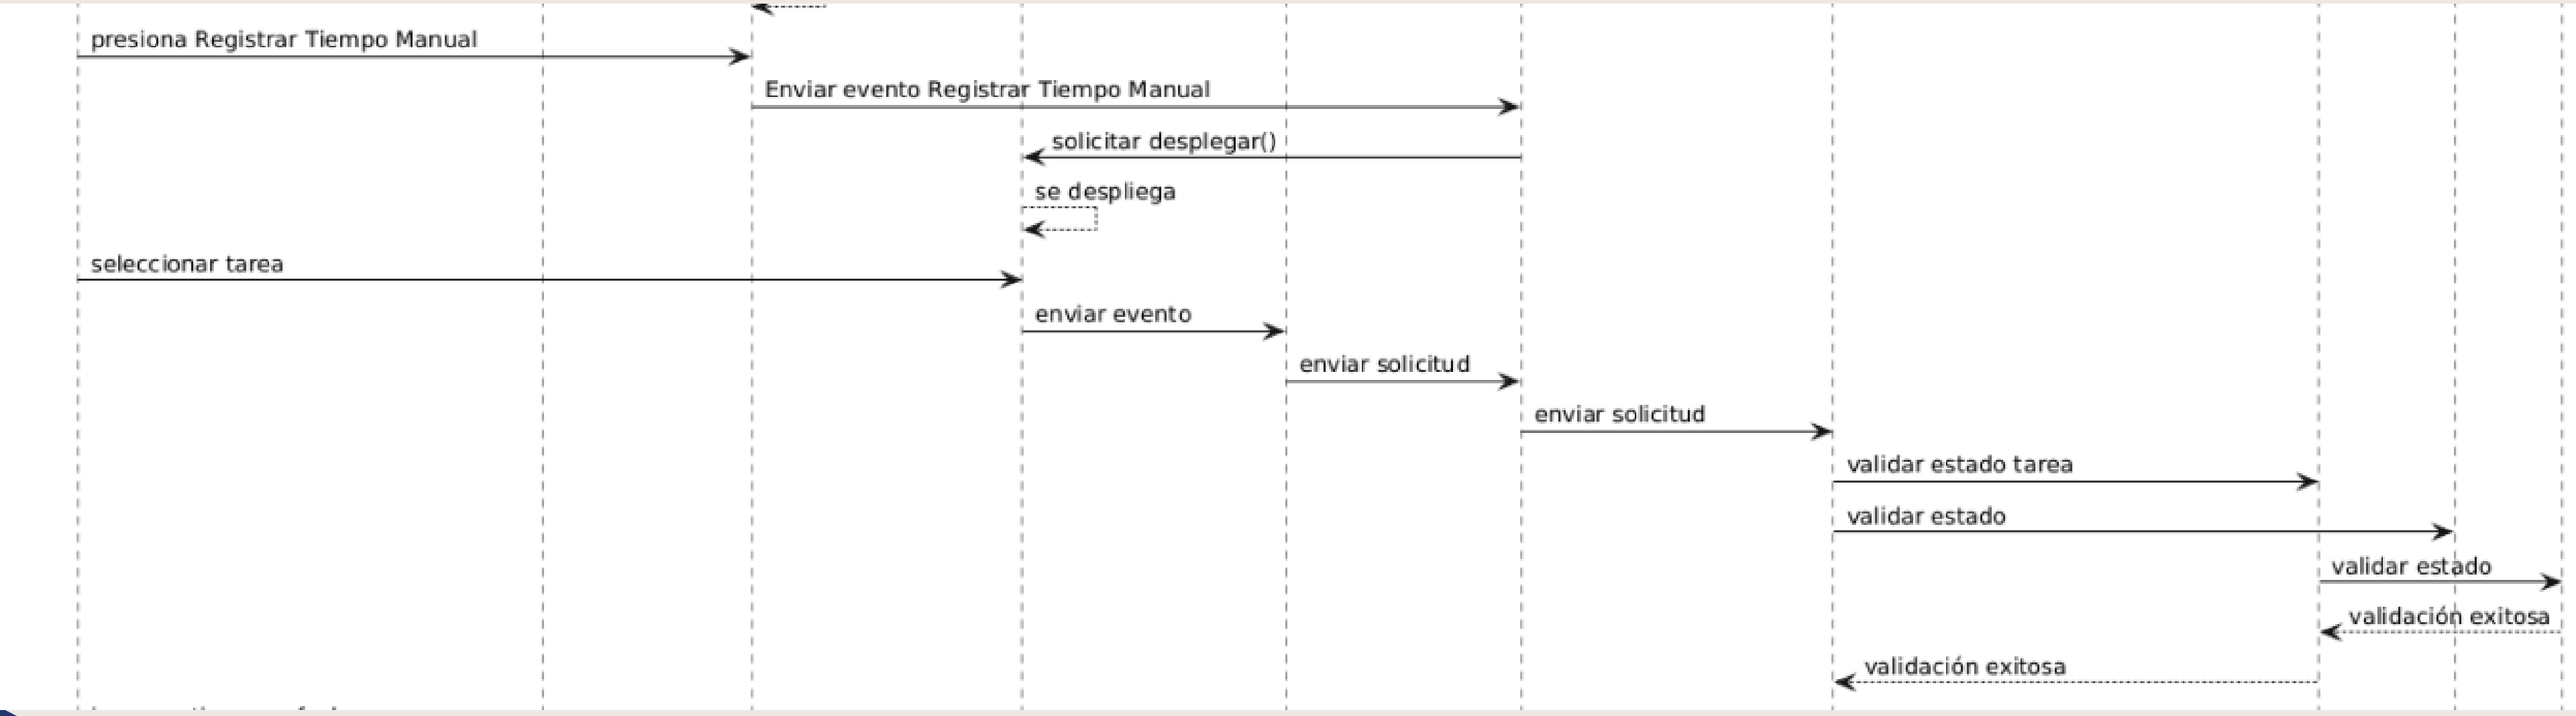

NEXTECH

ESPECIFICACIÓN CU21: REGISTRAR TIEMPO MANUAL

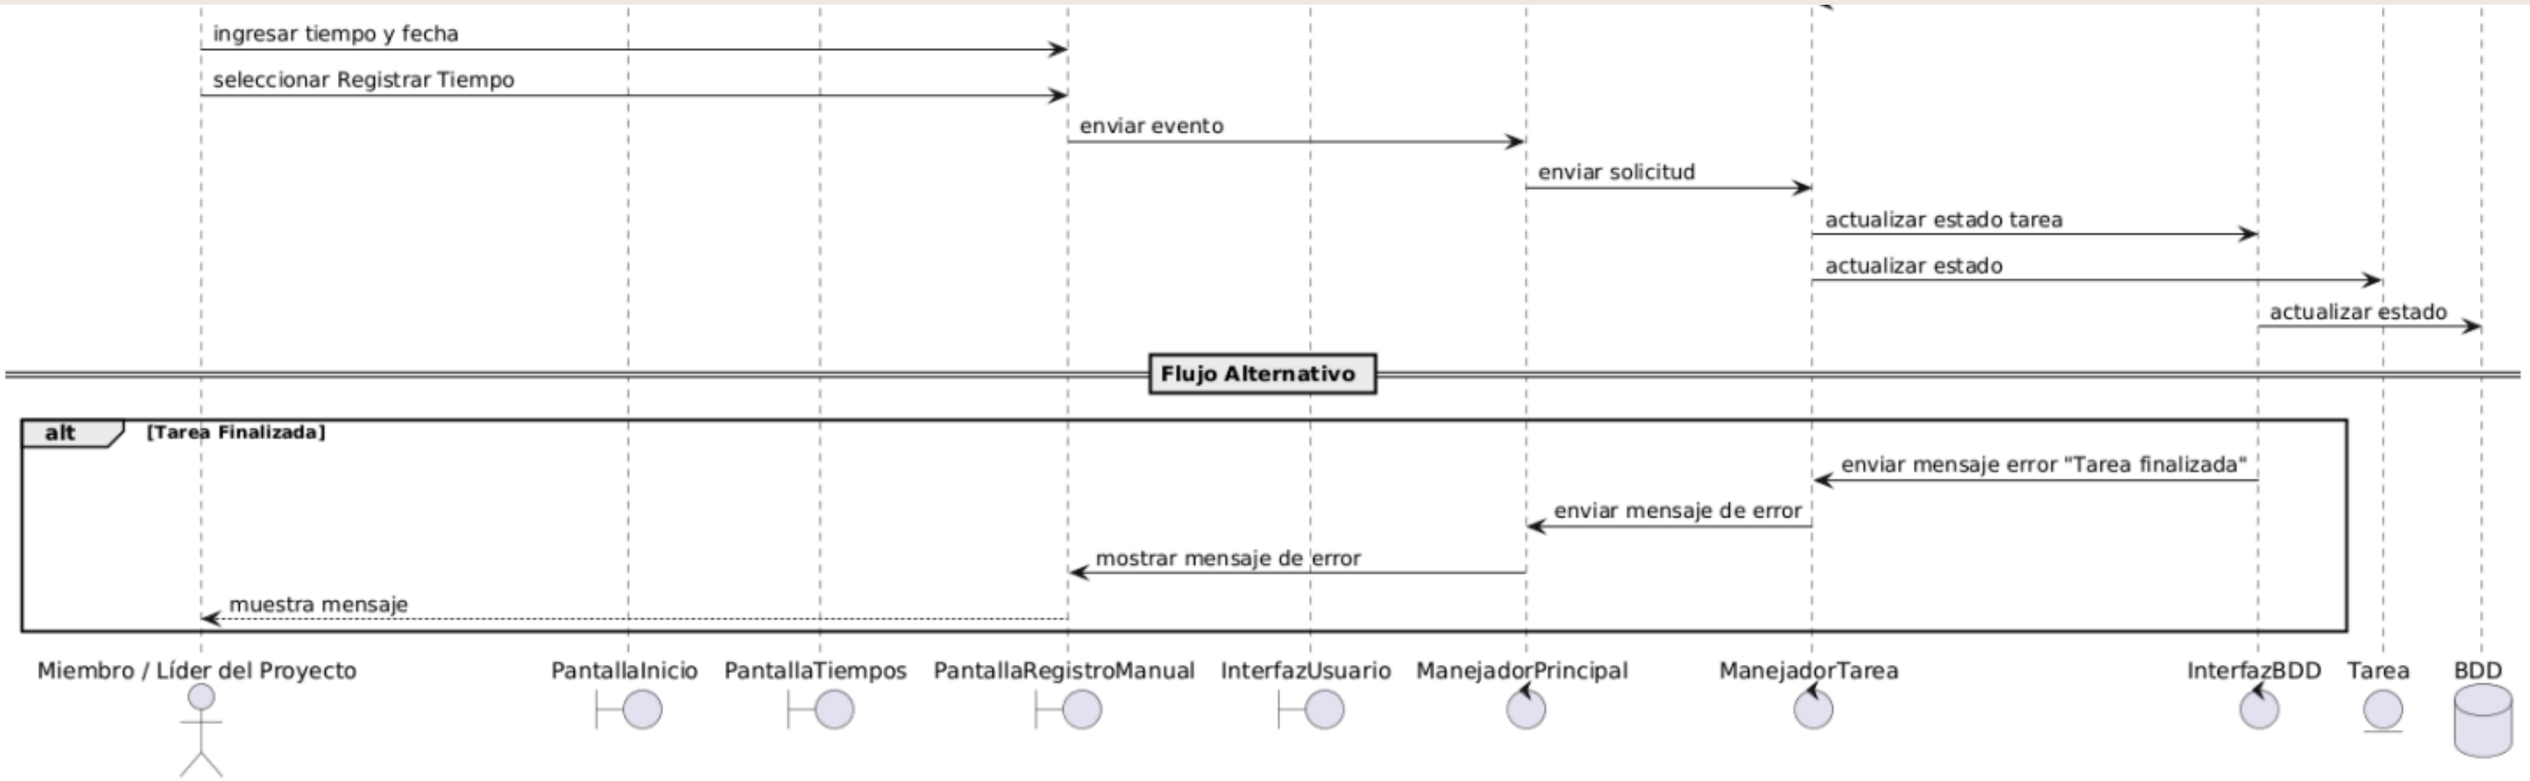

NEXTECH

NEXTECH

MUCHAS GRACIAS

Equipo NexTech
