KAIROS



HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN, REGISTRO DE TIEMPOS Y VISUALIZACIÓN DEL TRABAJO

CENTURIÓN VALERIA , **ESCALANTE** GUILLERMO,
MALDONADO AGUSTINA, **MENDEZ** FLORENCIA, **ULLOA** GONZALO

NEXTECH

ÍNDICE



1 PLANTEAMIENTO / SOLUCIÓN PROPUESTA

2 EQUIPO DE DESAROLLO

3 TECNOLOGÍAS PRINCIPALES

4 ETAPAS DE LA CURSADA

5 ESTIMACIONES

6 TIEMPO REAL DEDICADO

7 GESTIÓN DE RIESGOS


8 GESTIÓN DE CONFIGURACIONES

9 ESTADO DE CASOS DE USO

10 MÉTRICAS

11 IMPLEMENTACIÓN

PLANTEAMIENTO

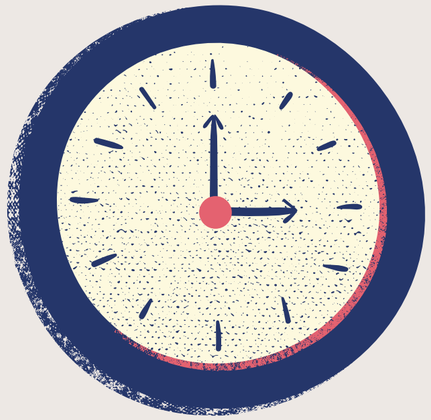

Registro de tiempos de manera distinta sin un sistema unificado

SOLUCIÓN PROPUESTA



Kairos unifica el registro de tiempos, ordena la información y facilita la planificación.



EQUIPO DE DESAROLLO

ULLOA, GONZALO
Líder del proyecto,
Programador

CENTURIÓN VALERIA
Analista, Programador

ESCALANTE, GUILLERMO
Analista, Programador

MALDONADO, AGUSTINA
Diseñador, Documentador

MENDEZ, FLORENCIA
Diseñador, Gerente de Calidad

NEXTECH



ELECCIÓN DE NOMBRE

Propuestas de Equipo

- CodeBalance
- Goblin
- Noxus
- NexTech

NEXTECH



ELECCIÓN DE NOMBRE

Propuestas del proyecto

- Kairos
- CronoLab
- Plant&Track

NEXTECH

ELECCIÓN DE LOGO

Propuestas del equipo









ELECCIÓN DE LOGO

Propuestas del proyecto



TECNOLOGÍAS PRINCIPALES

Gestión y diseño


Git



GitHub


Spreadsheets


Canva


Draw.io


Colab


PlantUML


Figma


Toggl Track

Desarrollo


Java


Angular


Spring Boot


VS Code


Antigravity


XAMPP


MySql


PostMan

Otros


WhatsApp


PSI


Google docs


Discord


Rclone

NEXTECH

ETAPAS DE LA CURSADA

INICIO
1 iteración

ELABORACIÓN
2 iteración

CONSTRUCCIÓN
3 iteración

CIERRE DE CURSADA

6 ITERACIONES EN TOTAL.



NEXTECH

ETAPA DE INICIO

Documentos/actividades a destacar



Entrevistas al cliente



Estudio de factibilidad




Propuesta de desarrollo


NEXTECH

ETAPA DE ELABORACIÓN ITERACIÓN 1

Documentos/actividades a destacar



Especificación de requerimientos



Plan de proyecto



Plan de iteración



Plan de calidad


NEXTECH

ETAPA DE ELABORACIÓN ITERACIÓN 2

Documentos/actividades a destacar



Modelo de casos de uso



Prototipo Funcional



Modelo de datos




Plan de Pruebas


NEXTECH

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Documentos/actividades a destacar

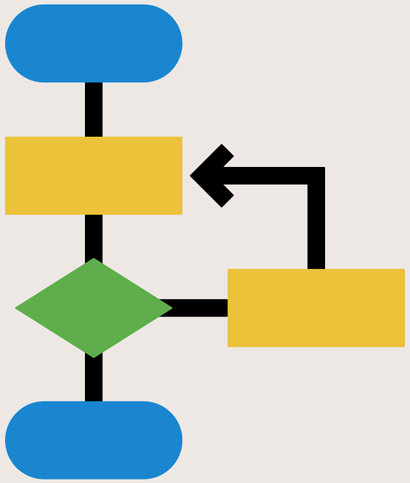

Modelo de diseño



Implementación



Casos de prueba

NEXTECH

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

ITERACIÓN 1: 18 días

Priorización e implementación de primera tanda de CU

Caso de Uso	Estado
CU01: Iniciar Sesión	**Completado**
CU09: Crear tarea	**Completado**
CU12: Estimar tarea	**Completado**
CU20: Registrar tiempo por cronometro	**Completado**

NEXTECH

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

ITERACIÓN 2: 10 días

Priorización e implementación de segunda tanda de CU

Caso de Uso	Estado
CU07: Crear etapa	Completado
CU08: Crear iteración	Completado
CU13: Asignar dependencia	Completado
CU14: Modificar estado tarea	Completado
CU15: Visualizar tarea	Completado
CU16: Comentar tarea	Completado
CU21: Registrar tiempo manual	Completado

NEXTECH

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

ITERACIÓN 3: 7 días

Priorización e implementación de tercera tanda de CU

Caso de Uso	Estado
CU03: Asignar rol	Completado
CU04: Modificar perfil	Completado
CU05: Crear proyecto	Completado
CU06: Modificar proyecto	Completado
CU18: Añadir categoria	Completado
CU19: Modificar categoria	Completado
CU22: Ver reporte	Completado
CU23: Registrar usuario al proyecto	Completado

NEXTECH

ETAPA DE CIERRE DE CURSADA


Documentos/actividades a destacar



Planes de iteración hasta finalización del proyecto



Manual de instalación



Estructura de la memoria





Manual de usuario

NEXTECH

ESTIMACIÓN


NEXTECH

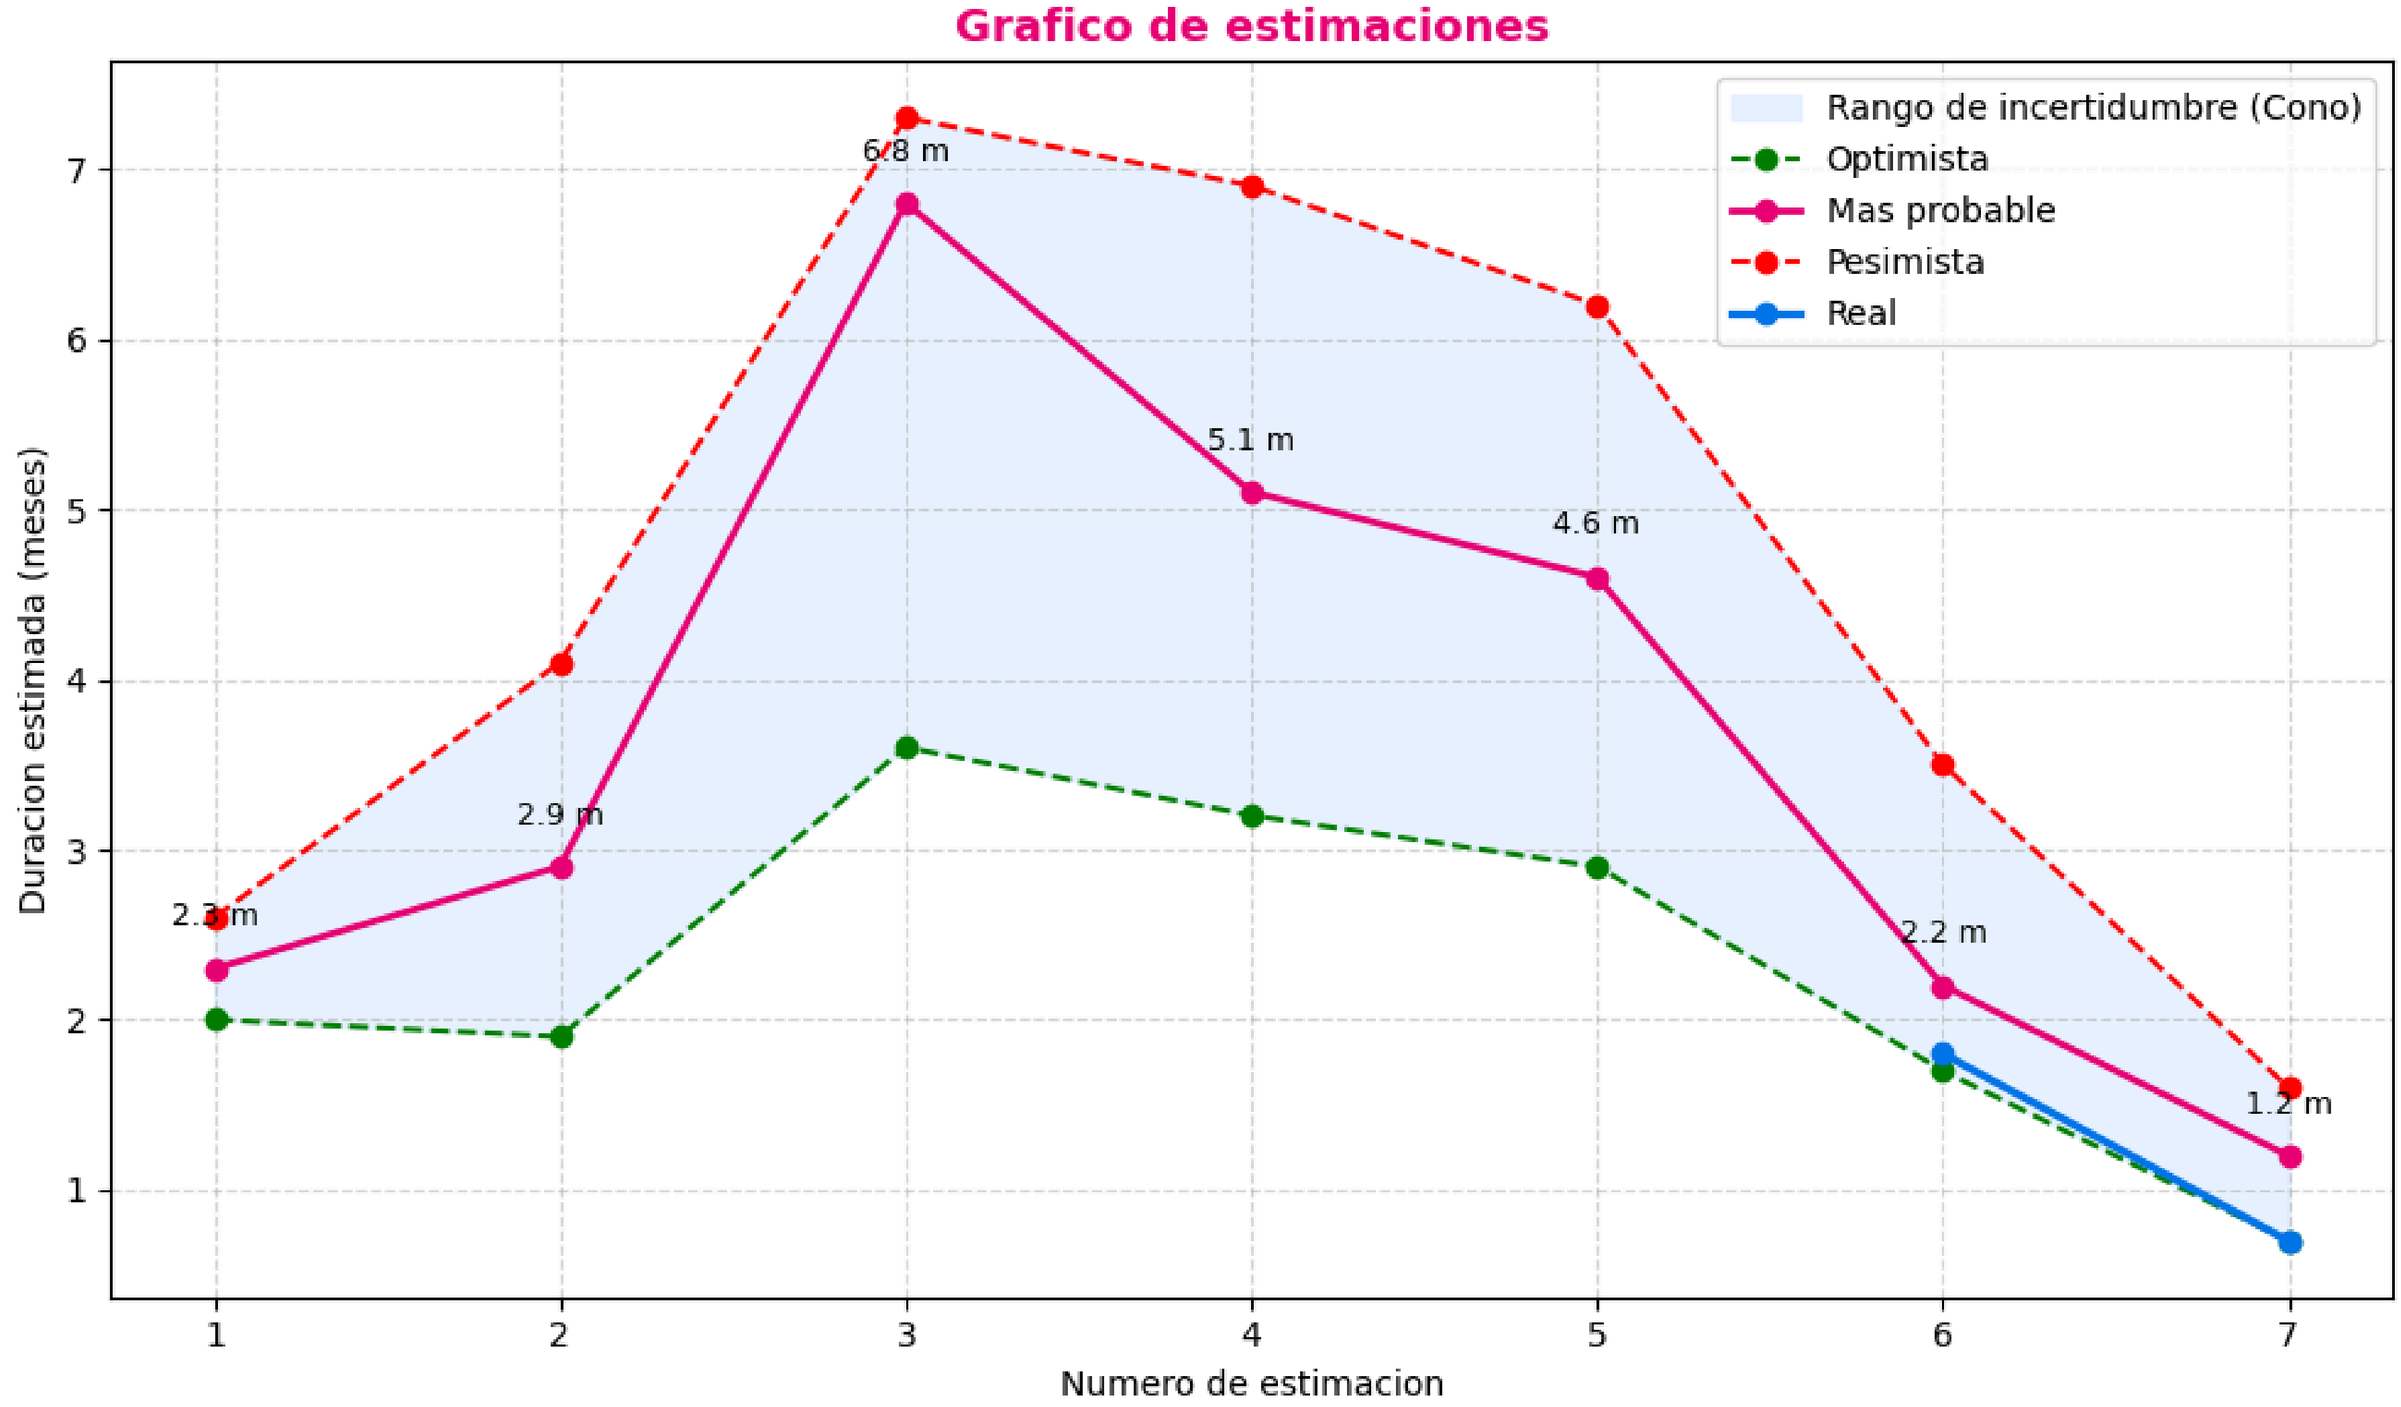
Grafico de estimaciones
Rango de incertidumbre (Cono)
Optimista
Mas probable
Pesimista
Real
6.8 m
5.1 m
4.6 m
2.9 m
2.3 m
2.2 m
1.2 m
Duracion estimada (meses)
Numero de estimacion
1
2
3
4
5
6
7

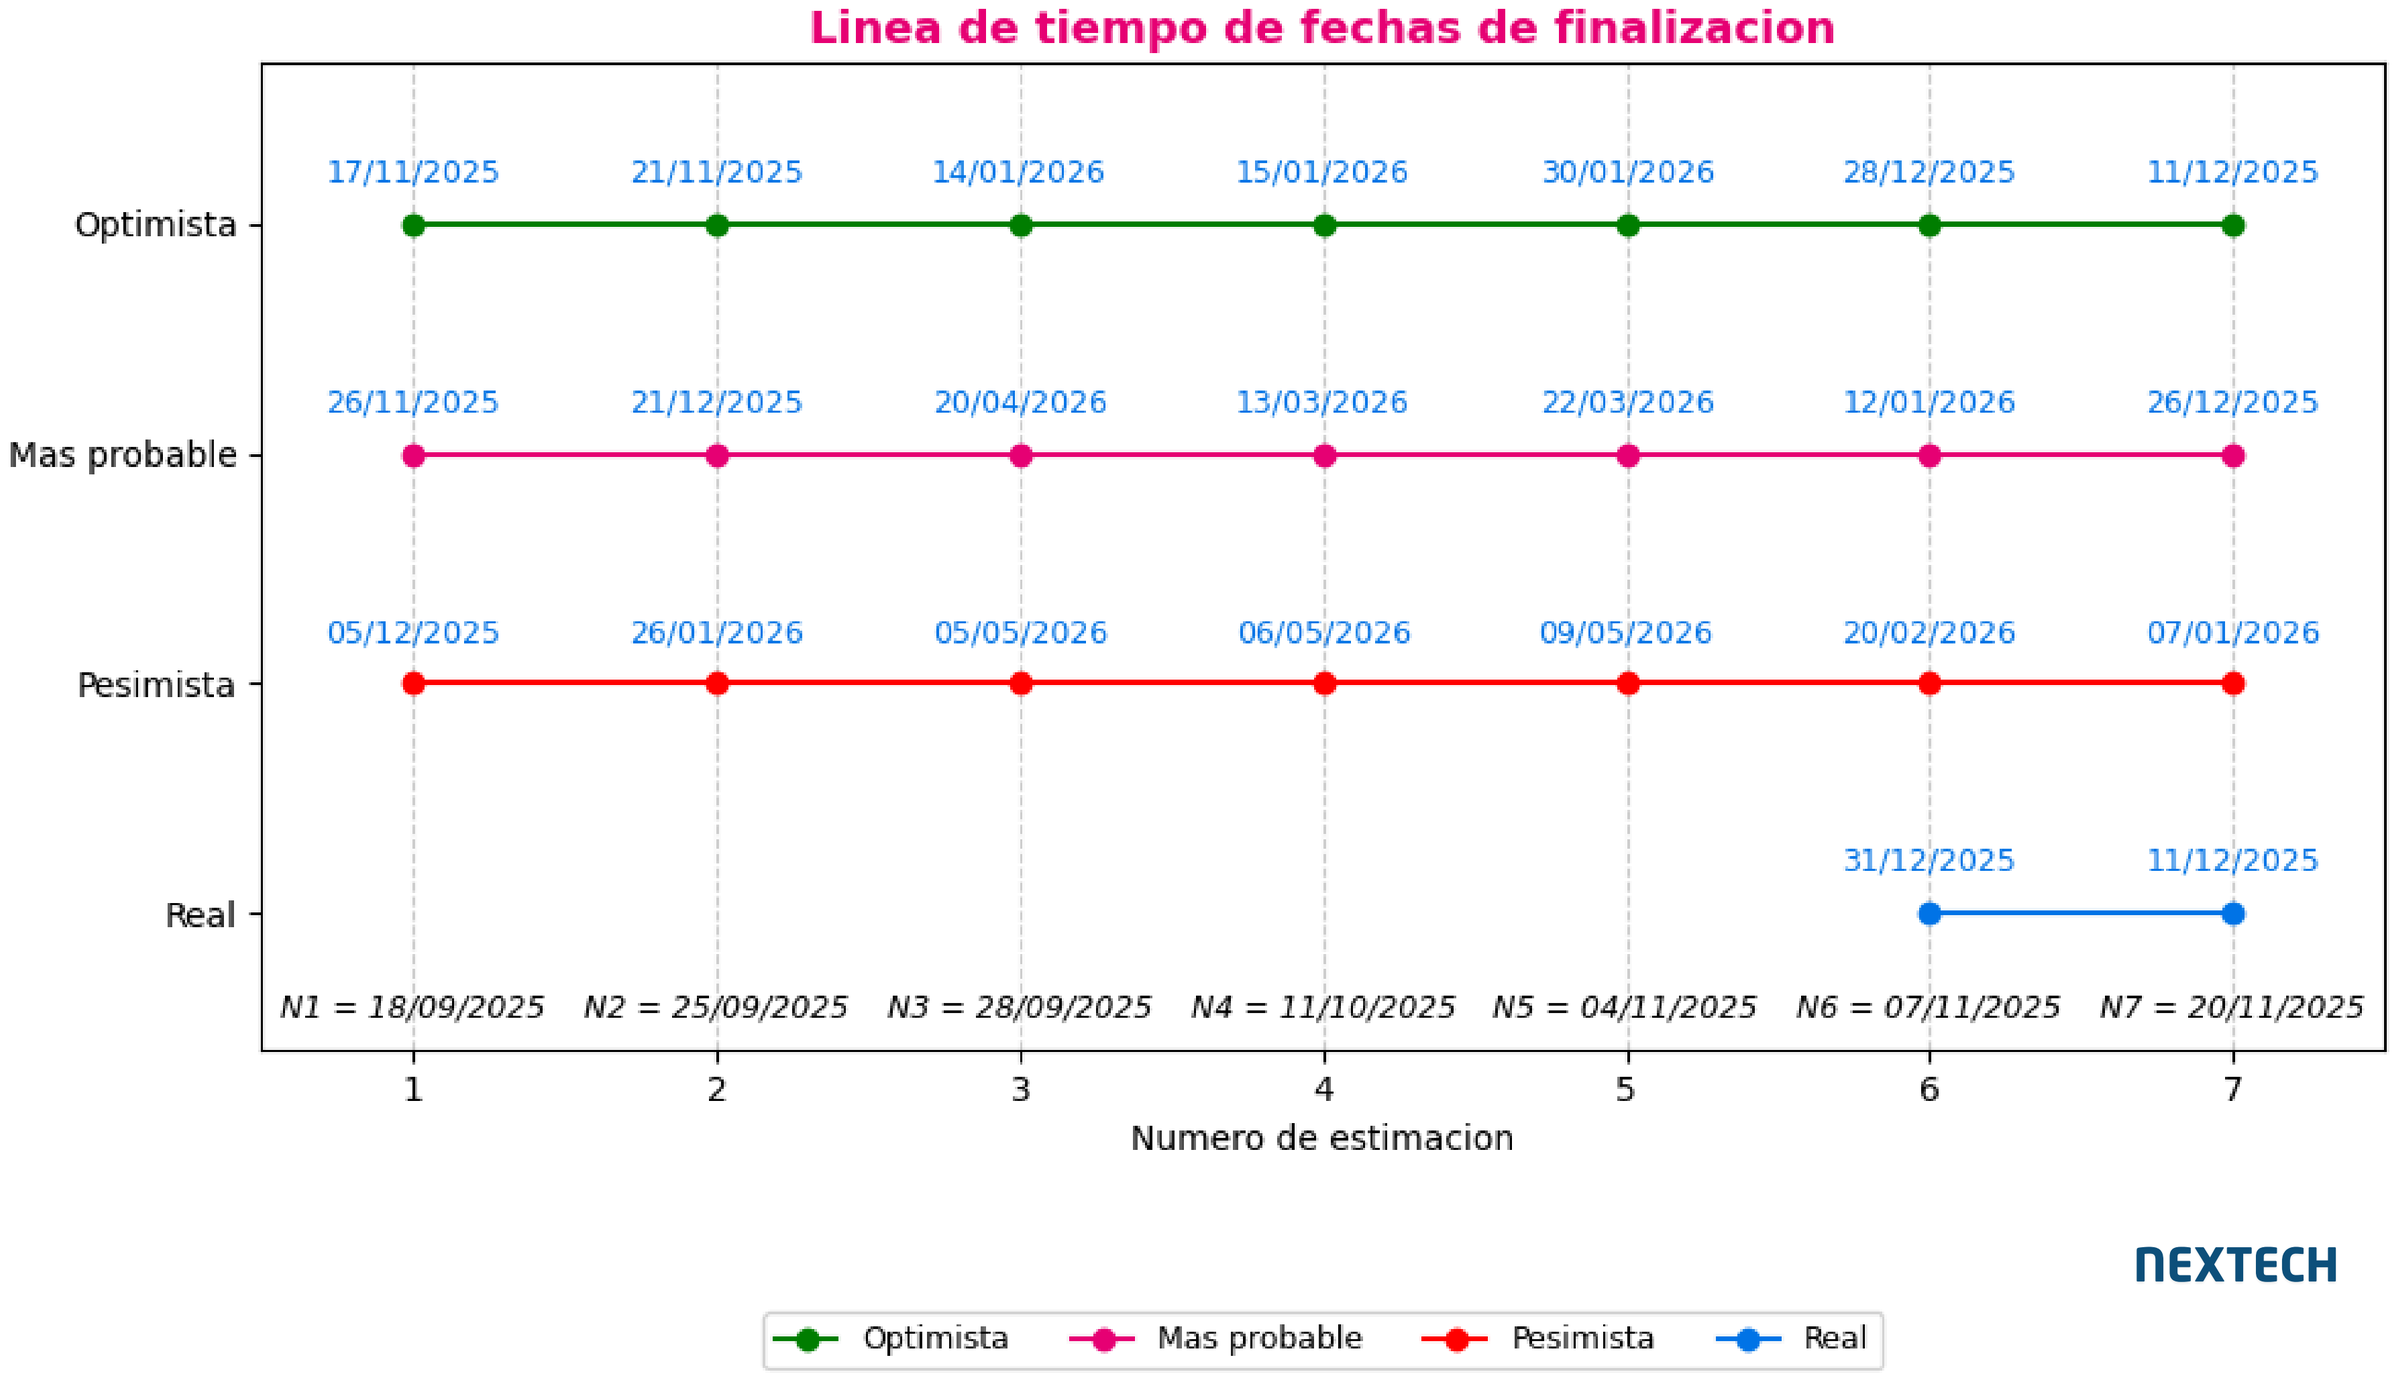
Linea de tiempo de fechas de finalizacion
Optimista
Mas probable
Pesimista
Real
17/11/2025
21/11/2025
14/01/2026
15/01/2026
30/01/2026
28/12/2025
11/12/2025
26/11/2025
21/12/2025
20/04/2026
13/03/2026
22/03/2026
12/01/2026
26/12/2025
05/12/2025
26/01/2026
05/05/2026
06/05/2026
09/05/2026
20/02/2026
07/01/2026
31/12/2025
11/12/2025
N1 = 18/09/2025
N2 = 25/09/2025
N3 = 28/09/2025
N4 = 11/10/2025
N5 = 04/11/2025
N6 = 07/11/2025
N7 = 20/11/2025
1
2
3
4
5
6
7
Numero de estimacion
Optimista
Mas probable
Pesimista
Real

NEXTECH

Comparacion de esfuerzo (h-h) por estimacion

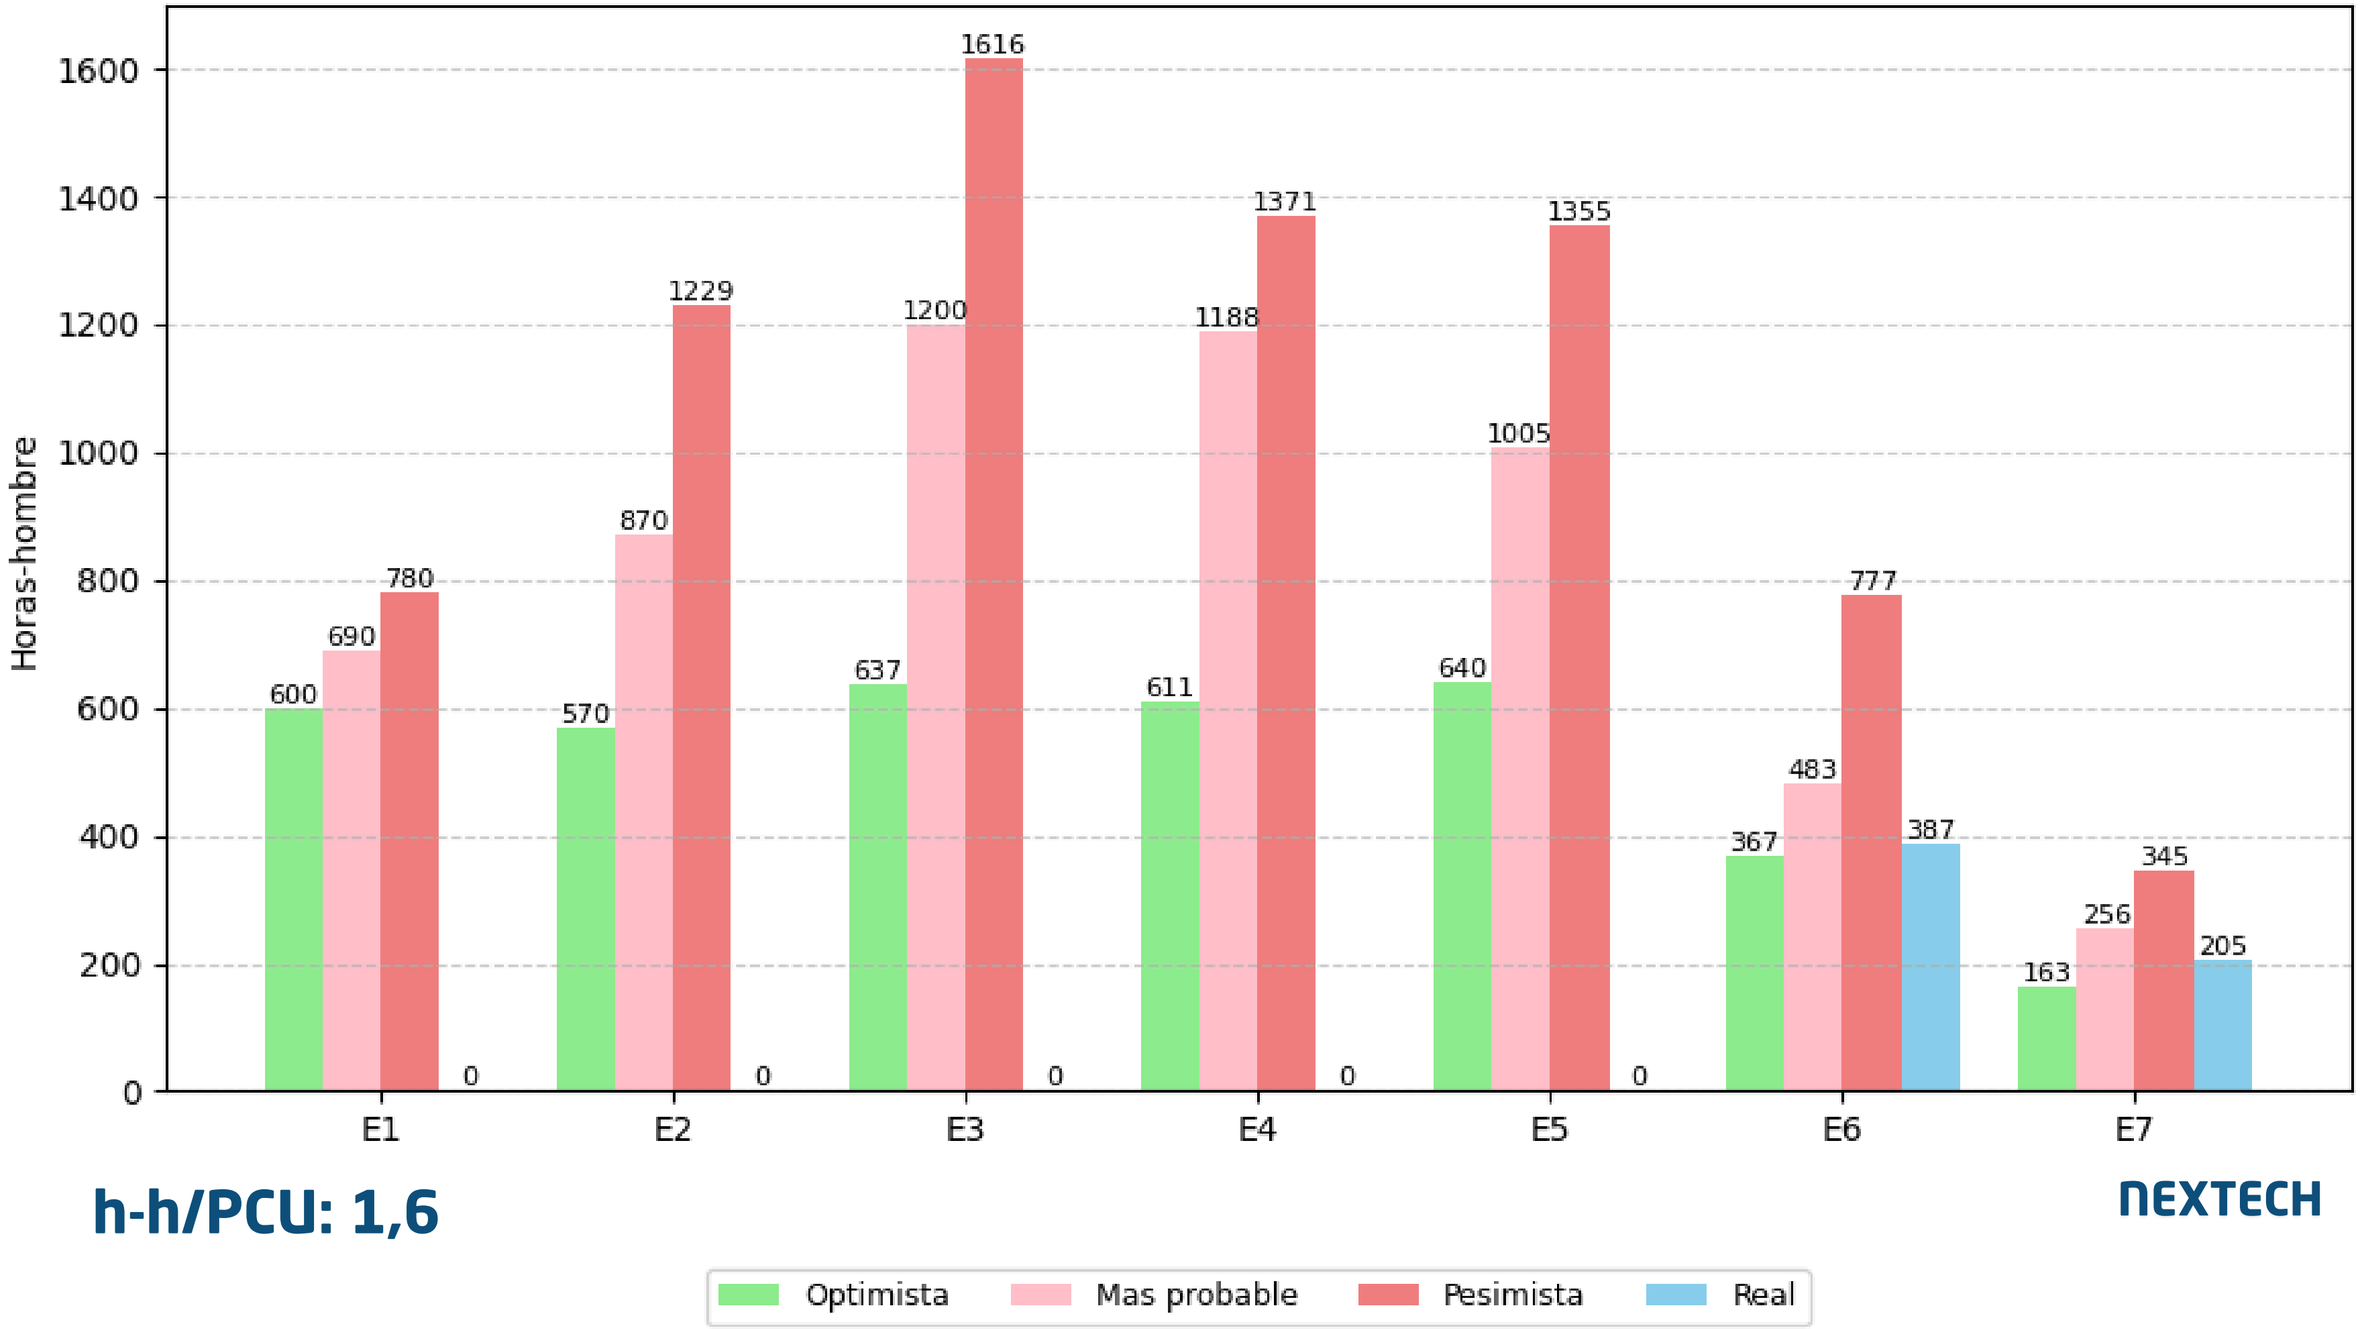

h-h/PCU: 1,6


NEXTECH

TIEMPO REAL DEDICADO

NEXTECH

Esfuerzo acumulado por etapa

Total de horas: 604:45:51

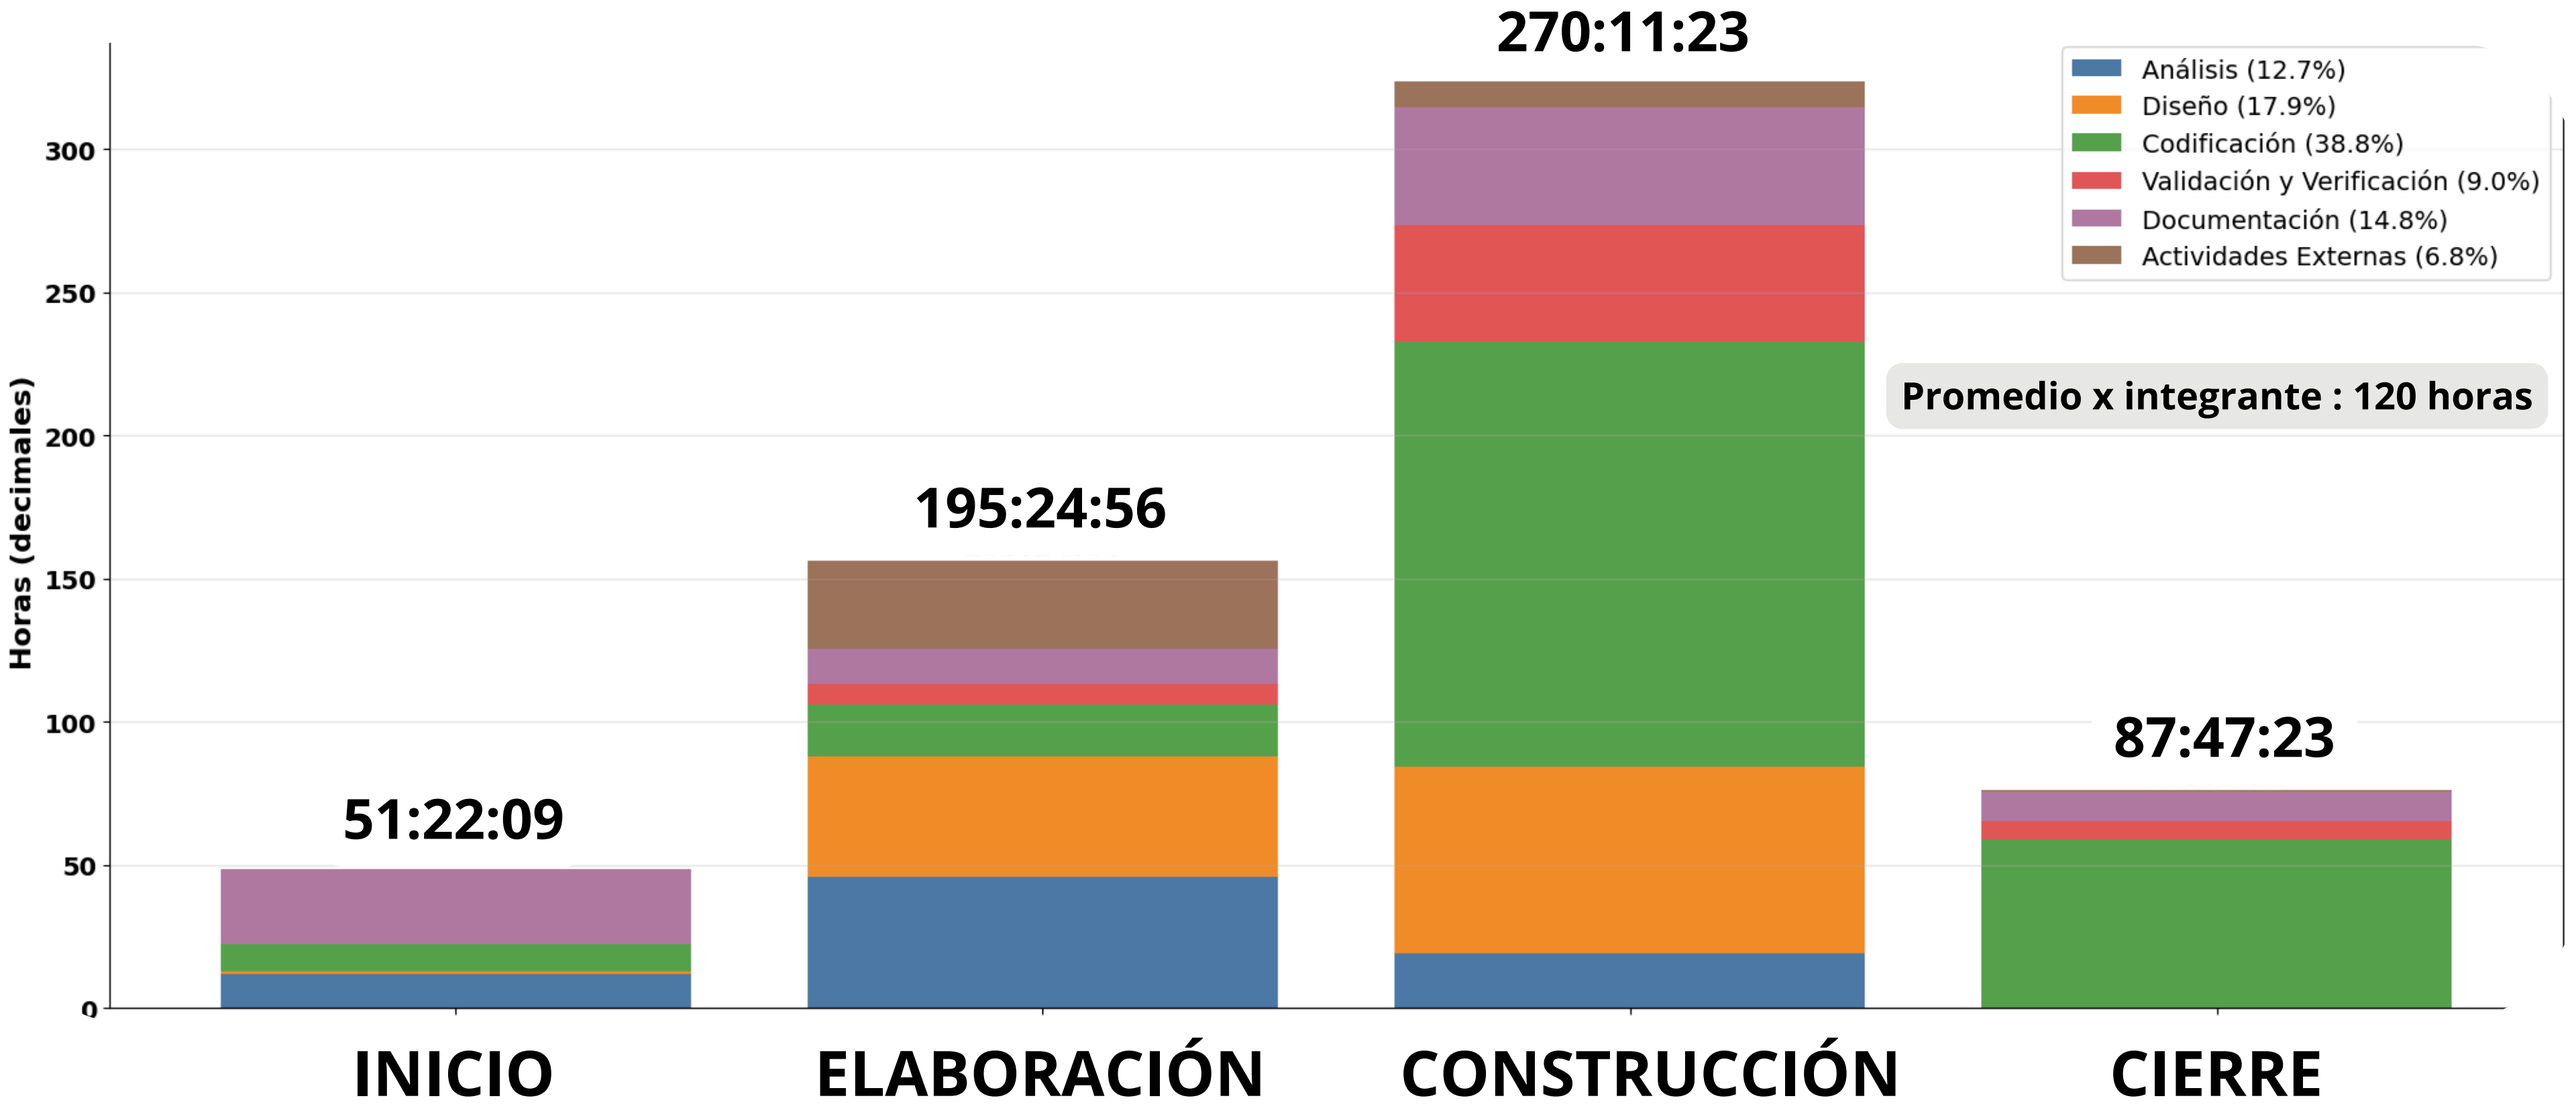

Promedio x integrante : 120 horas

GESTIÓN DE RIESGOS

NEXTECH



ESTADO ACTUAL- RIESGOS

Estado	Cantidad de riesgos
🖤 **No requieren acción**	14
🔵 **Reevaluar próxima iteración**	3
🟢 **Planificados / controlados**	2
Total	**19**

NEXTECH

RIESGOS A LO LARGO DEL PROYECTO





GESTIÓN DE CONFIGURACIONES

NEXTECH

Estado actual del repositorio

26/08/2025 - 28/11/2025


- Archivos: 25.623
- Directorios: 2.367
- Ramas: 12
  - *Activas*: 6
  - *A eliminar*: 6

NEXTECH

Cantidad de Commits


Total: 327

Inicio: I1 | Elaboración: I1 | Elaboración: I2 | Construcción: I1 | Construcción: I2 | Construcción: I3 | Cierre

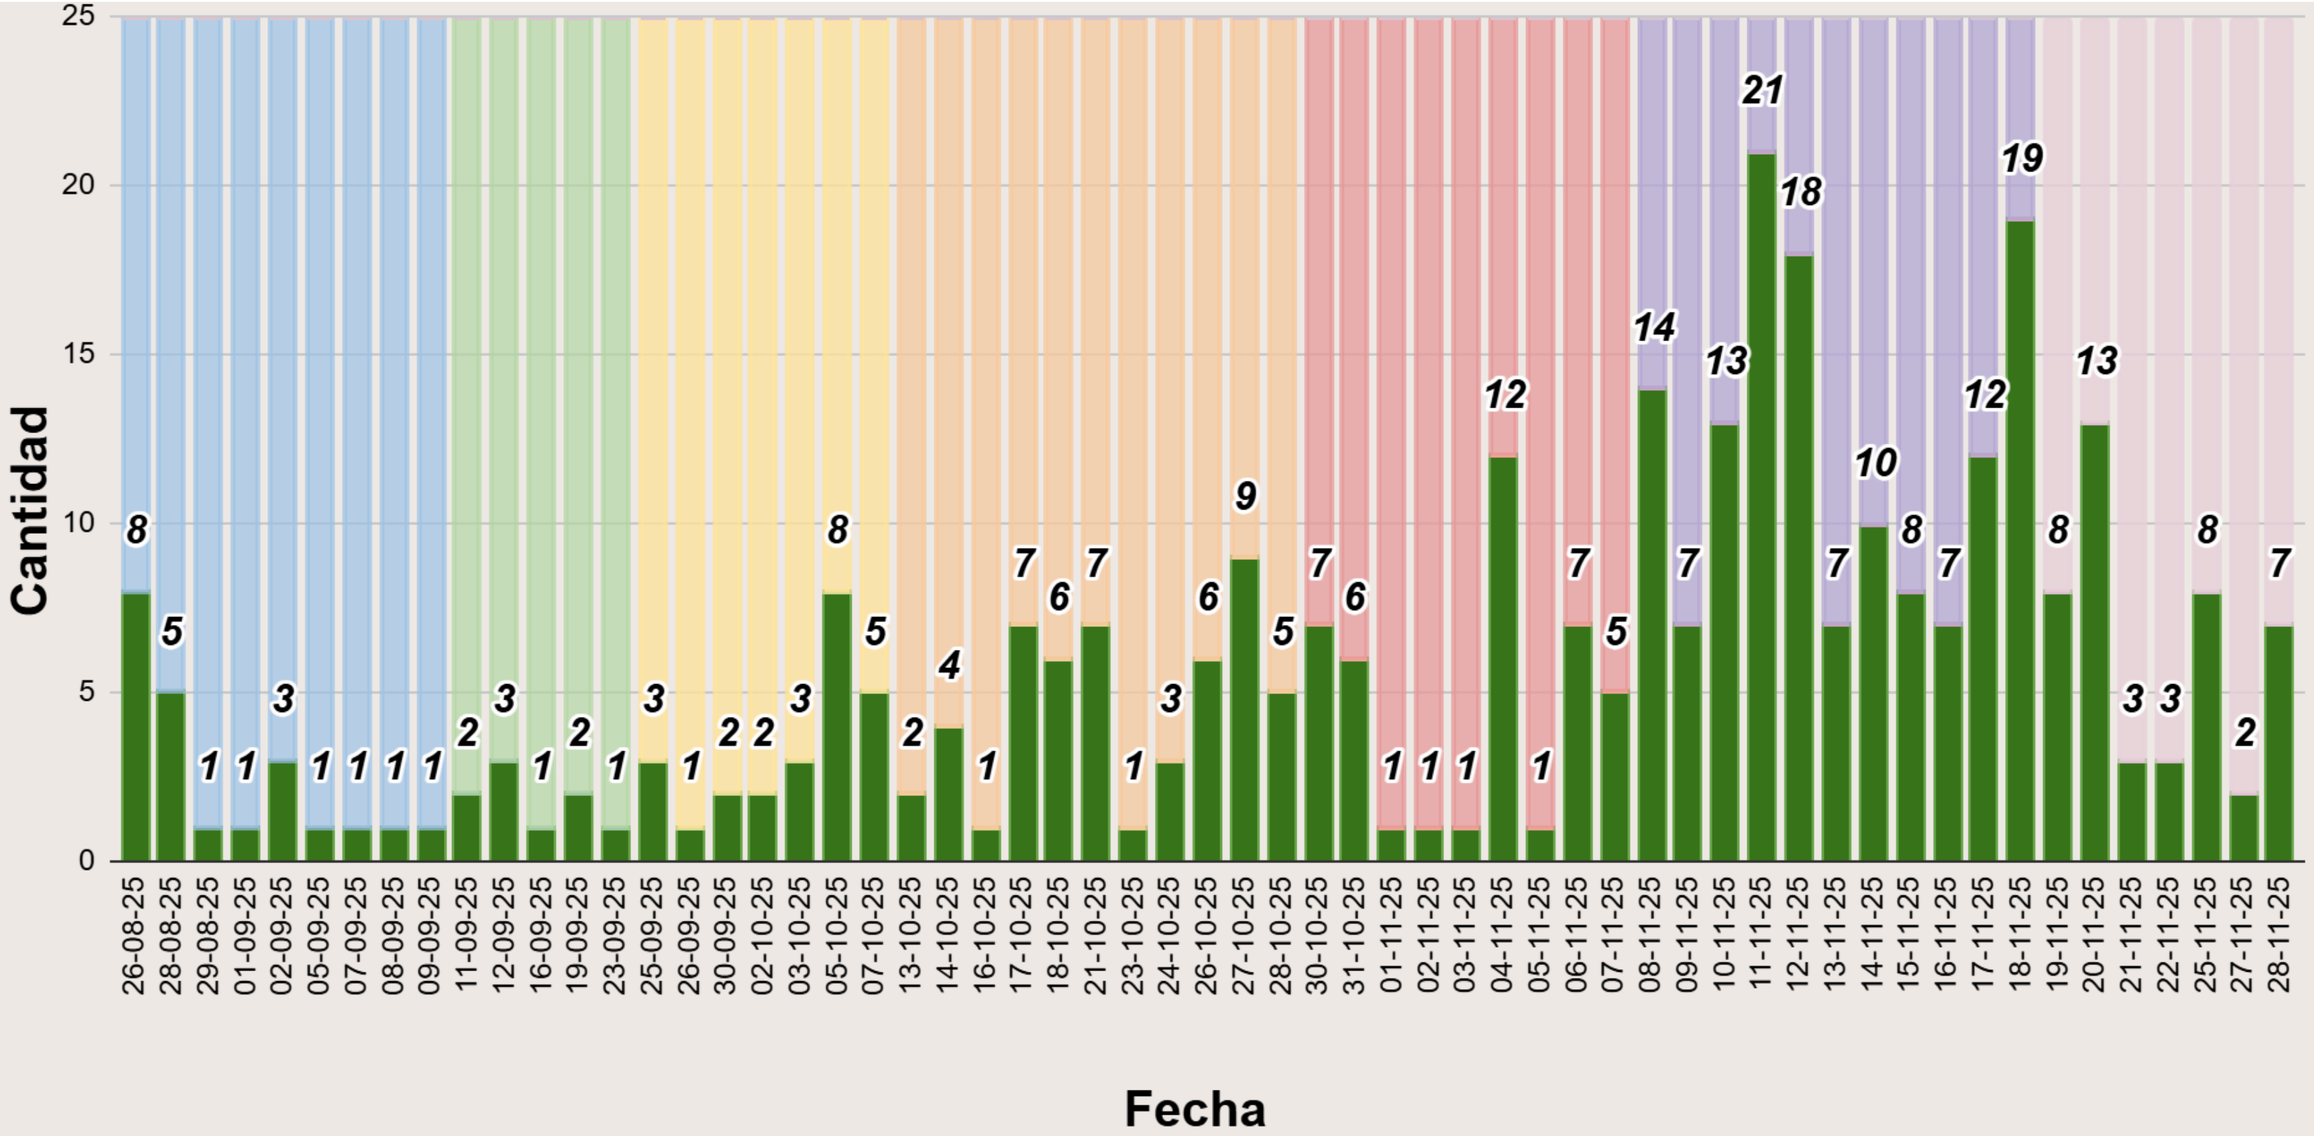

Fecha

Promedio de cantidad de commits por día

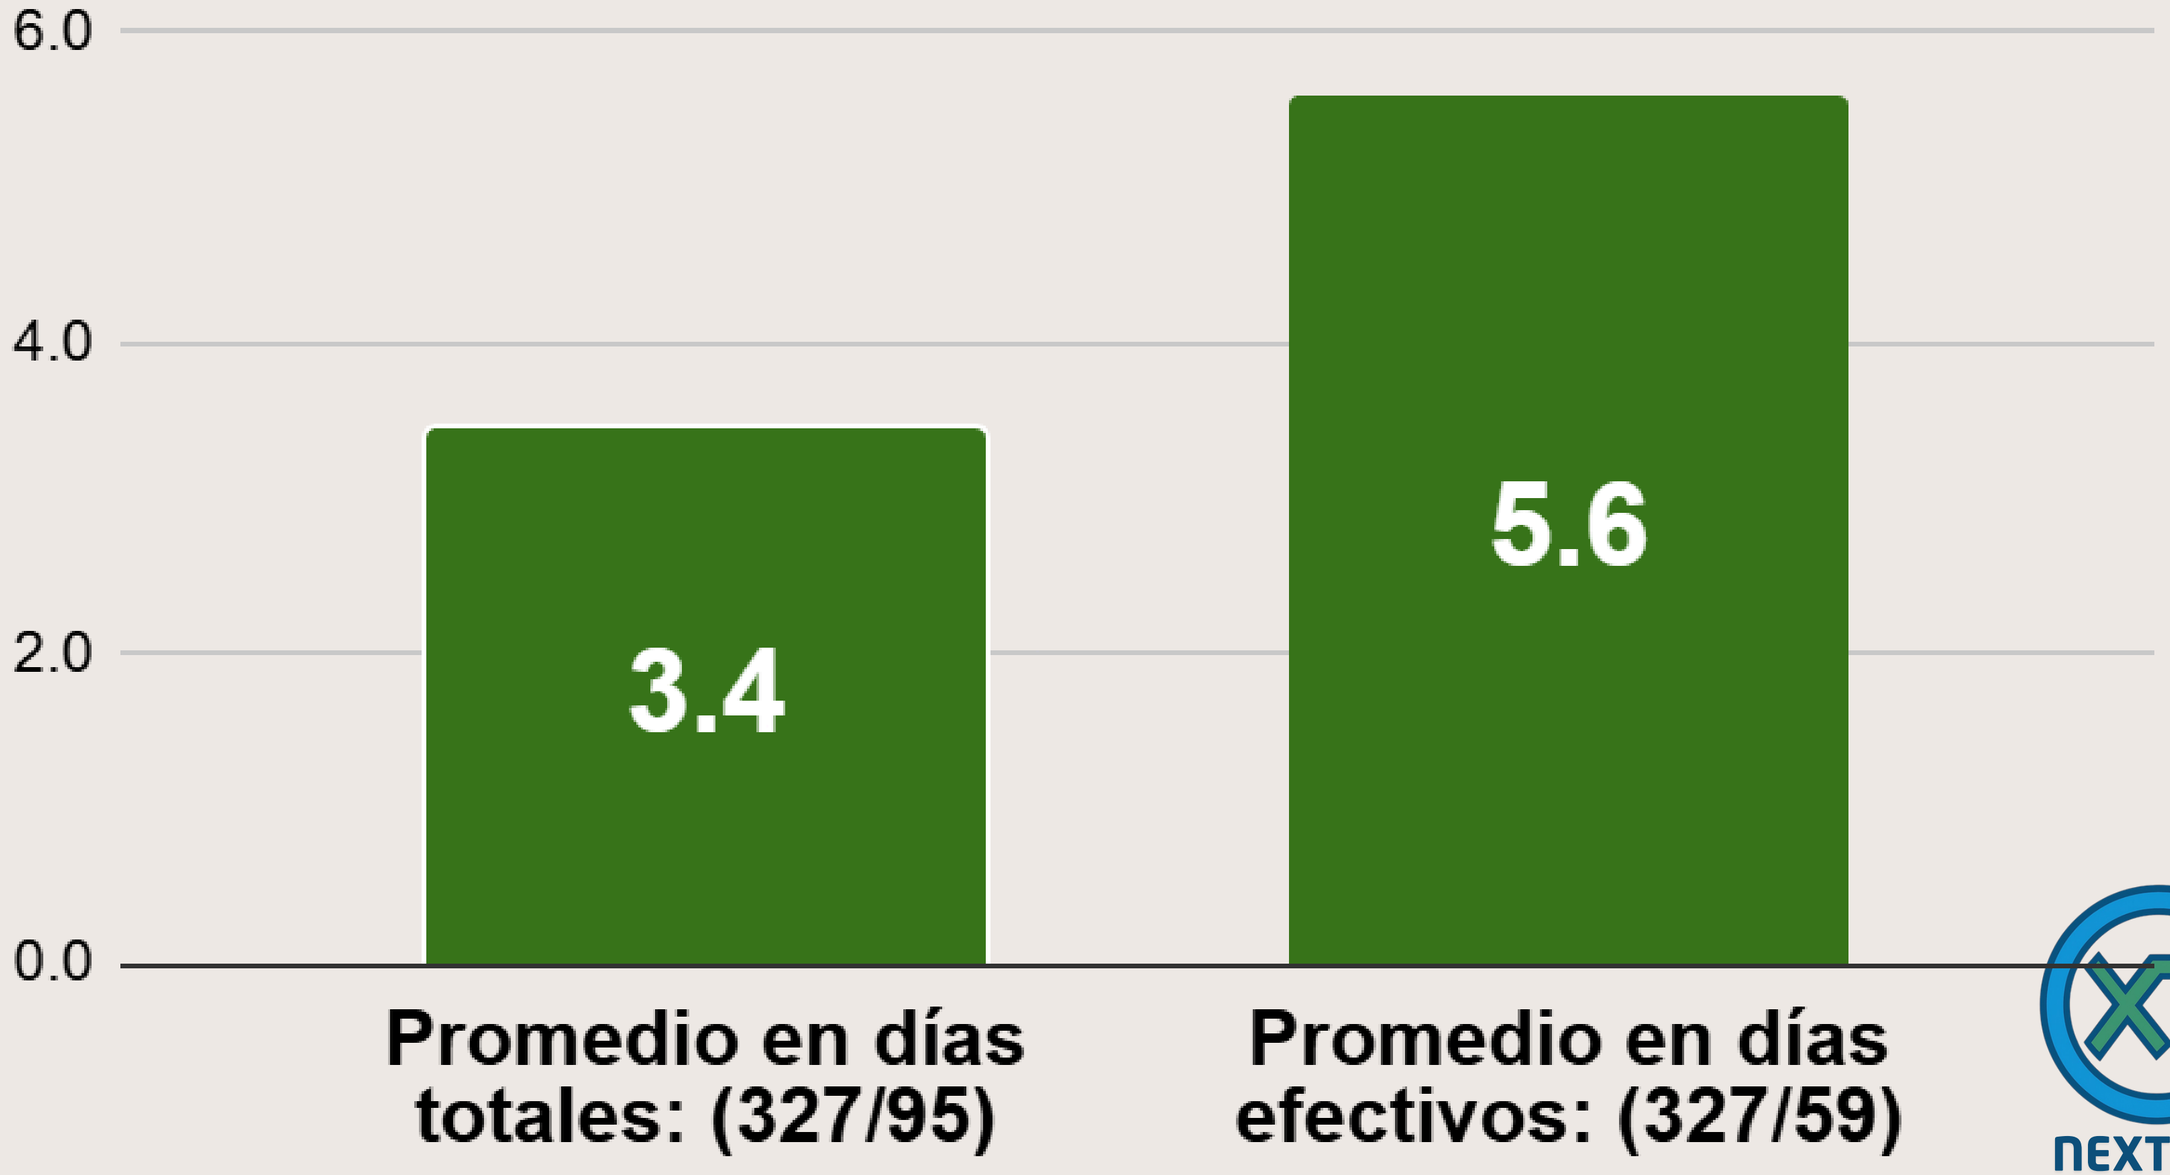


NEXTECH

Política de Commits

- Programación:
  - **fix:** *Para agregar funcionalidades.*
  - **feat:** *Para corrección de errores.*
  - **dev:** *Cambios generales.*
- Documentación:
  - **docs**(*documento específico*)
  - **docs:** Actualización de varios documentos

Clasificación de Commits

Total: 327

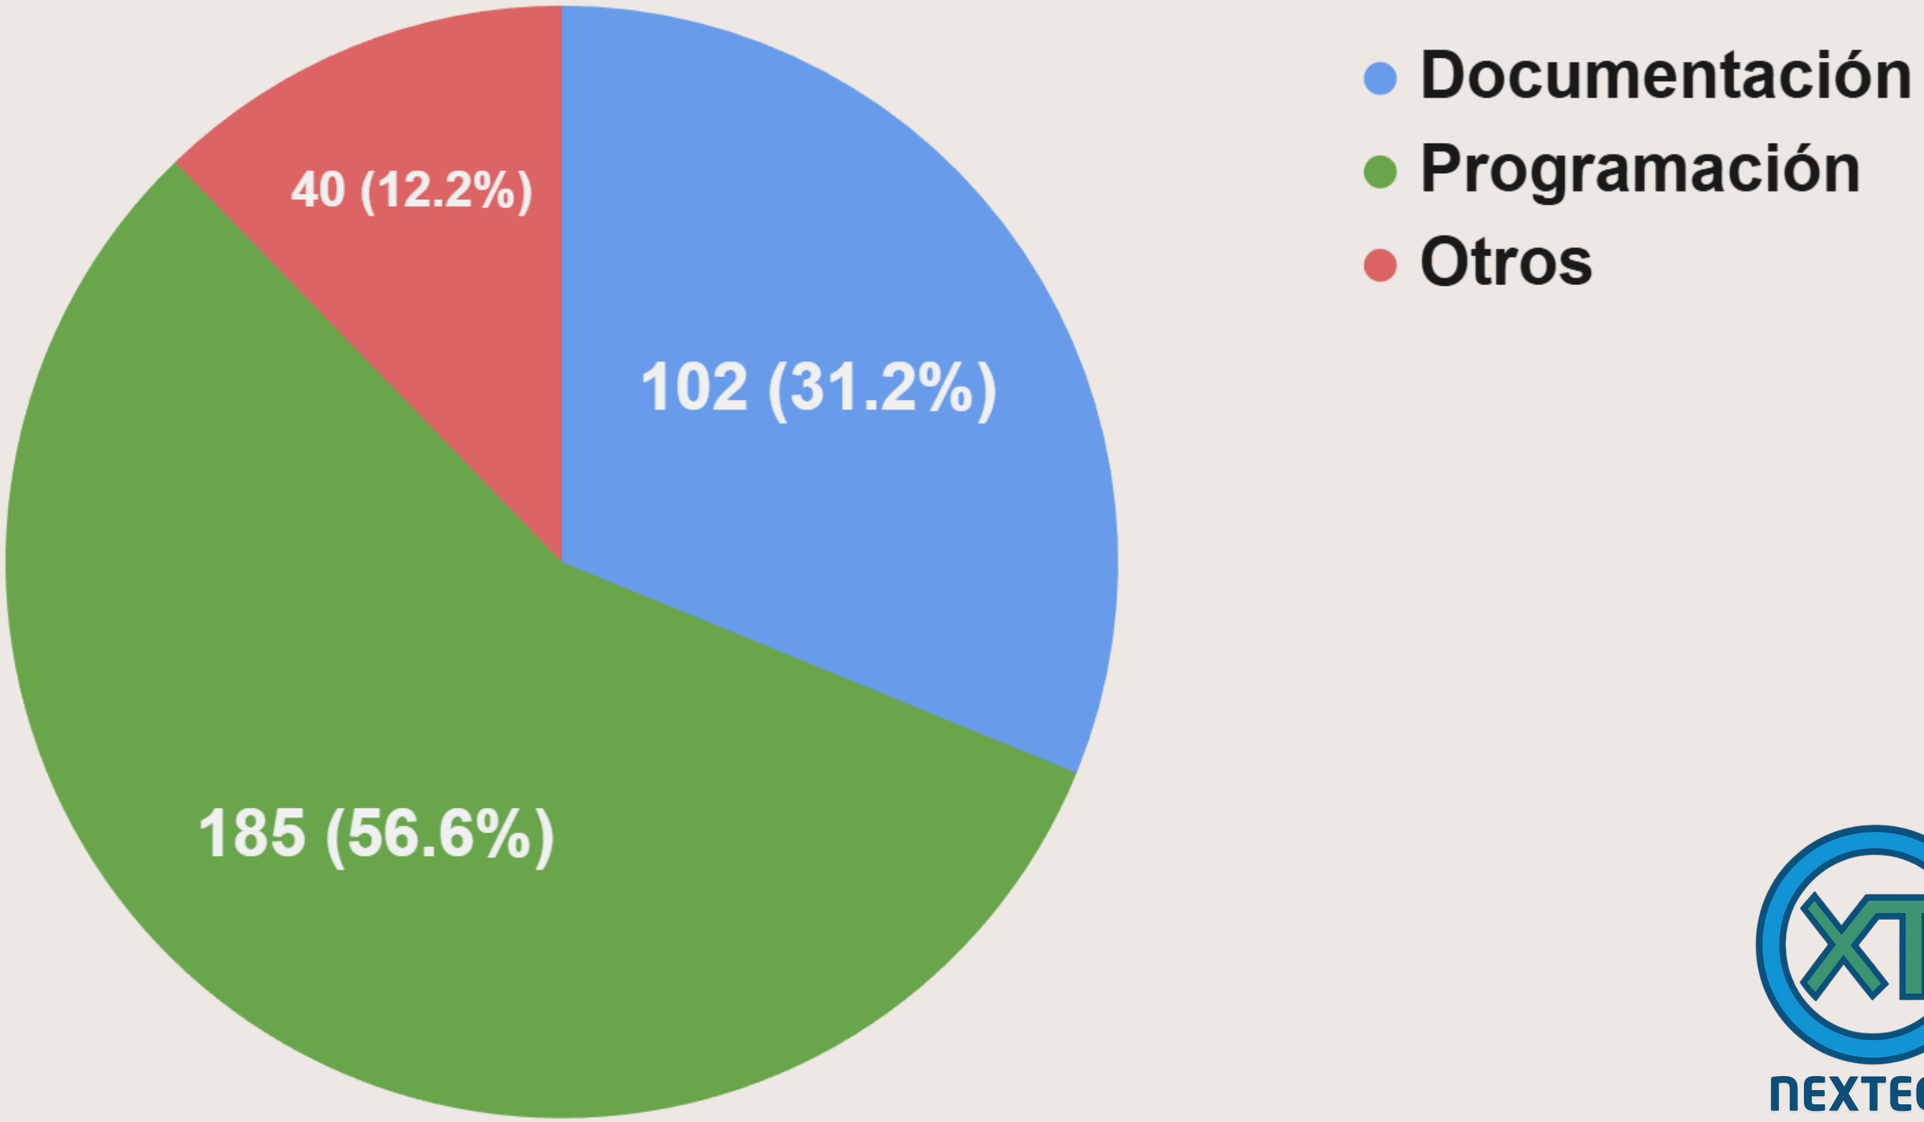


NEXTECH

ESTADO DE CASOS DE USO

NEXTECH

ESTADO ACTUAL DE LOS CASOS DE USO

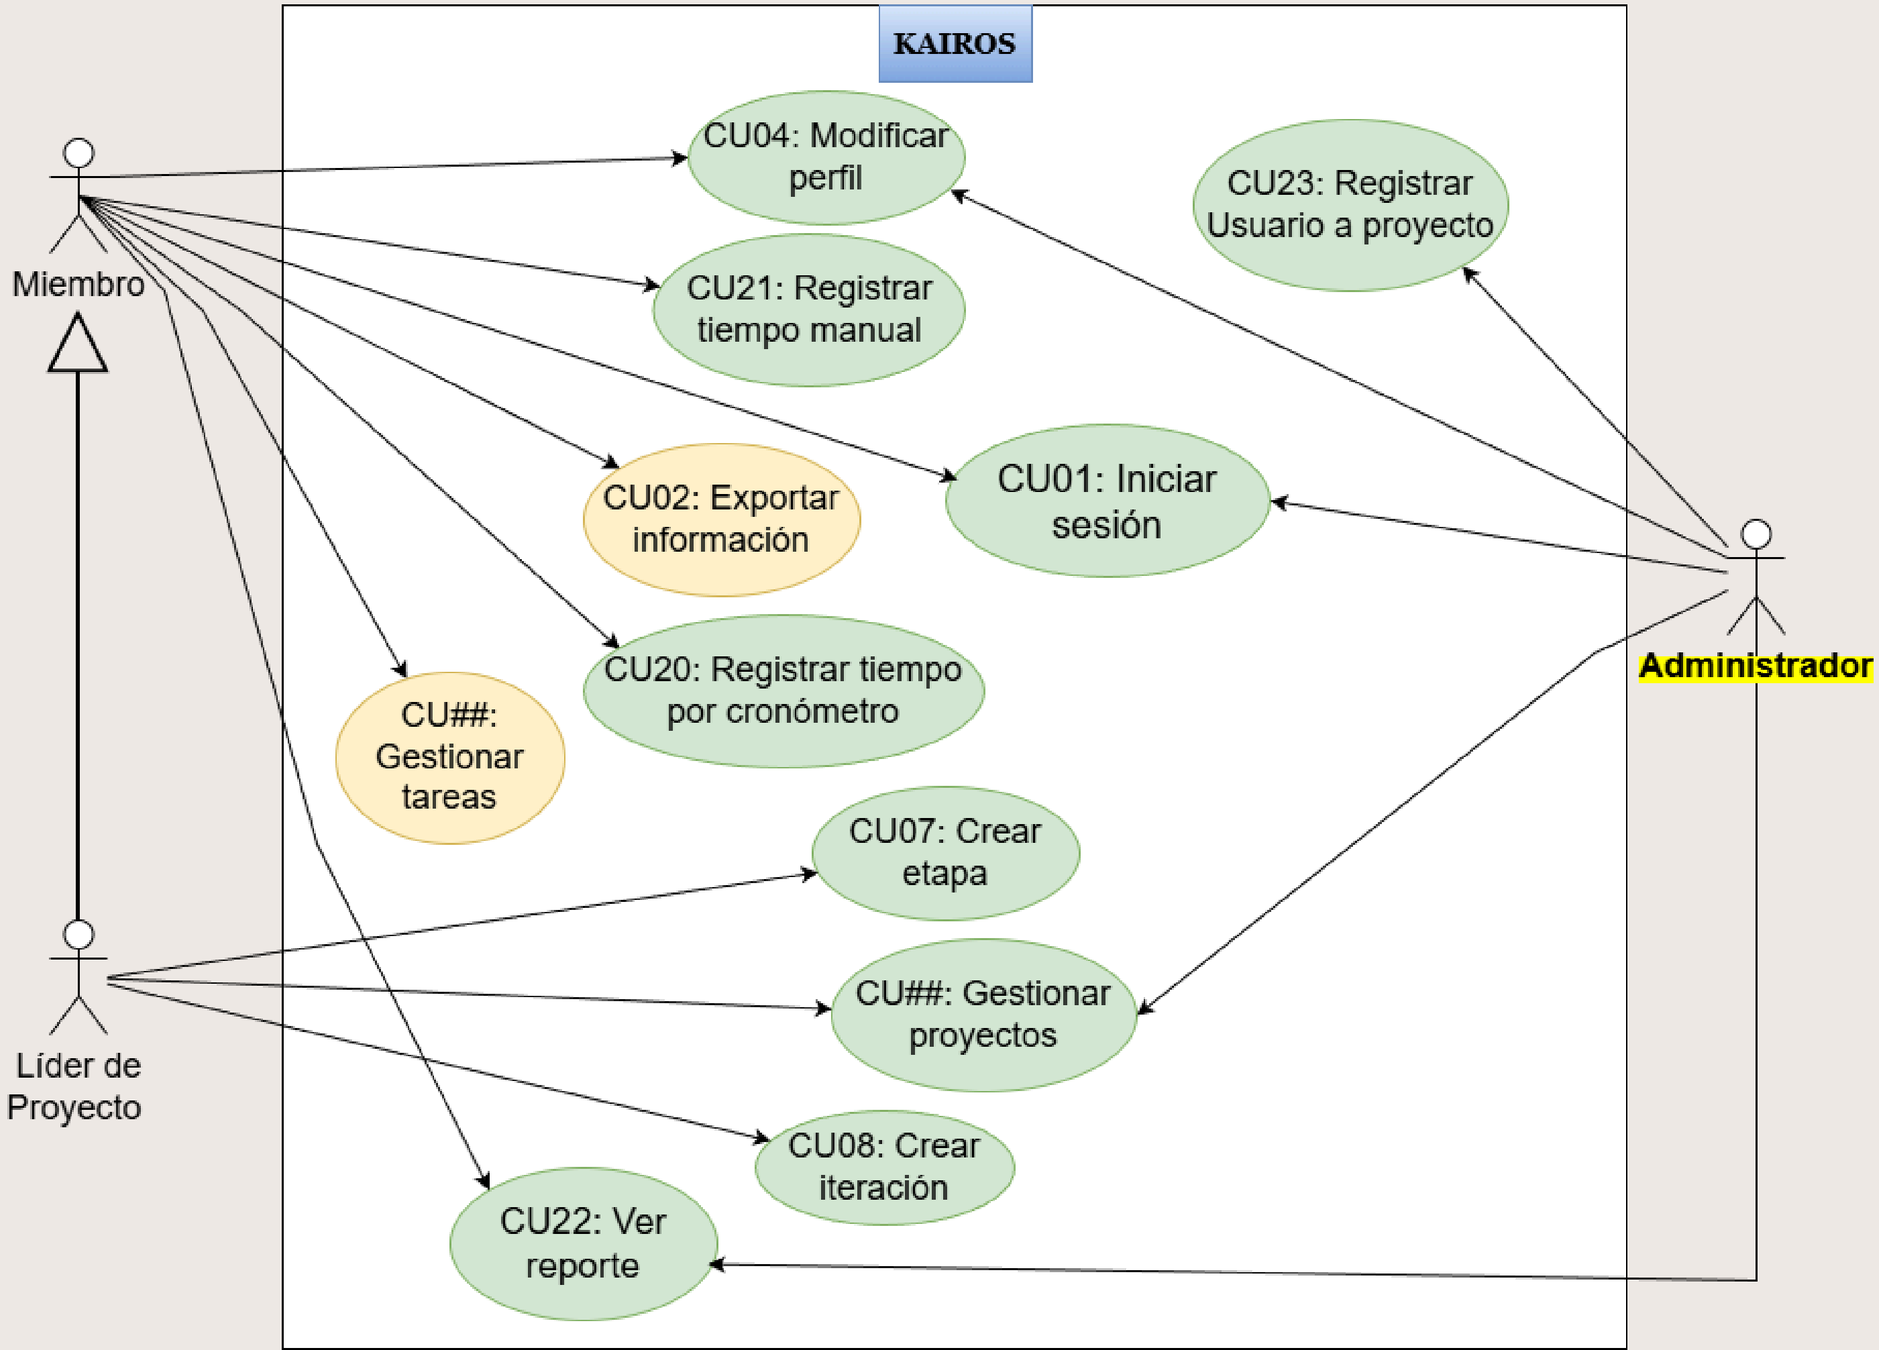

ESTADO ACTUAL DE LOS CASOS DE USO

Caso de Uso	Estado
CU01: Iniciar Sesión	Completado
CU02: Exportar informacion	En curso
CU03: Asignar Rol	Completado
CU04: Modificar Perfil	Completado
CU05: Crear Proyecto	Completado
CU06: Modificar Proyecto	Completado
CU07: Crear Etapa	Completado
CU08: Crear iteración	Completado

Caso de Uso	Estado
CU09: Crear Tarea	Completado
CU10: Proponer Tarea	En curso
CU11: Aprobar Tarea	En curso
CU12: Estimar Tarea	Completado
CU13: Asignar dependencia	Completado
CU14: Modificar estado de tarea	Completado
CU15: Visualizar Tarea	Completado

CU16: Comentar Tarea	**Completado**
CU17: Categorizar tarea	**Completado**
CU18: Añadir Categoría	**Completado**
CU19: Modificar Categoría	**Completado**
CU20: Registrar tiempo por cronómetro	**Completado**
CU21: Registrar tiempo manual	**Completado**
CU22: Ver reporte	**Completado**
CU23: Registrar usuario al proyecto	**Completado**

CU implementados: 20

CU no implementados: 3


Total CU: 23



RESUMEN DE CASOS DE PRUEBA

NEXTECH

Pruebas ejecutadas por iteración

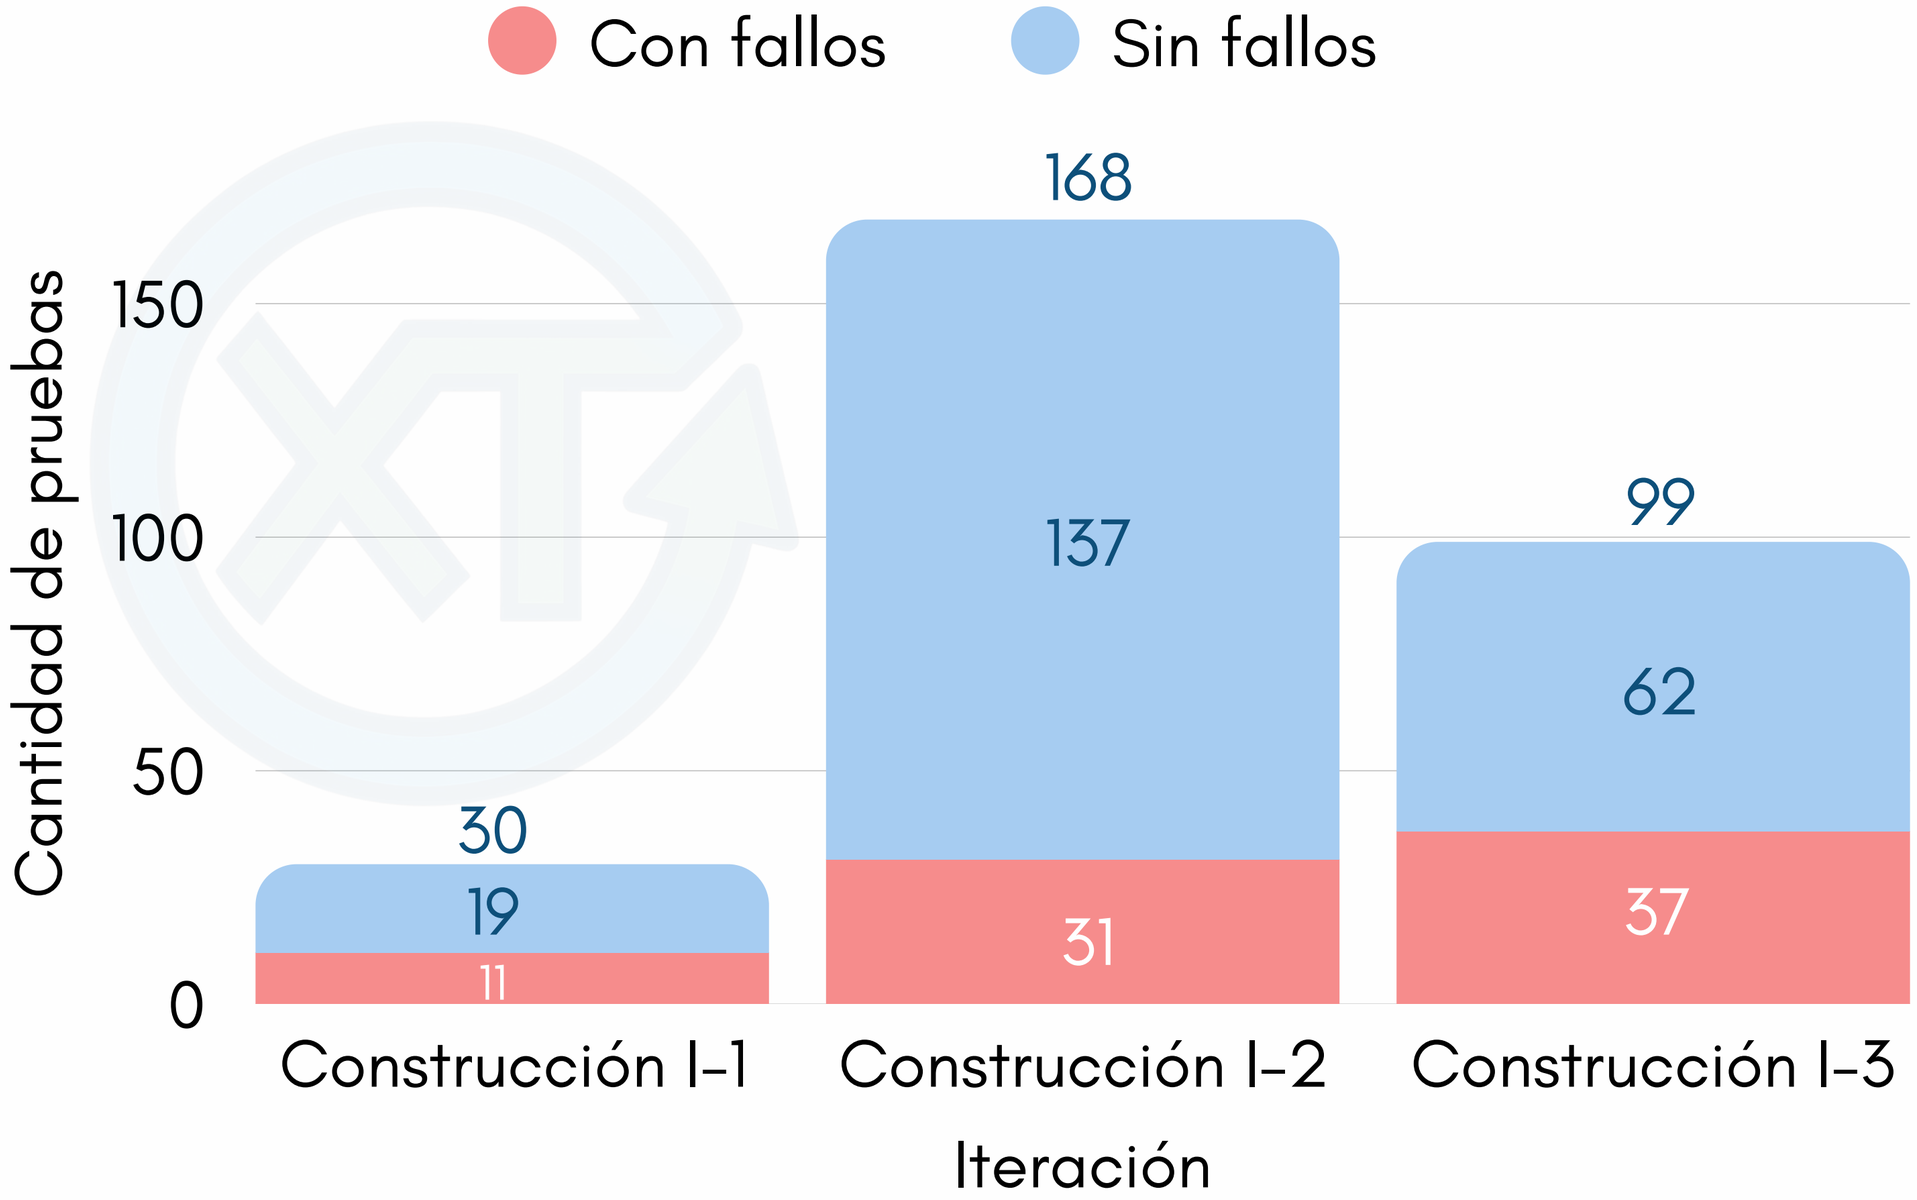

RESUMEN DE PRUEBAS

TEST UNITARIOS	105
OTRAS PRUEBAS	194
EJECUTADOS	299
CON FALLOS	79

NEXTECH


ERRORES ENCONTRADOS POR TIPO DE PRUEBA	
FUNCIONALIDAD	34
VALORES LIMITES	21
SEGURIDAD	5
INTEGRACIÓN	11
UNITARIOS	8

NEXTECH

MÉTRICAS

NEXTECH

MÉTRICAS DE CALIDAD
PLANIFICADO (100%) VS EJECUTADO

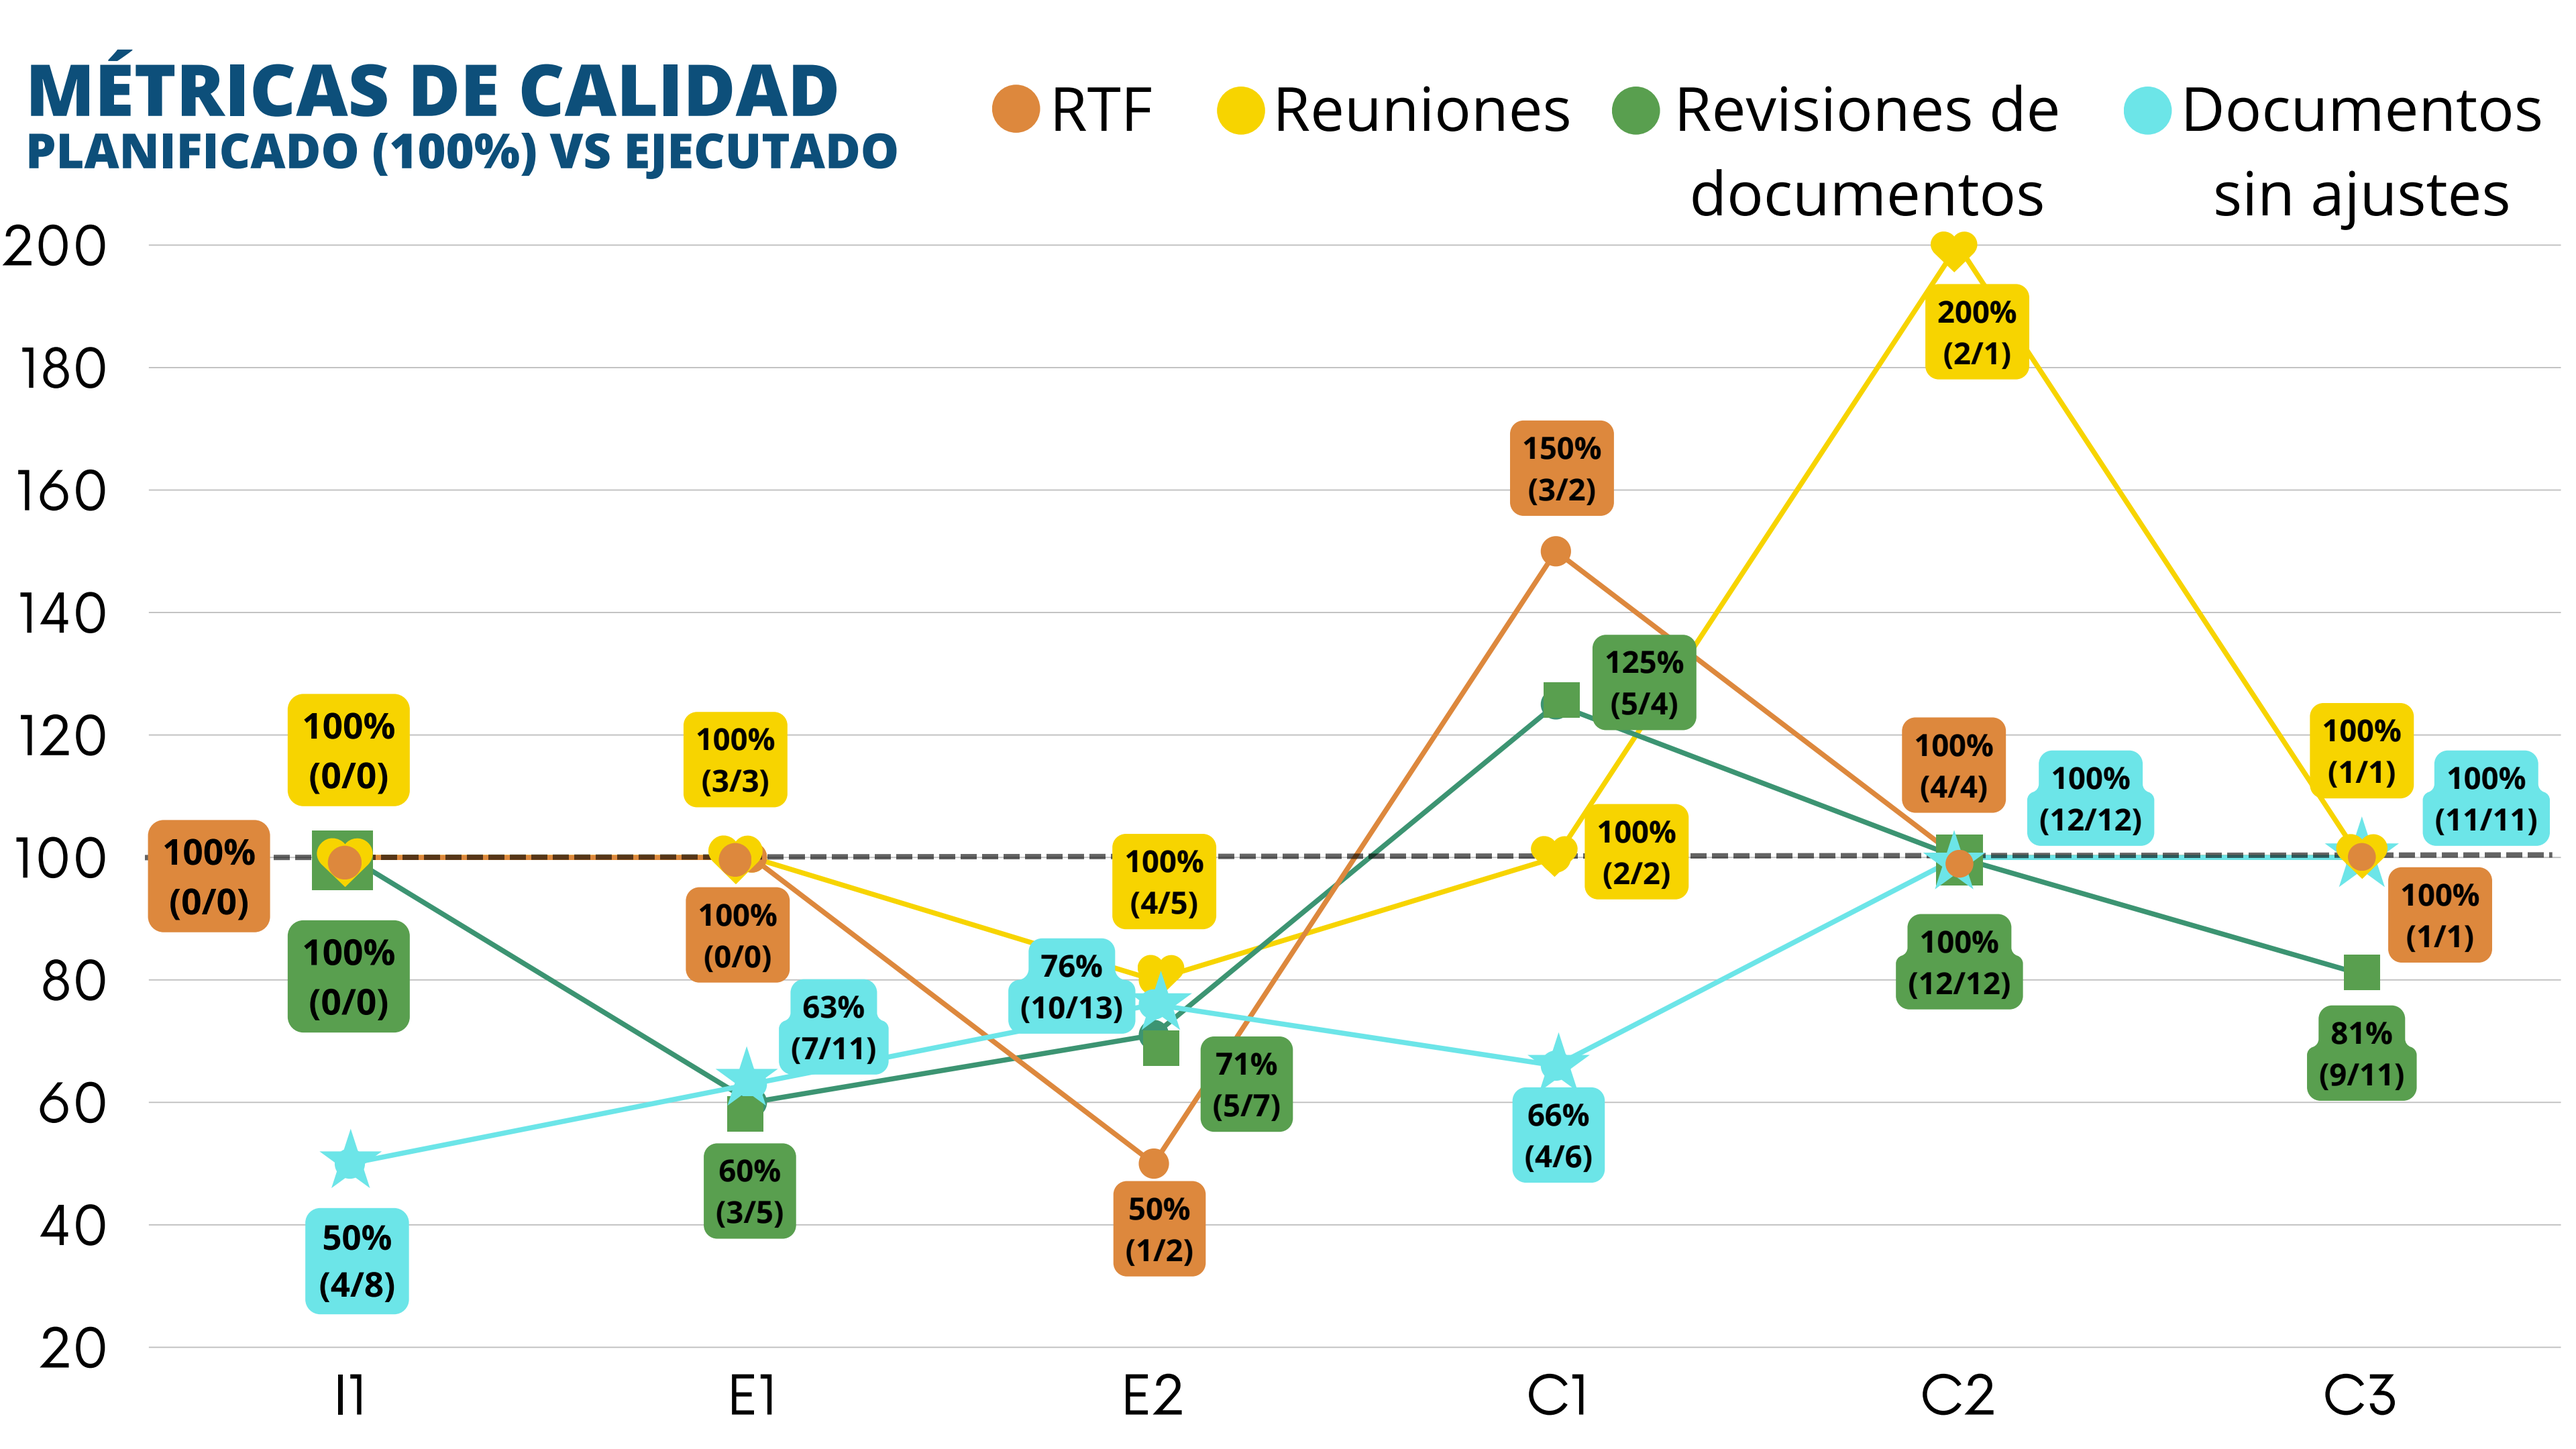

IMPLEMENTACIÓN

NEXTECH

NEXTECH

MUCHAS GRACIAS

Equipo NexTech
